

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月08日
施工工期	1170日曆天+展延工期6天
累計工期	728日曆天（截至114年07月17日）
剩餘工期	449日曆天
預定進度(114.07.17)	41.24%
實際進度(114.07.17)	41.11%
本週進度(超前/ <u>落後</u>)	0.13%



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



2F水電放樣、鋼筋綁紮

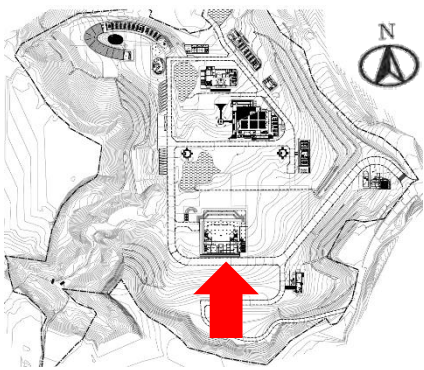

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



齋堂



閣樓版水箱基座施作
1F油漆平頂批土
1F輕隔間放樣

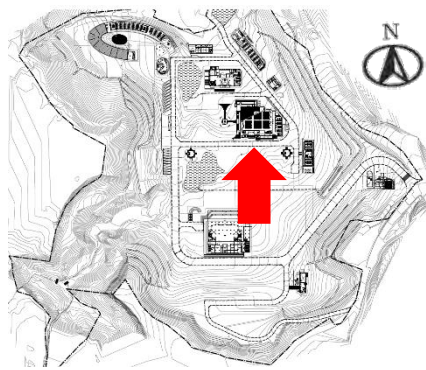

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



2F柱牆鋼筋模板施作

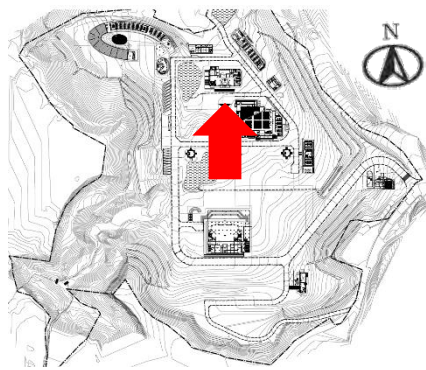


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

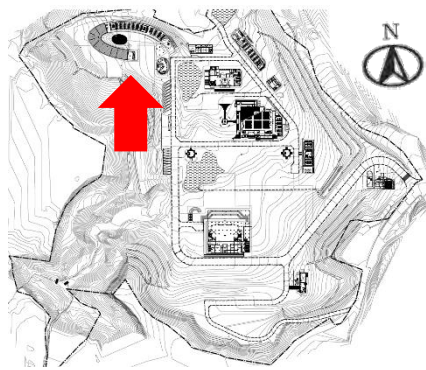

B1F-3F泥作打底粉光
B1F-4F輕隔間放樣
B1F-2F油漆平頂批土
屋頂鋼構吊裝

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



筏基清潔拆模口回封

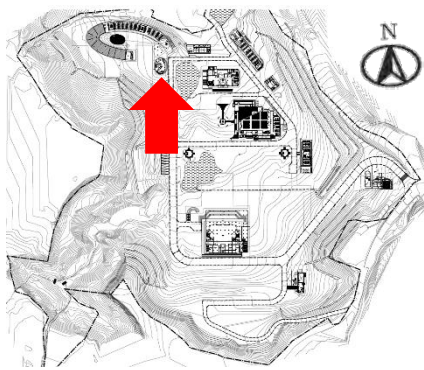

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男寮



3F柱牆鋼筋模板水電
B1F泥作打底粉刷

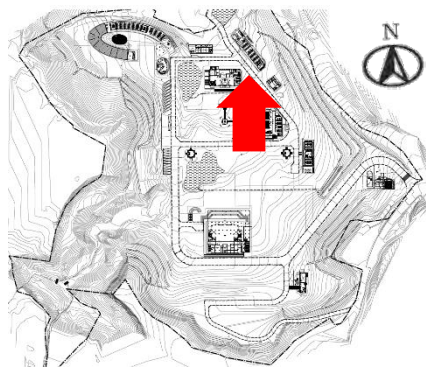


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男義工

B1F-2F泥作打底
B1F-2F輕隔間放樣
屋頂鋼構電銲校正

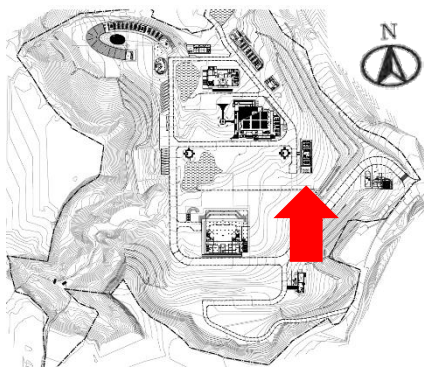


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男常住

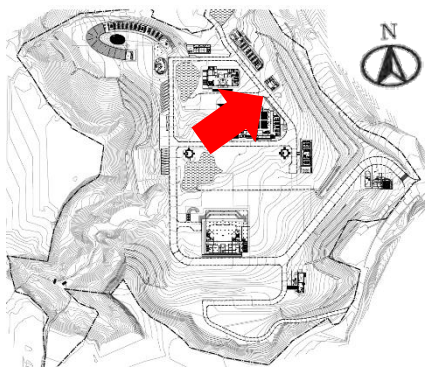

1F、2F泥作打底
1F、2F輕隔間放樣
1F、2F油漆平頂批土
金屬屋頂防火層施作

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



司機休息室



B1F-2F泥作打底
B1F-2F輕隔間放樣
屋頂鋼構電銲校正

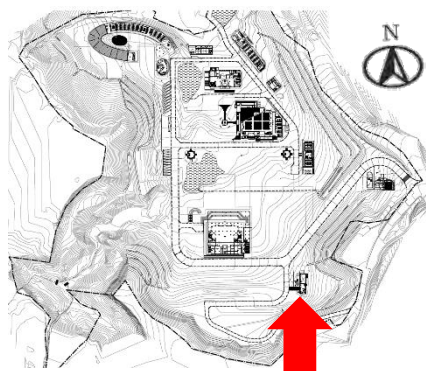

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



高版區3F柱牆鋼筋模板水電

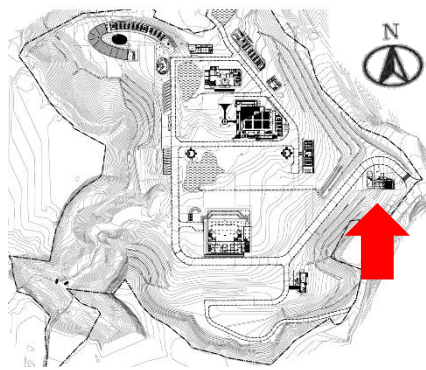

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鐘樓



2F梁版澆置

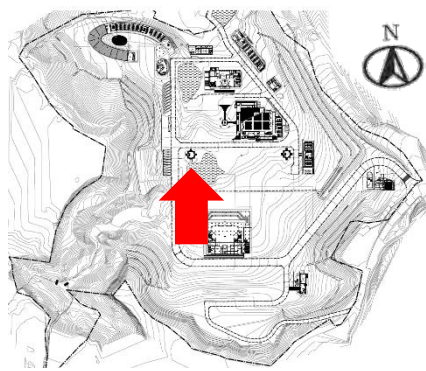

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鼓樓



基礎版澆置

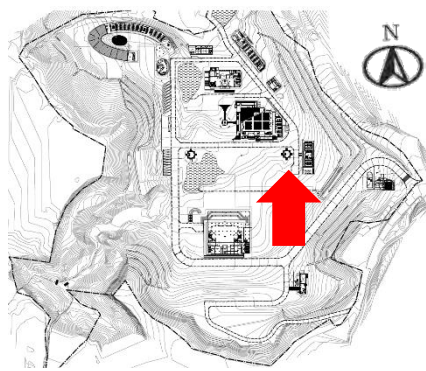



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



2F版澆置
車道頂版聚脲防水施作

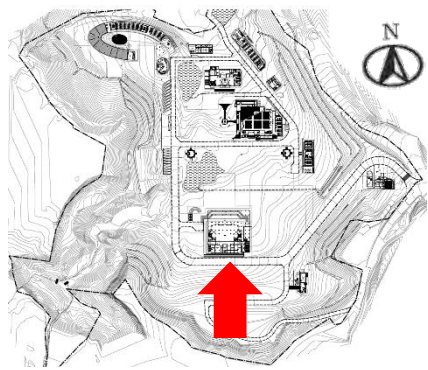


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



齋堂

1F油漆平頂批土
1F輕隔間放樣
1F泥作打底粉光
機電配管拉線

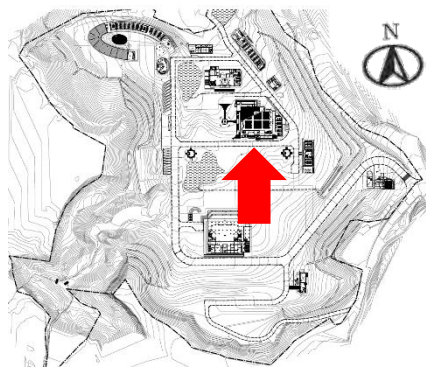

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



2F柱牆鋼筋模板施作
1F景觀梯施作
B1F泥作打底

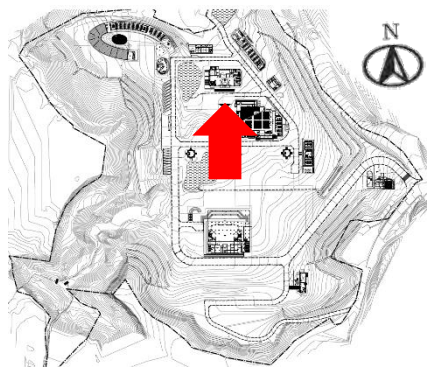


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

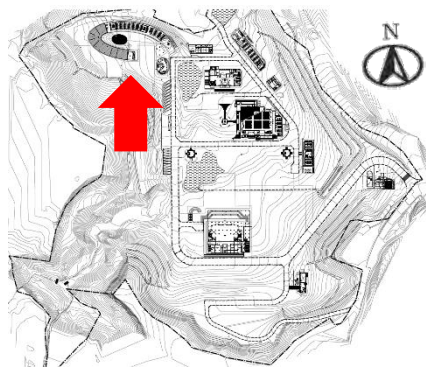


B1F-3F泥作打底粉光
B1F-4F輕隔間放樣
B1F-2F油漆平頂批土
屋頂鋼構吊裝
機電配管拉線



女常住



2F梁版模板施作

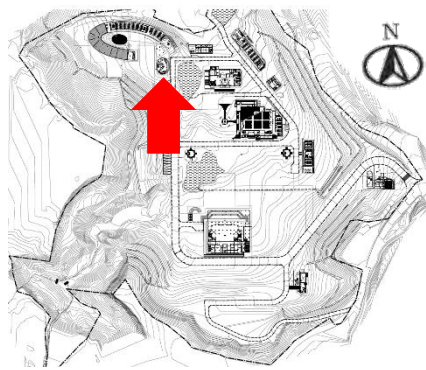


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

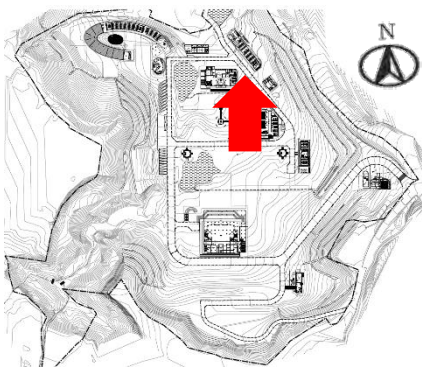

3F柱牆鋼筋模板水電
B1F泥作打底粉刷
B1F輕隔間放樣
B1F油漆平頂批土
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男義工



金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作打底
B1F-2F輕隔間放樣
B1F-2F油漆平頂批土
1F-3F鋁裝安裝嵌縫防水
1F-3F金屬門分料

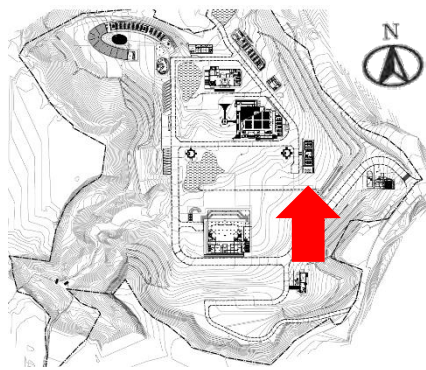

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男常住



金屬屋頂防火層施作

1F、2F泥作打底


1F、2F輕隔間放樣

1F、2F油漆平頂批土

1F-3F鋁裝安裝嵌縫防水

1F-3F金屬門分料

機電配管拉線、重製或對外提

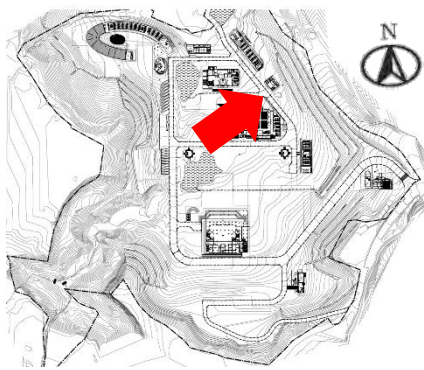

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



司機休息室



金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作打底
B1F-2F輕隔間放樣
機電配管拉線

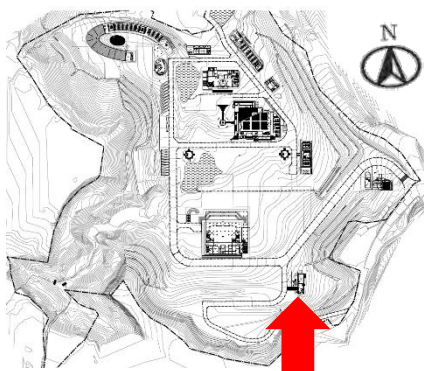

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



高版區3F柱牆鋼筋模板水電

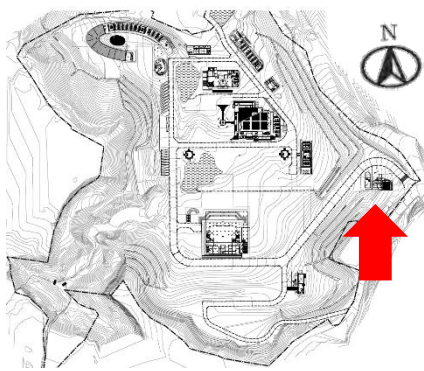

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鐘樓



2F柱澆置

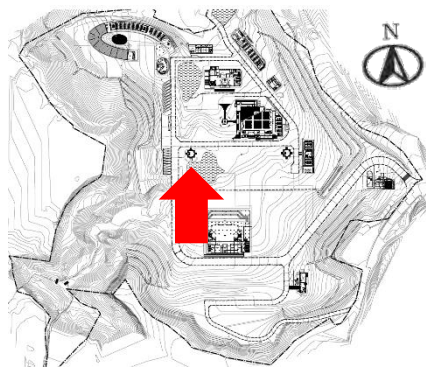

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



鼓樓



1F圓柱澆置

