

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	116年06月12日
施工工期	1170日曆天+展延工期253日曆天
累計工期	1064日曆天（截至115年06月18日）
剩餘工期	359日曆天
預定進度(115.06.18)	63.42%
實際進度(115.06.18)	63.29%
本週進度(超前/落後)	0.13%

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理



全區空拍照片


機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、製或對外揭2。

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



主殿

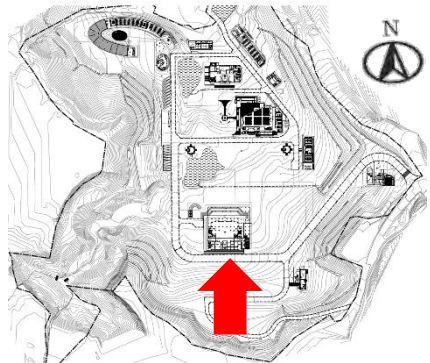

鋼構屋頂吊裝
B2F-1F泥作、輕隔間、油漆、鐵捲門施作、造型柱組模灌漿
樹穴聚脲防水
機電配管拉線


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



齋堂

金屬屋頂防火層施作
1F-4F泥作、輕隔間、油漆、戶外欄杆墩座、鐵捲門、鋁窗、金屬門施作
RF屋頂防水施作
機電配管拉線

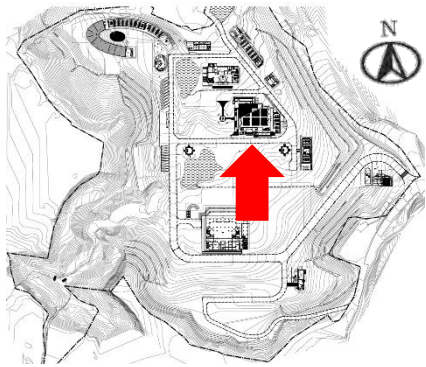


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



玄文

金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作、油漆、電梯施作
屋頂防水施作

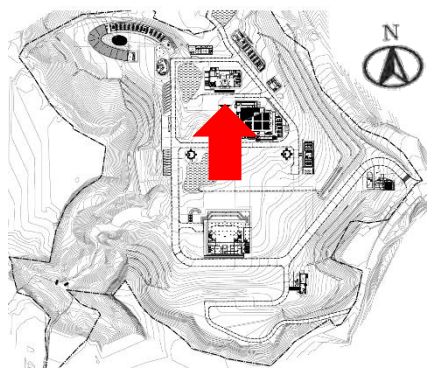


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

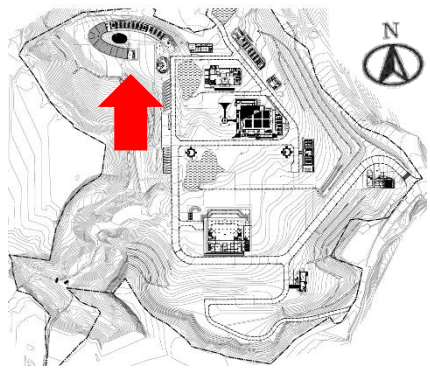


金屬屋頂防火層施作
B1F-4F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門、電梯、防火漆施作
1F-4F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線



女常住



金屬屋頂防火層施作
1F-2F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作

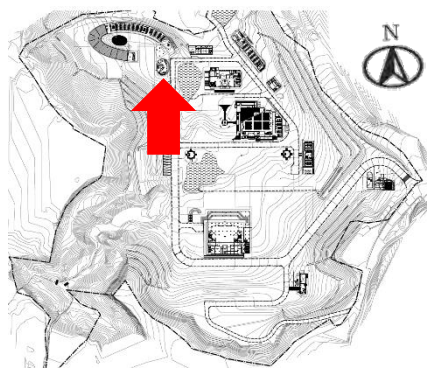


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

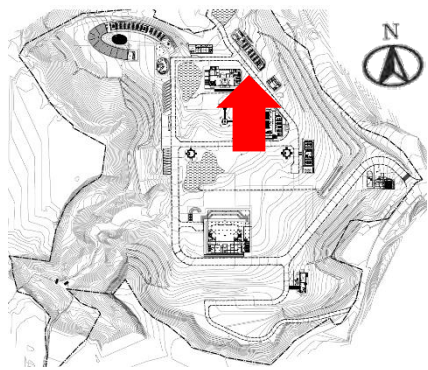


金屬屋頂面層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作
1F-3F造型遮陽板施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片




男義工

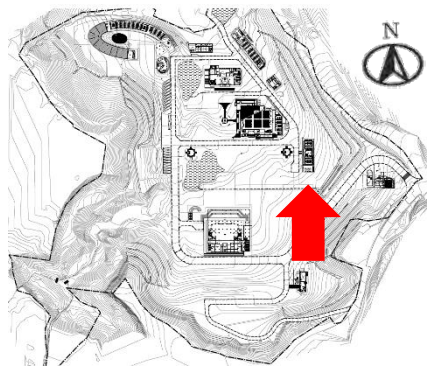

金屬屋頂面層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯、防火漆施作
1F-3F造型遮陽板施作
3F金屬三明治版施作
機電配管拉線



男常住

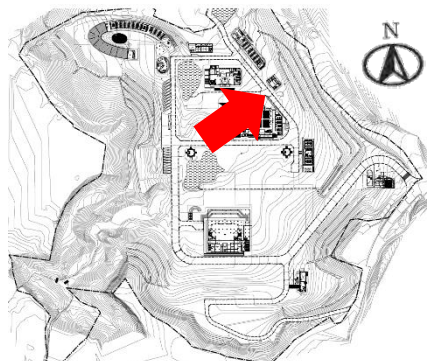


- 金屬屋頂面層施作
- 1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯、防火漆、造型遮陽板施作
- 3F金屬三明治版施作
- 機電配管拉線



司機休息室

- 金屬屋頂面層施作
- B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作
- 1F-3F戶外欄杆預埋施作
- 3F金屬三明治版施作
- 機電配管拉線

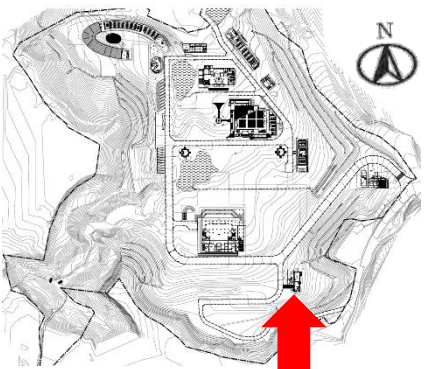


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



傳達室

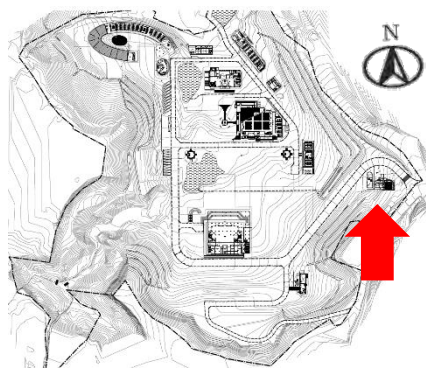

全區1F-2F泥作
高版區屋頂聚脲防水壓層
屋頂鋼構吊裝
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鐘樓



待金屬屋頂施作
1F泥作

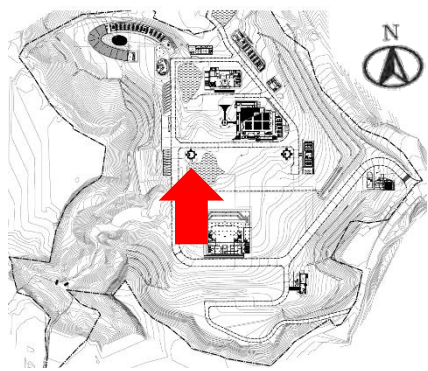




鼓樓



待金屬屋頂施作
1F泥作

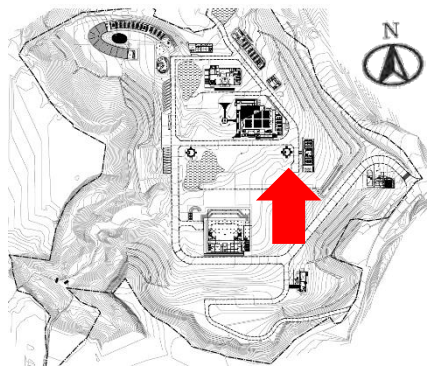

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



山門



屋頂梁澆置

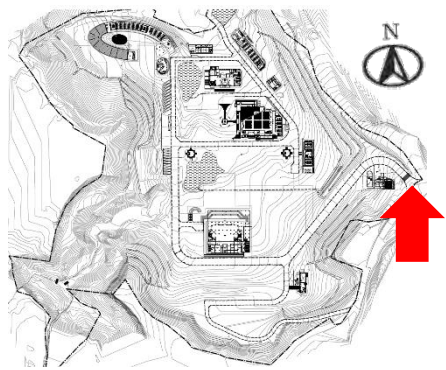




全區空拍照片


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

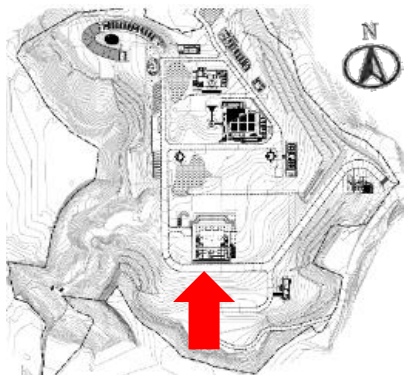


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

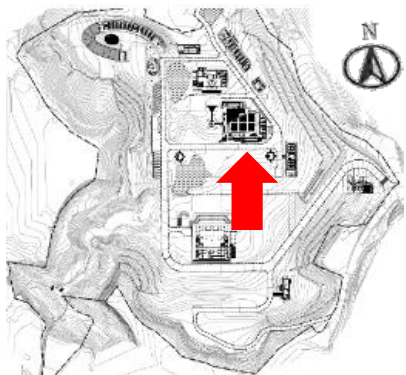


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

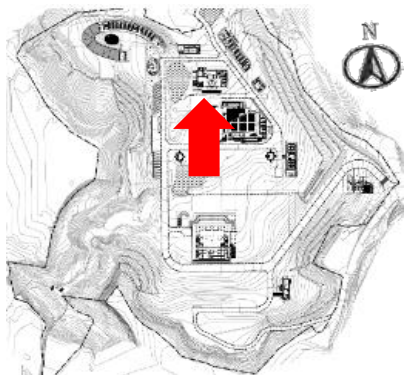


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

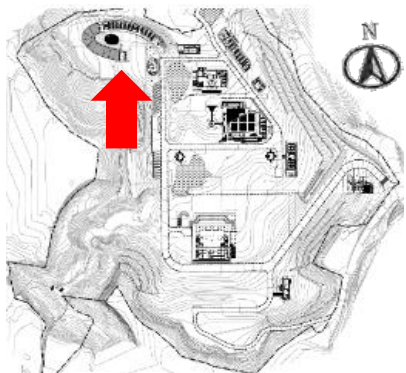



女常住
待屋頂防火層鋪設

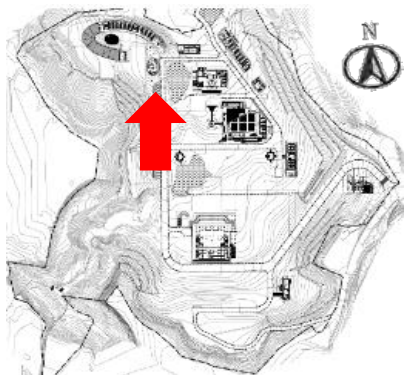




男寮

2F: 咖關插座、廣播喇叭安裝(80%)、北側廁所壁磚(100%)

3F: 電梯百葉窗安裝(100%)、外牆打底(82%)

1F-3F: 雨水排水管路徑確認及備料(80%)

RF: 屋頂面板施作(95%)

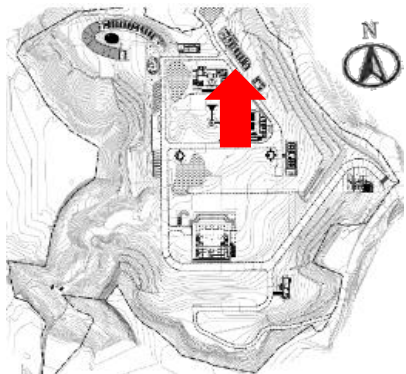




男常住

2F:開關插座安裝(95%)

3F:開關插座安裝(90%)

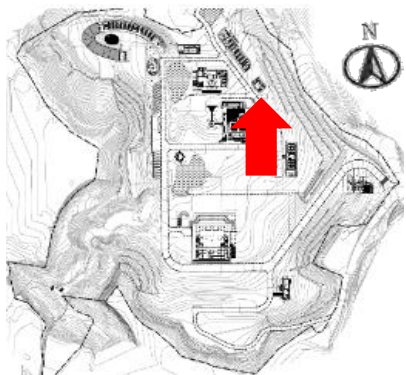


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男義工
筏基礎磚(100%)

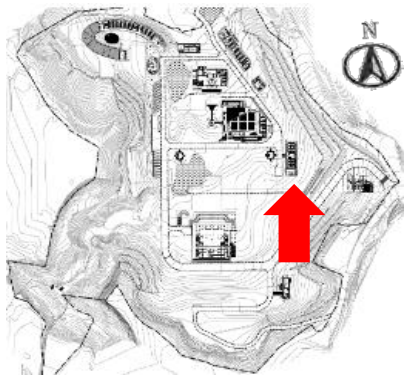


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



司機休息室
筏基礎磚(100%)
2F:排水管路徑變更(20%)
RF:金屬屋頂面層施作

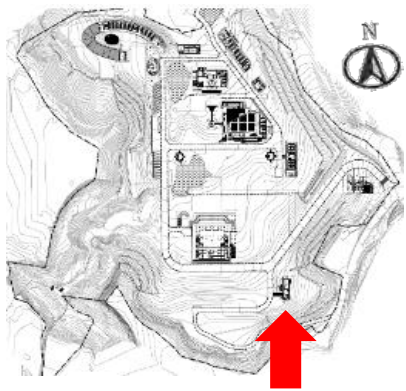




傳達室


1F-2F:消防箱消防管配置(90%)

RF:屋頂鋼構吊裝電銲

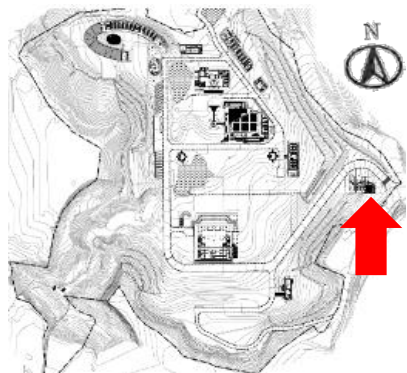



鐘樓
待金屬屋瓦防火層施作

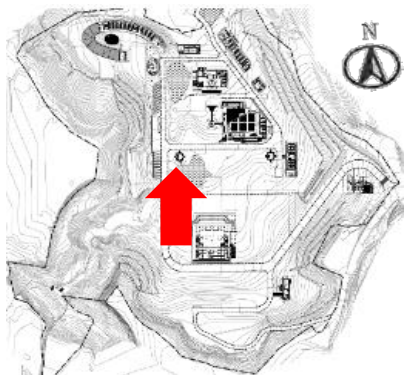


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



鼓樓
待金屬屋瓦防火層施作

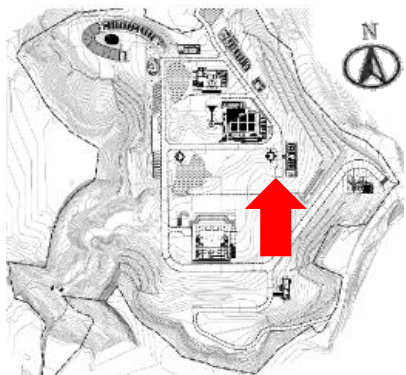

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



山門
施工架搭設(100%)
待屋頂鋼構吊裝

