

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	116年06月14日
施工工期	1170日曆天+展延工期255日曆天
累計工期	1134日曆天（截至115年08月27日）
剩餘工期	291日曆天
預定進度(115.08.27)	66.84%
實際進度(115.08.27)	66.52%
本週進度(超前/ <u>落後</u>)	0.32%

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理




全區空拍照片

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

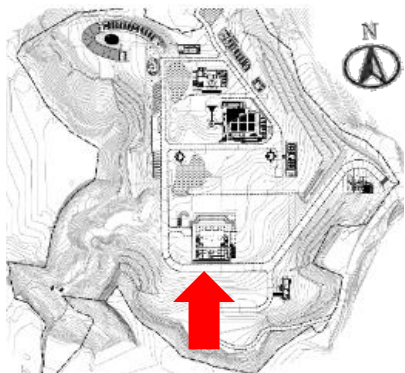


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

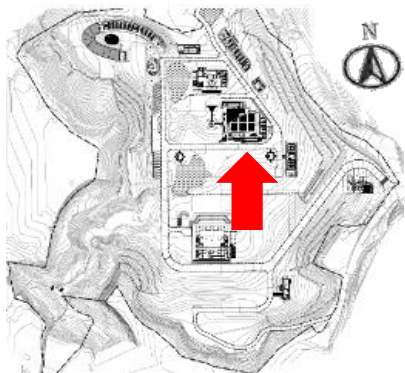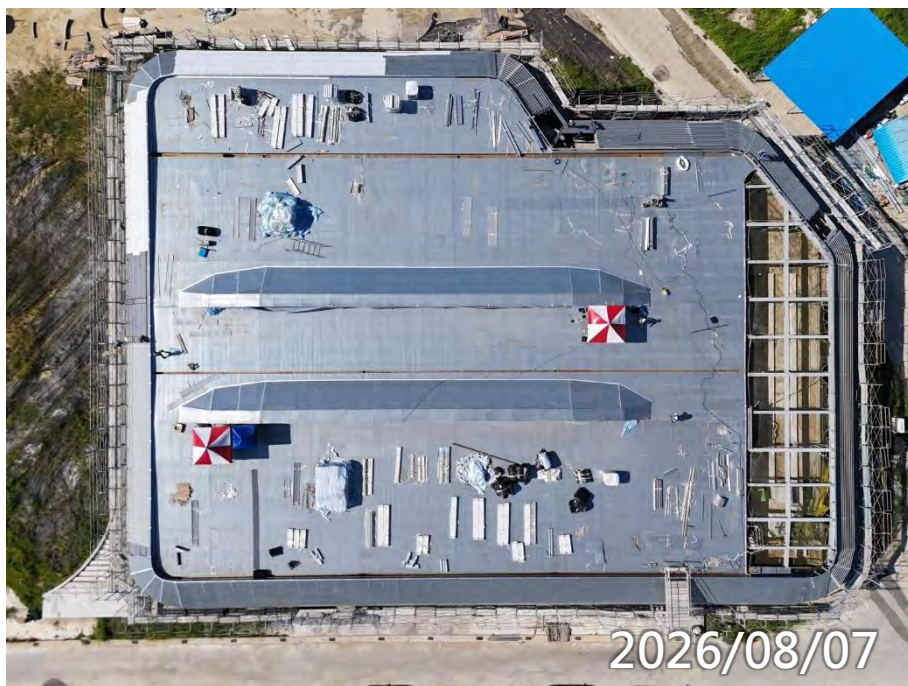


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

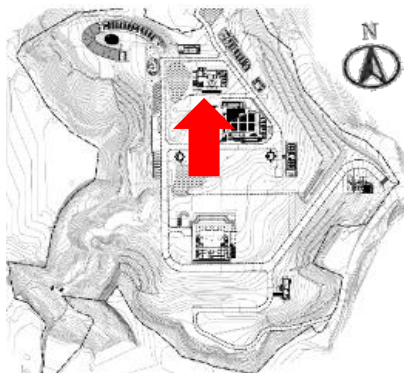

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

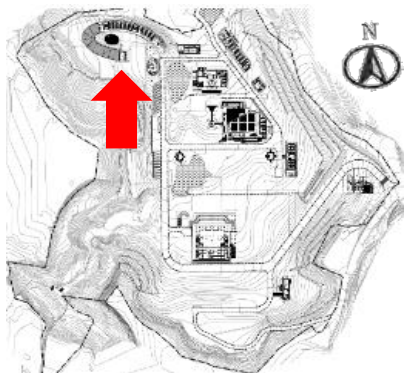


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女常住
1F隔間雙面板安裝(20%)
2F配合鋼構拆架(100%)
待屋頂防火層鋪設

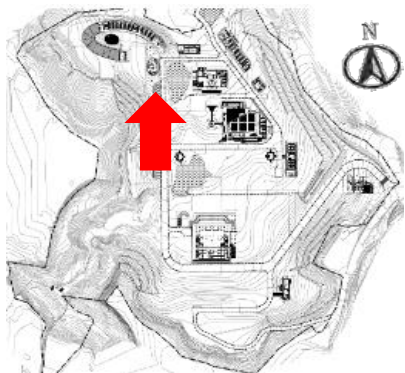

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

B1F牆面批土研磨(80%)


2F壁磚(100%)、2F外牆打底(80%)

3F外牆打底(100%)、3F外牆粉光(100%)

RF三明治版安裝(50%)

整棟雨水排水管配管(30%)

斜屋頂面板施作(100%)

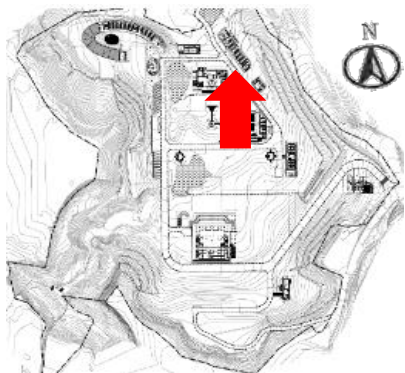


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男常住
廁所線排電焊安裝(80%)

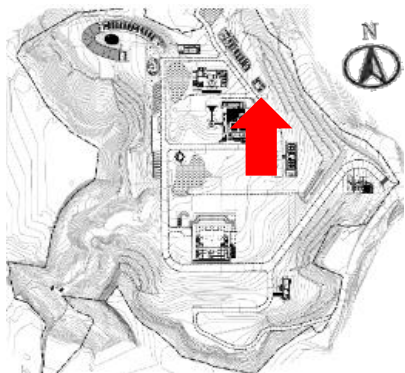

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男義工

3F施工架物料清運(100%)

1F-2F廁所地界條(100%)

1F-3F梯廳飲水機配管(30%)


1F-3F外牆洗石滴水條(100%)

1F-3F遮陽板直立式百葉(100%)





司機休息室
1F外廊道排水配管修改(40%)
消防感知配管(30%)

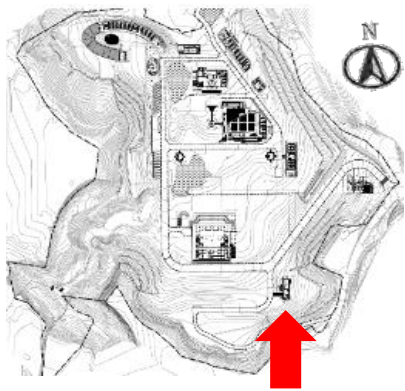

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



傳達室

空橋鋼筋綁紮(100%)

外管路路徑修改(90%)


消防拉線(80%)

電氣拉線(90%)

水箱批土研磨(100%)


RF鋼構除鏽(100%)

RF鋼構電焊UT檢測(100%)

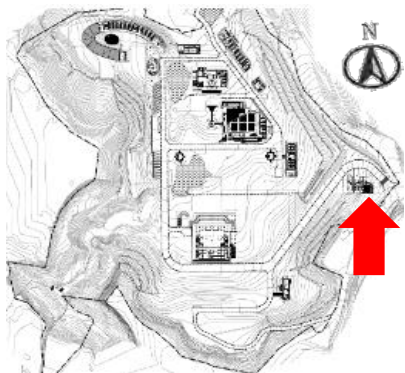




鐘樓
待金屬屋瓦防火層施作

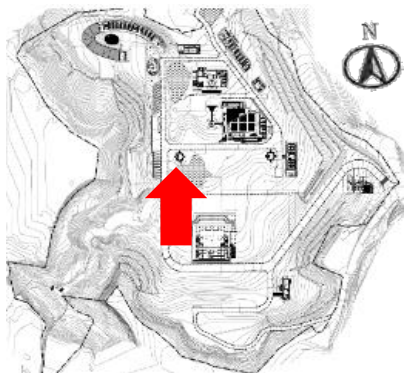



鼓樓
待金屬屋瓦防火層施作

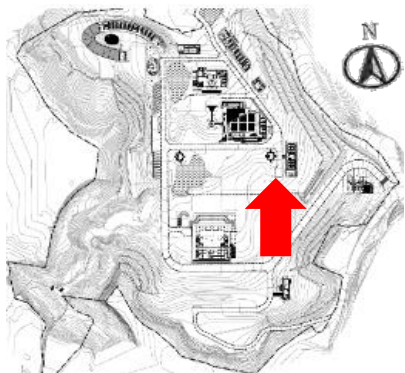

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



山門
屋頂鋼構吊裝(100%)
施工架防塵網搭設(100%)



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


範疇管理



全區空拍照片


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

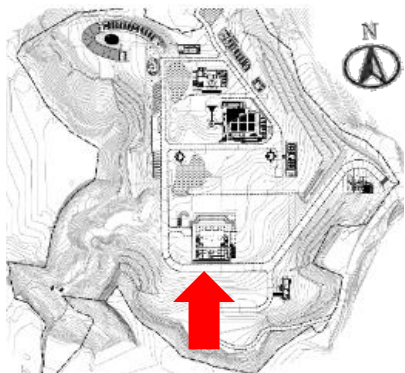


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

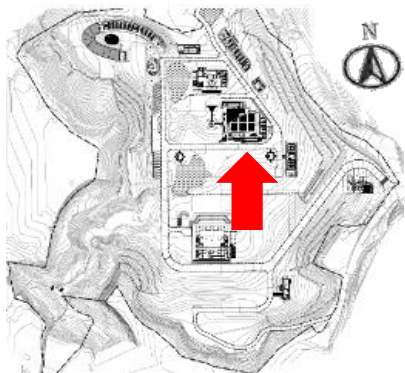


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

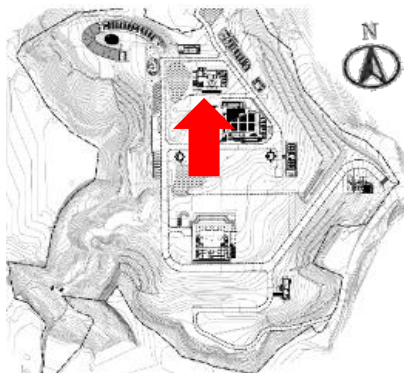

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

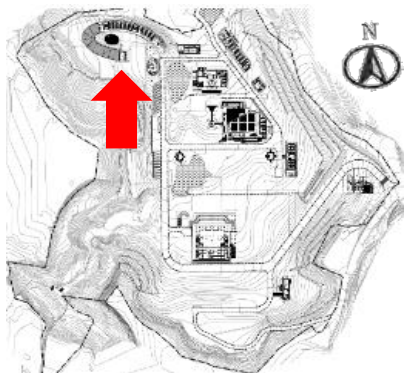

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片




女常住

1F新增管道隔間骨架施作(業主新增)

2F細設修改鋼筋綁紮(95%)

2F廁所隔間改RC放樣、配管、雙面模(100%)

待屋頂防火層鋪設

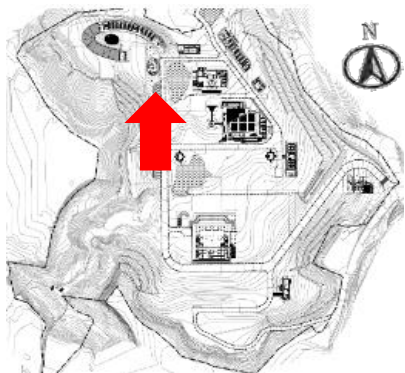

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

1F外牆打底(80%)

2F廊道噴漆(15%)


2-3F配合外牆洗石子改壁拉桿(80%)

3F廊道牆面批土(80%)

RF三明治版安裝(60%)、RF鋁天花骨架安裝(30%)

外牆洗石(10%)

整棟雨水排水管配管(35%)、整棟動力盤體掛設前置(40%)

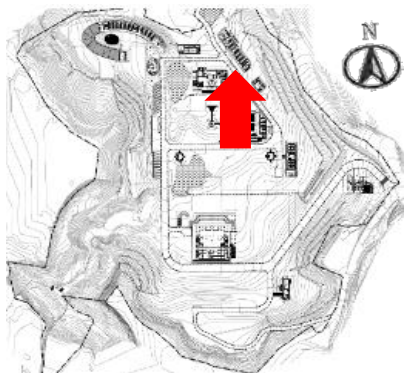

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片




男常住

3F消防火警感知配管(70%)

3F廁所線排收尾(100%)

RF鋁企口天花骨架及樣品區安裝(10%)

電梯框調整打石(業主變更)

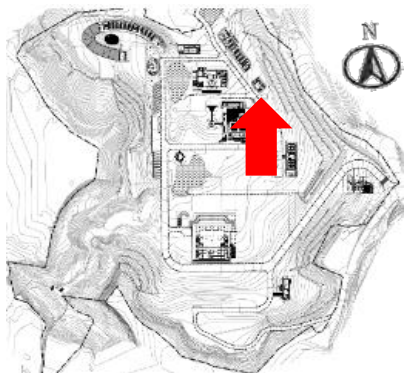

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男義工

1F-2F廁所線排安裝(90%)

3F消防火警感知配管(70%)

3F磨石打底(65%)

RF鋁天花骨架安裝(40%)

管道間內地坪開口角鐵收邊(50%)




正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



司機休息室
1F外廊道排水配管修改(80%)
消防感知配管(80%)

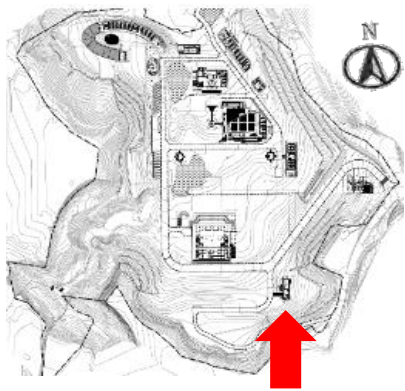

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



傳達室

1F鋁窗安裝(75%)

2F金屬門安裝(100%)、2F鋁窗安裝(75%)

3F金屬門安裝(100%)、3F鋁窗安裝(65%)


1F-3F外牆泥作吊線(5%)

屋頂補強件(100%)

外管路路徑修改(90%)


消防拉線(80%)電氣拉線(90%)

非經潤弘同意不得任意複製、重製或對

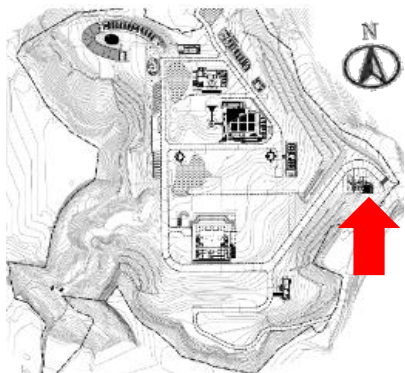




鐘樓
鋼構除鏽及噴漆(70%)
待金屬屋瓦防火層施作

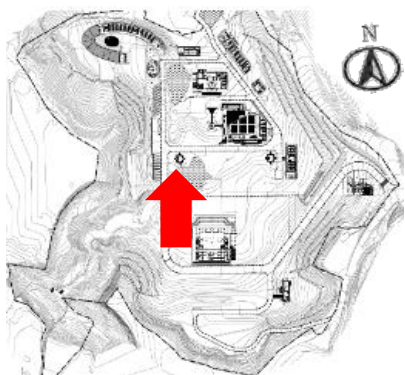



鼓樓
鋼構除鏽及噴漆(70%)
待金屬屋瓦防火層施作

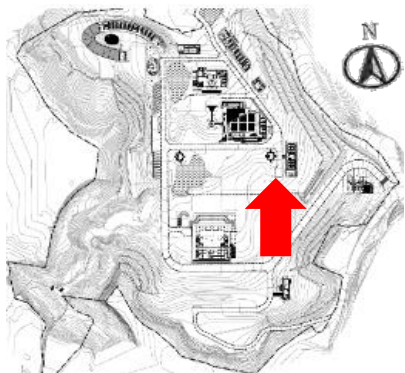

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



山門
屋頂鋼構吊裝、電焊(100%)

