

# 正覺寺新建工程2301地工及道路臨時鋪設工程進場

	道路水溝	預計開始	預計完成
	第一階段	2022/08/22	2022/09/28
	第二階段	2022/09/29	2022/11/10
	第三階段	2022/11/11	2022/11/25
	第四階段	2022/11/26	2023/02/10
	第五階段	2023/02/11	2023/03/28

## 目前完成進度

既有矩形溝(加蓋):94.2%(1560M)

新設矩形暗溝:27.7%(539M)


新設集水井:29.3%(21座)

既有矩形溝(改暗溝):0%(0M)

既有箱涵(改暗溝):0%(0M)

新設管涵:0%(0M)

新設拍漿溝:0%(0M)

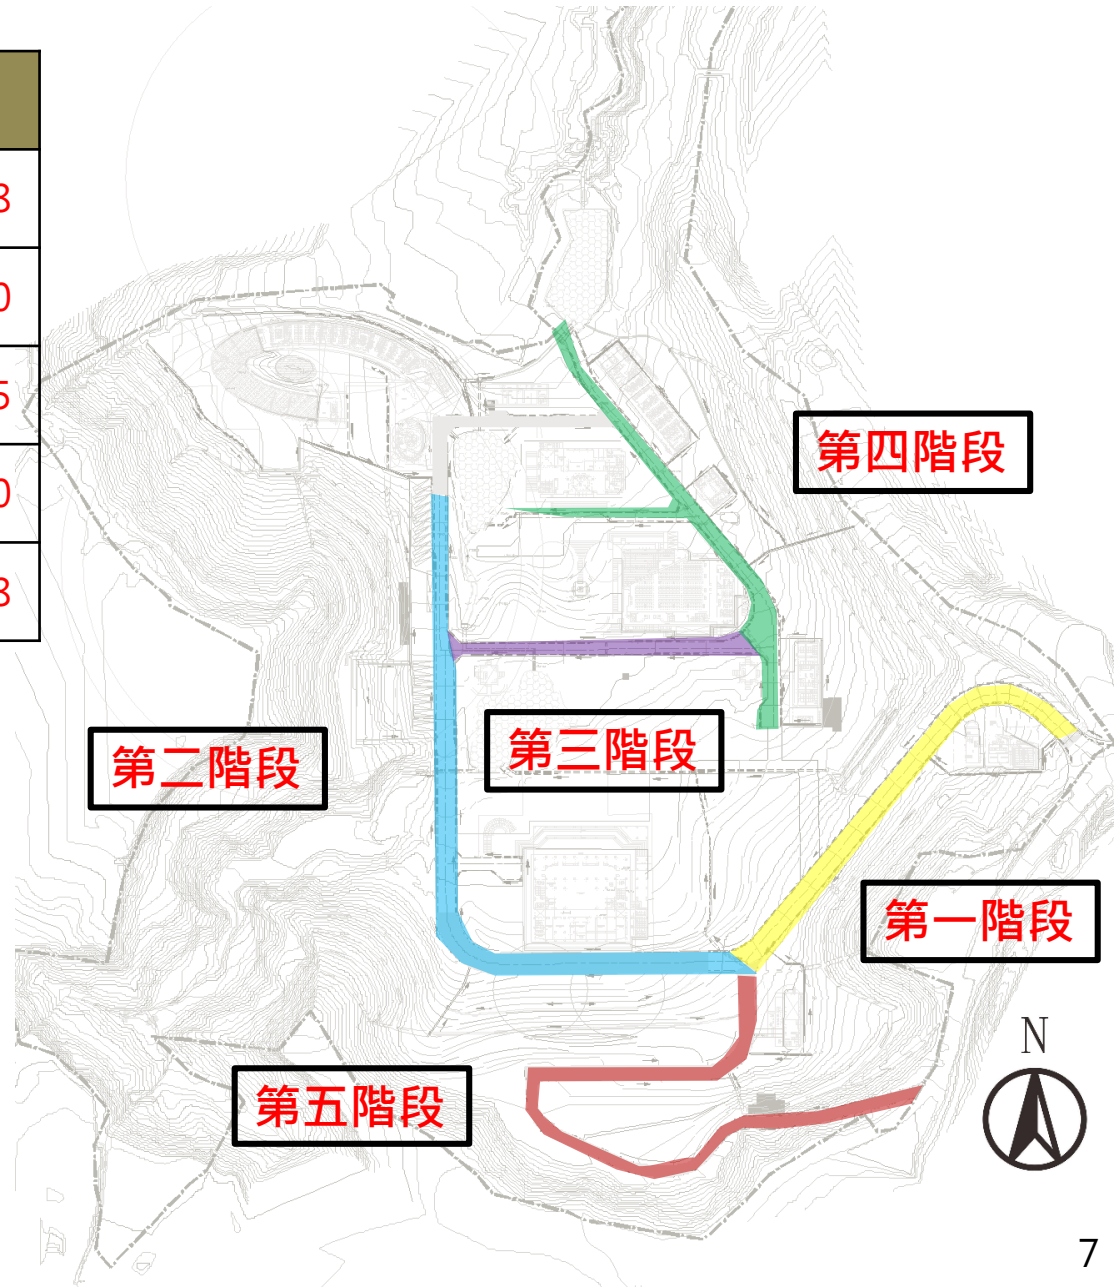


# 正覺寺新建工程

## 預定進度表

## 進度管理

	型式	預計開始	預計完成
	R1擋土牆	2022/09/12	2022/11/30
	R3擋土牆	2022/12/01	2022/12/31
	R2擋土牆	2023/01/01	2023/01/31
	PA滯洪池	2022/08/22	2023/02/28
	PB滯洪池	2022/10/15	2023/02/28
	PC滯洪池	2023/02/28	2023/03/31
	靜水池	2023/03/10	2023/03/31

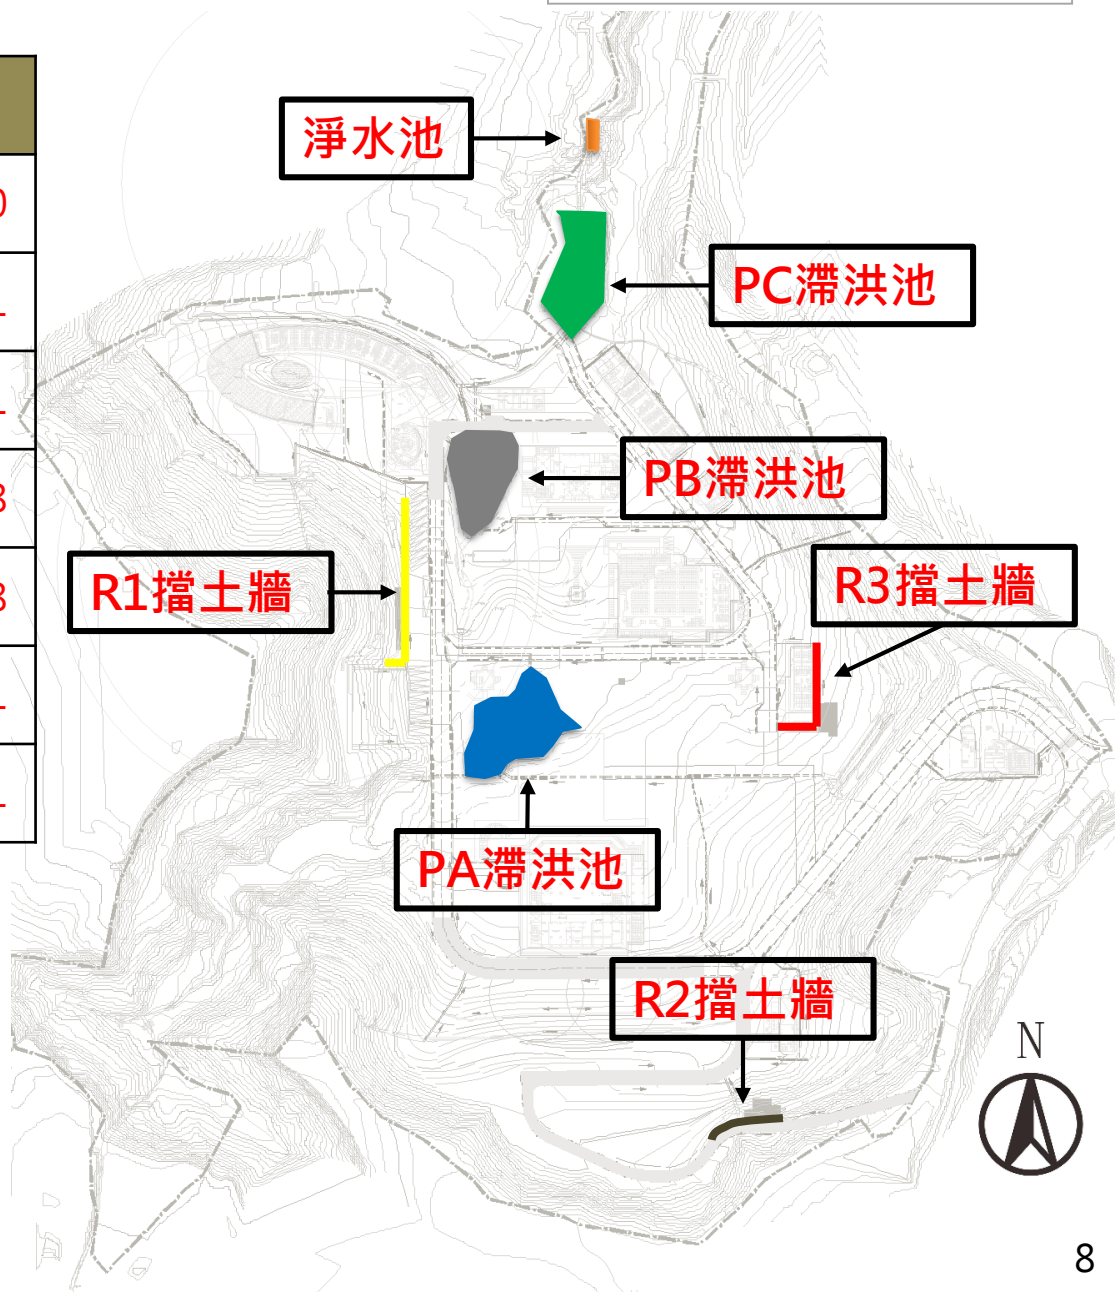

### 目前完成進度

擋土牆:100%(3座)

滯洪池:46.3%(1.39座)

靜水池:0%(0座)






AU-45既有水溝加蓋施作



AU-45既有水溝加蓋施作

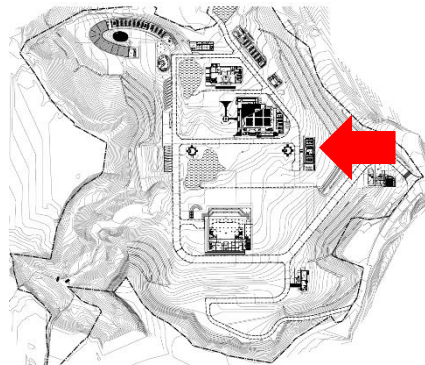

北








AU-45既有水溝加蓋施作



AU-45既有水溝加蓋施作

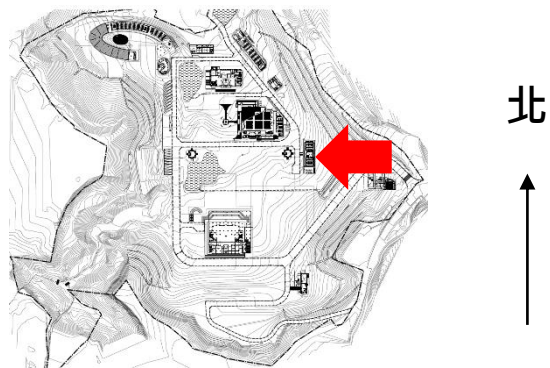






AU-44既有水溝加蓋施作

AU-44既有水溝加蓋施作

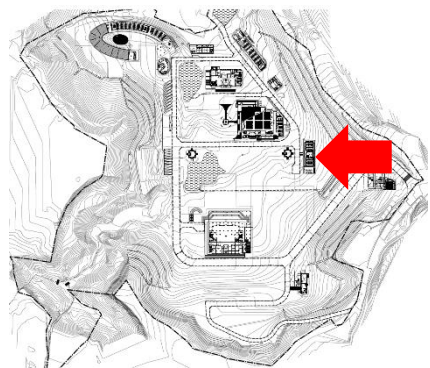

北



# 正覺寺新建工程


## 預定進度表

## 進度管理

	道路AC	預計開始	預計完成
	第一階段	2022/12/06	2022/12/08
	第二階段	2023/01/12	2023/01/19
	第三階段	2023/01/12	2023/01/19
	第四階段	2023/02/20	2023/02/25
	第五階段	2023/03/01	2023/03/04

### 目前完成進度

道路AC鋪設:41.4%(6015m<sup>2</sup>)

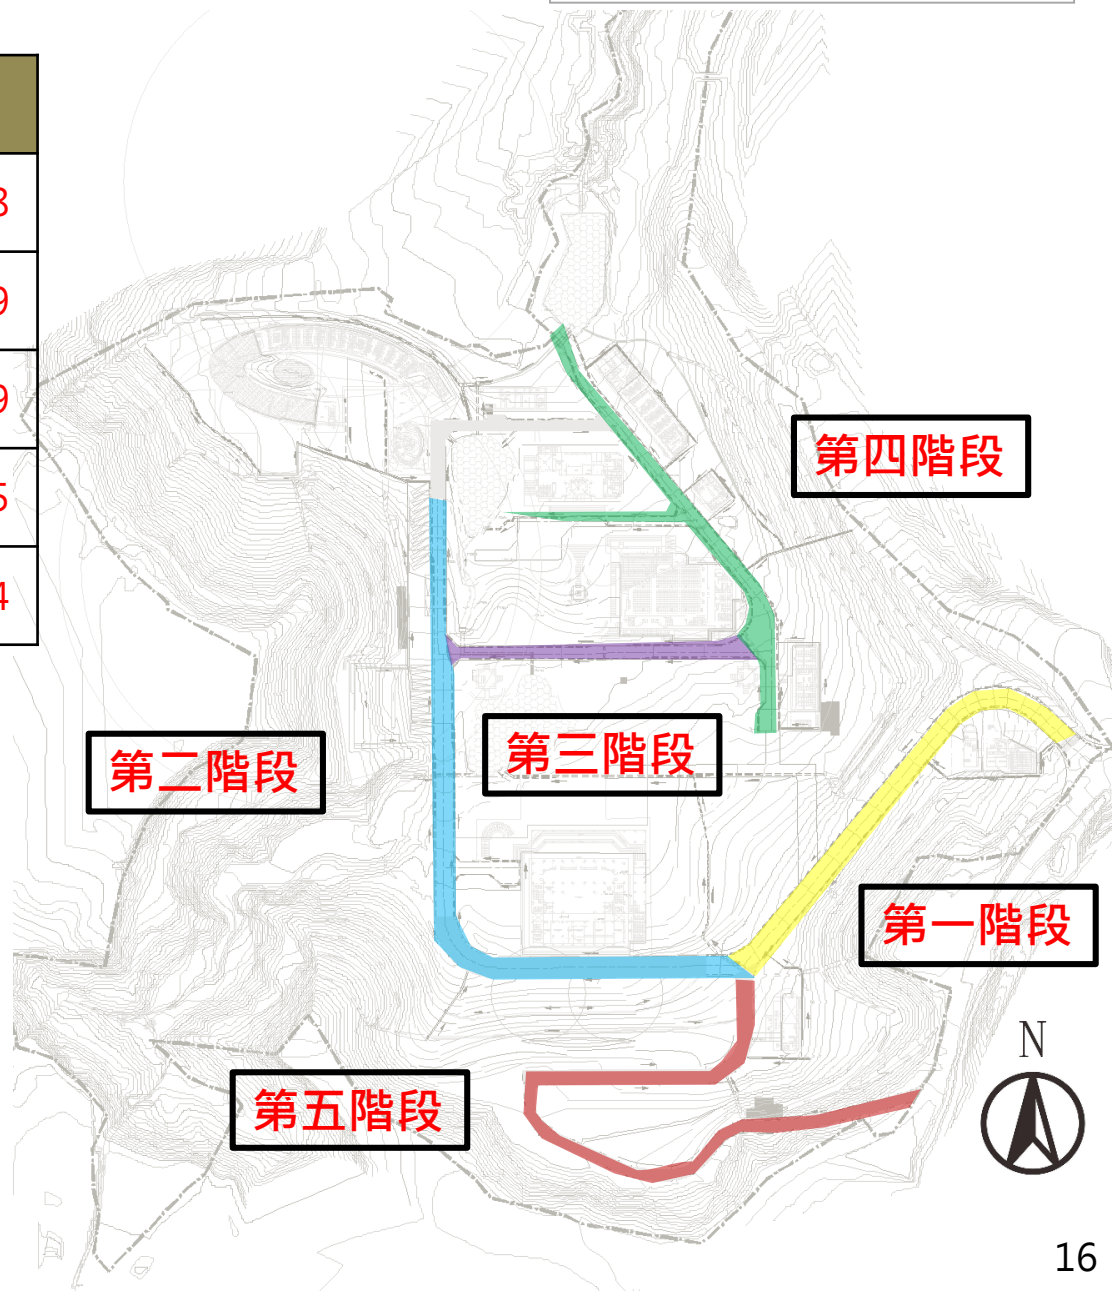






### 1-1a道路AC第三黏層油施作

### 1-2道路AC第三黏層油施作

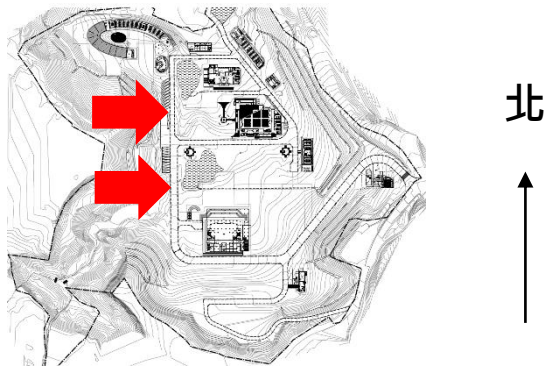






1-1b道路AC第三黏層油施作



4道路AC第三黏層油施作

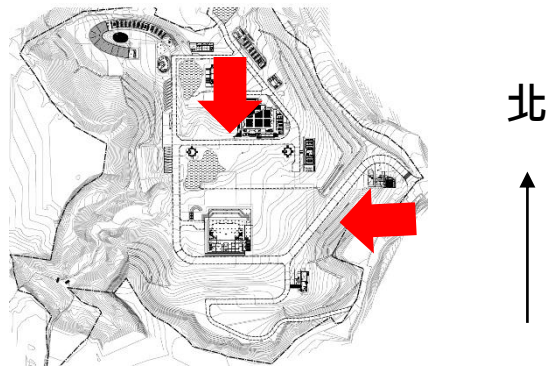




# 正覺寺新建工程

## 預定進度表

### 進度管理

地工	預計開始	預計完成
主殿排樁	2023/01/05	2023/02/10
主殿基樁	2023/03/09	2023/04/14
女寮排樁	2023/02/10	2023/03/11
女寮基樁	2023/04/16	2023/05/17
玄文排樁	2023/02/10	2023/02/28
玄文基樁	2023/04/15	2023/04/27
齋堂排樁	2023/03/12	2023/04/15
齋堂基樁	2023/05/18	2023/05/31
司機排樁	2023/03/01	2023/03/09

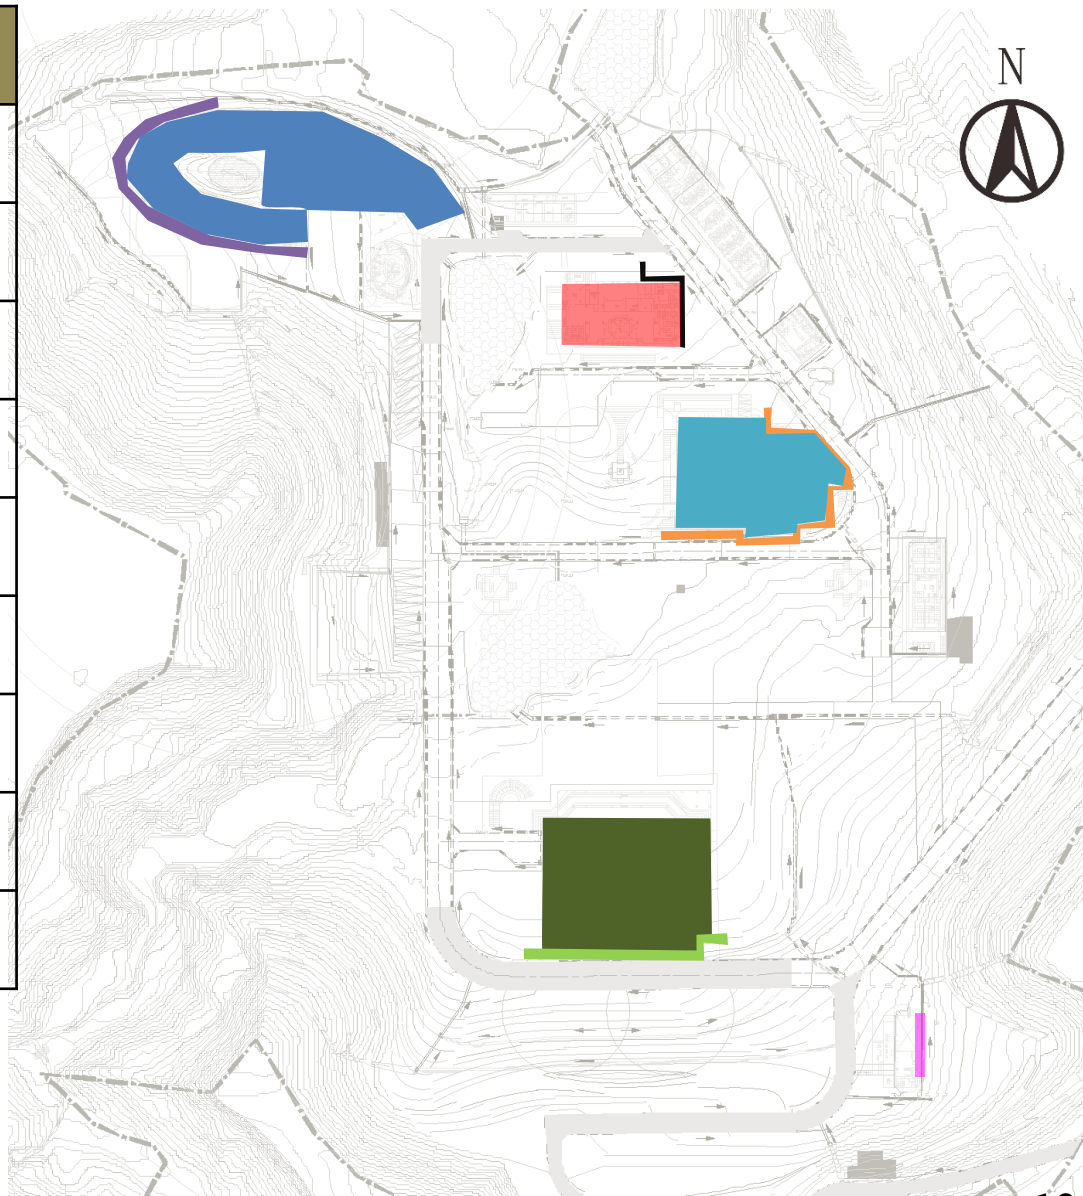


鋼軌樁施作時間暫定為開挖前





鋼筋籠綁紮

鋼筋籠綁紮

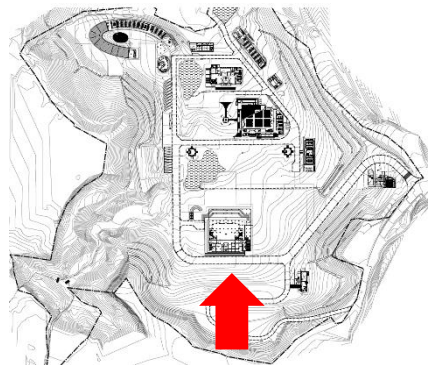

北








鋼筋籠查驗



鋼筋籠查驗

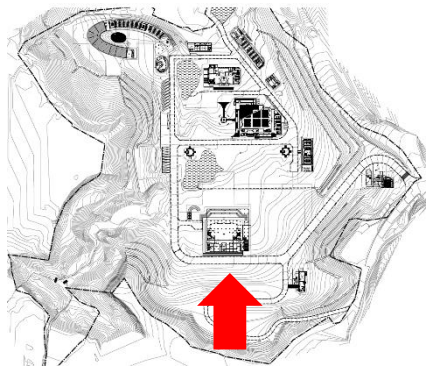

北








鑽掘



下鋼筋籠

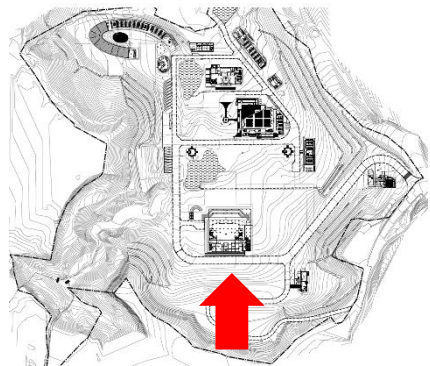

北








### 深度查驗



### 間隔器查驗

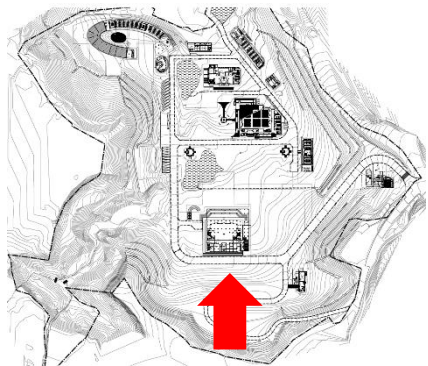

北





# 正覺寺新建工程

## 預定進度表

## 進度管理


### 排水管路進度

排水現階段進度

高壓、動力、弱電現階段進度

消防、給水、澆灌、雨水回收現階段進度

外管路	預計開始	預計完成
第一階段	2022/04/20	2022/06/25
第二階段	2022/06/26	2023/07/31
第三階段	2022/08/01	2023/07/31

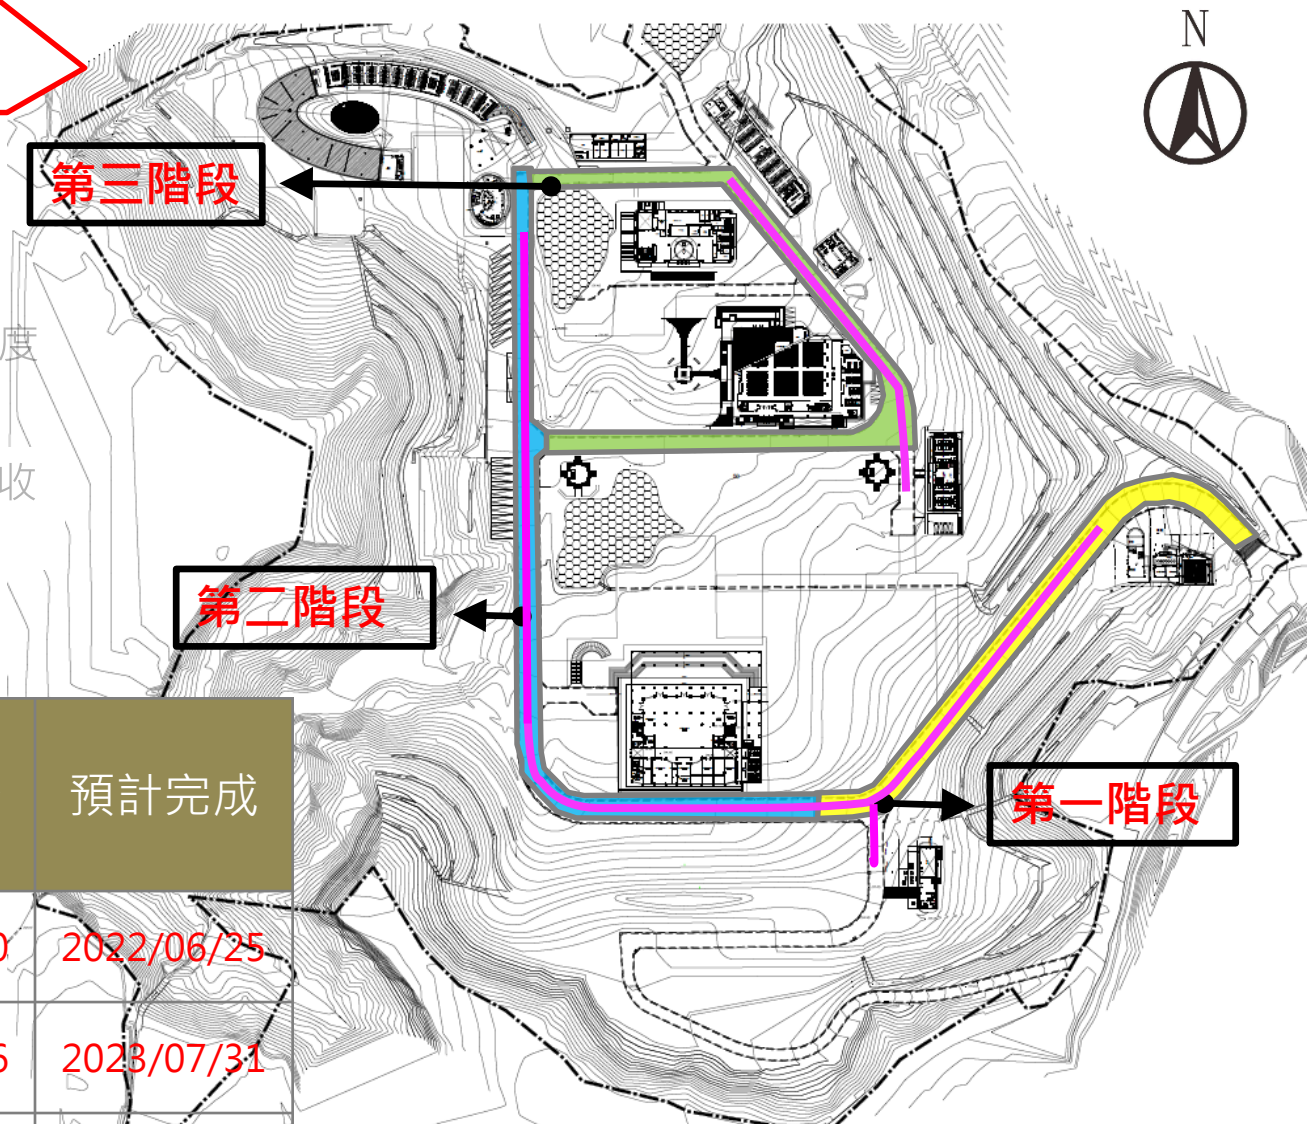

目前完成進度  
排水:84.71%(1119M)



# 正覺寺新建工程

## 預定進度表

## 進度管理


### 高壓、動力、弱電管路進度

污水現階段進度

高壓、動力、弱電現階段進度

消防、給水、澆灌、雨水回收  
現階段進度

外管路	預計開始	預計完成
第一階段	2022/04/20	2022/06/25
第二階段	2022/06/26	2023/07/31
第三階段	2022/08/26	2023/07/31

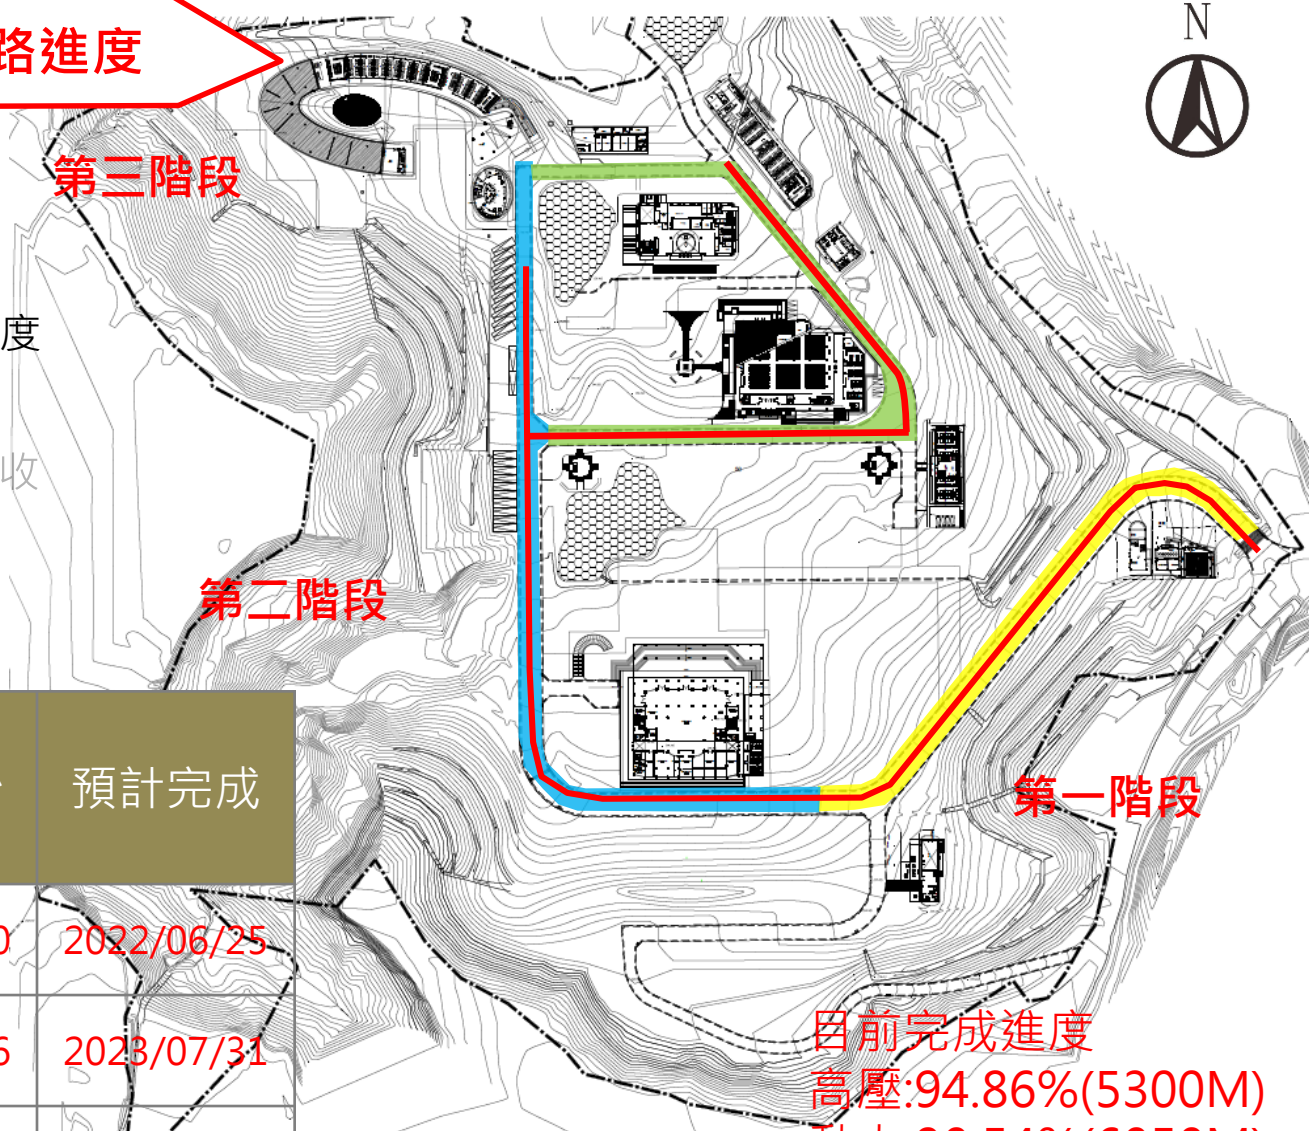

目前完成進度  
高壓:94.86%(5300M)  
動力:90.54%(6050M)  
弱電:90.06%(5317M)




### 消防、給水、澆灌、雨水回收管路進度

污水現階段進度

高壓、動力、弱電現階段進度

消防、給水、澆灌、雨水回收  
現階段進度

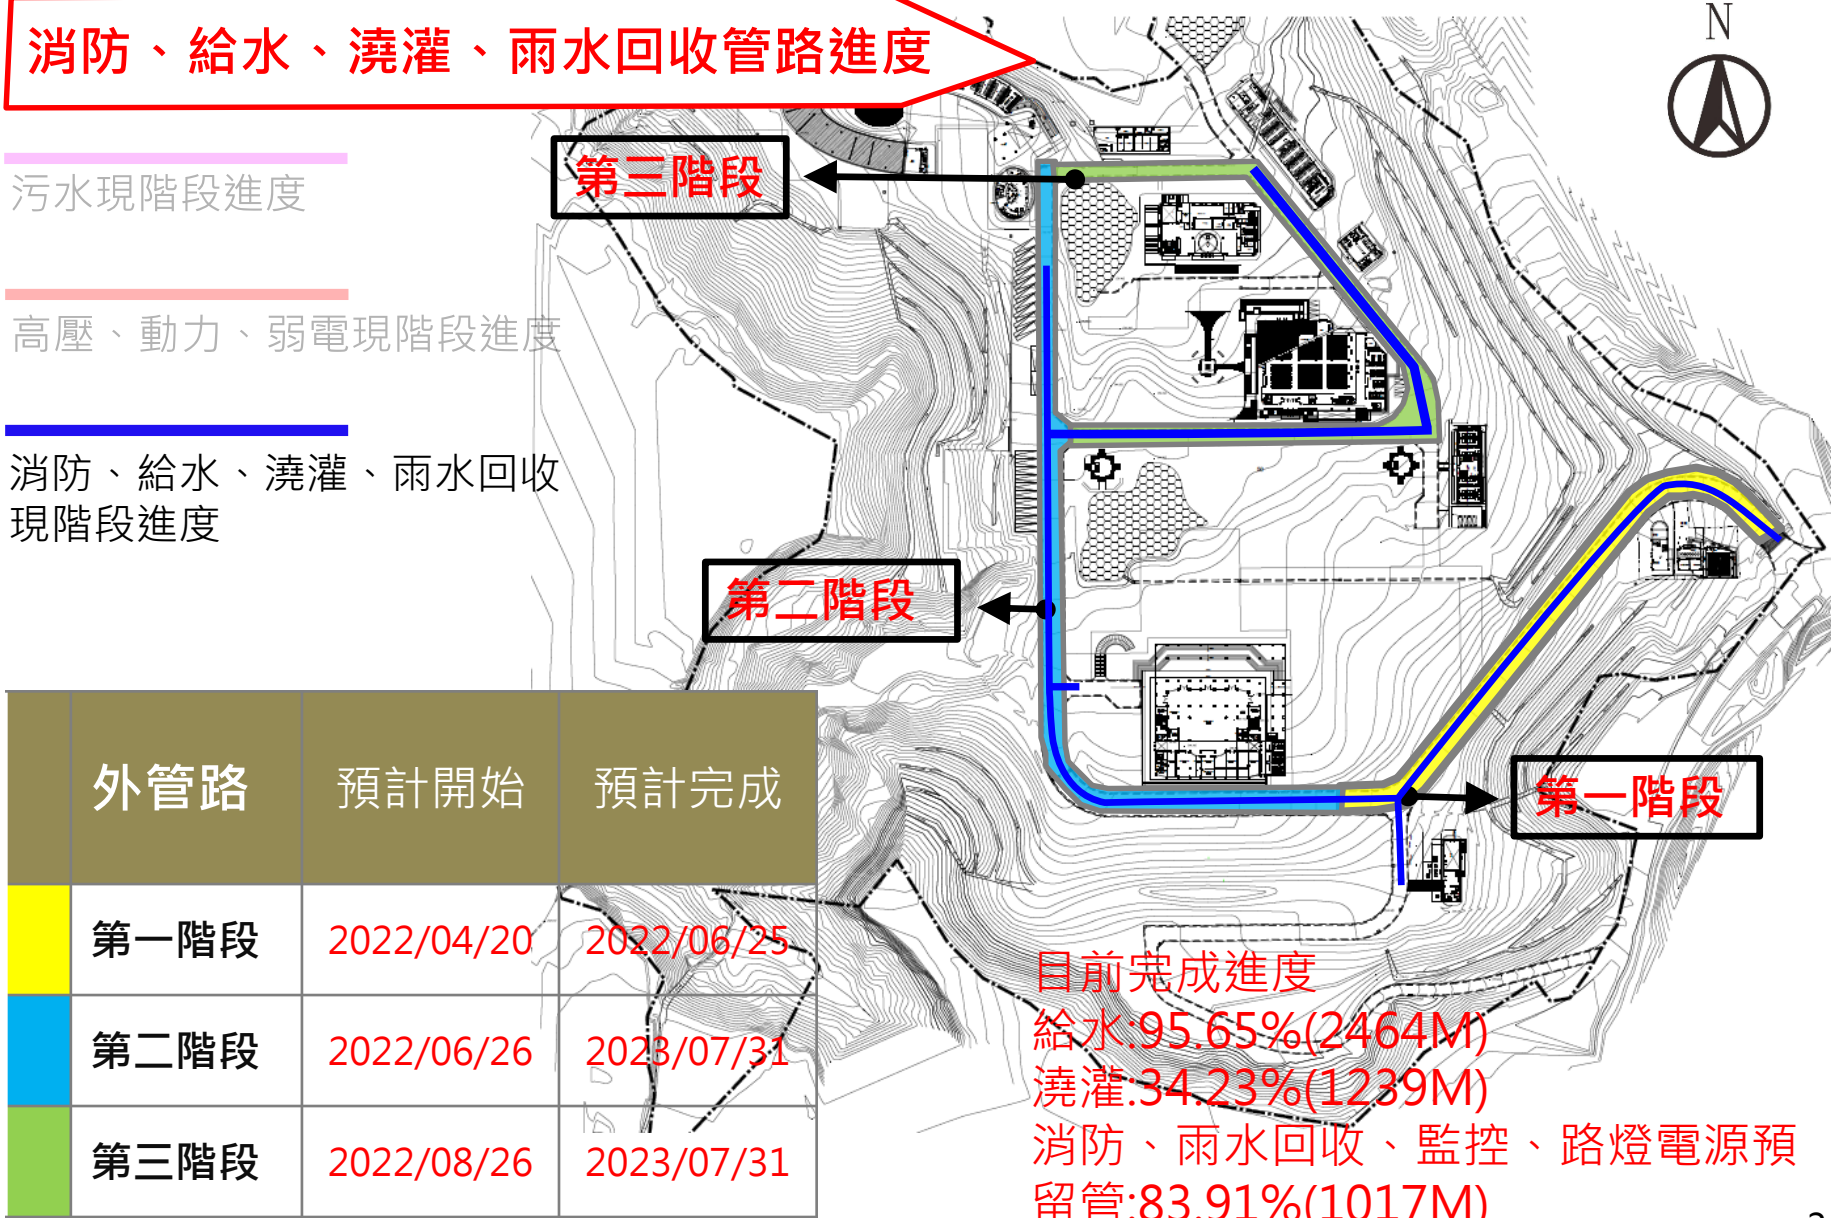

外管路	預計開始	預計完成
第一階段	2022/04/20	2022/06/25
第二階段	2022/06/26	2023/07/31
第三階段	2022/08/26	2023/07/31

目前完成進度

給水:95.65%(2464M)

澆灌:34.23%(1239M)

消防、雨水回收、監控、路燈電源預


留管:83.91%(1017M)





污水管路#18至#18-1路徑變更

污水管路#18至#18-1路徑變更

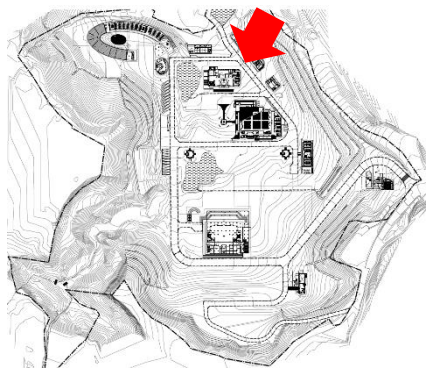

北








傳達室澆灌管路回填



傳達室澆灌管路回填

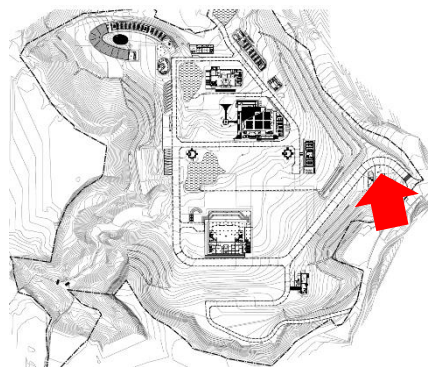

北








污水管路#18至#18-1回填

污水管路#18至#18-1回填

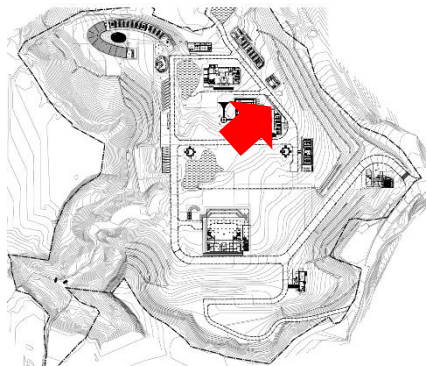

北

