


正覺寺新建工程2303地工基樁工程進場

地工	預計開始	預計完成	實際完成
主殿排樁	2023/01/05	2023/02/10	2023/02/04
主殿基樁	2023/04/13	2023/05/31	
女寮排樁	2023/02/11	2023/03/08	2023/03/08
女寮基樁	2023/03/09	2023/04/12	
玄文排樁	2023/03/06	2023/03/17	2023/03/23
玄文基樁	2023/05/18	2023/05/31	
齋堂排樁	2023/03/25	2023/04/14	
齋堂基樁	2023/04/15	2023/05/17	
司機排樁	2023/03/18	2023/03/24	2023/3/14

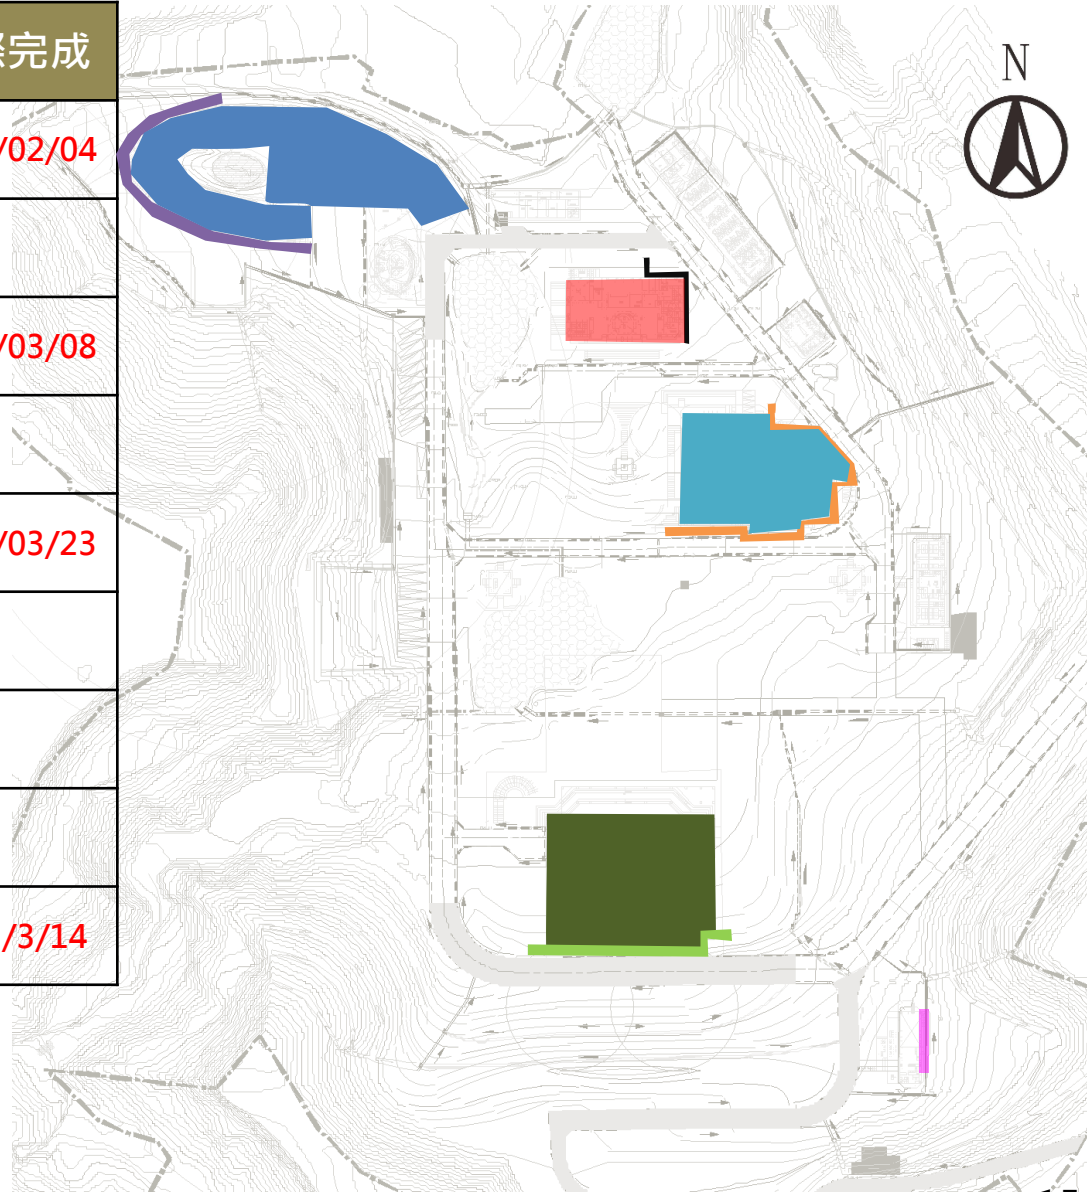

鋼軌樁施作時間暫定為開挖前

正覺寺新建工程

水保預定進度表

進度管理

道路水溝	預計開始	預計完成	實際完成
第一階段	2022/08/22	2022/09/28	2022/10/05
第二階段	2022/09/29	2022/11/10	2022/11/15
第三階段	2022/11/11	2022/11/25	2022/12/05
第四階段	2022/11/26	2023/02/10	2023/02/20
第五階段	2023/02/11	2023/03/10	2023/03/10
第六階段	2023/03/11	2023/05/31	

目前完成進度

既有矩形溝(加蓋):95.5%(1596M)

新設矩形暗溝:34.2%(824M)


新設集水井:36.5%(26座)

既有矩形溝(改暗溝):0%(0M)

既有箱涵(改暗溝):0%(0M)

新設管涵:0%(0M)

新設拍漿溝:0%(0M)

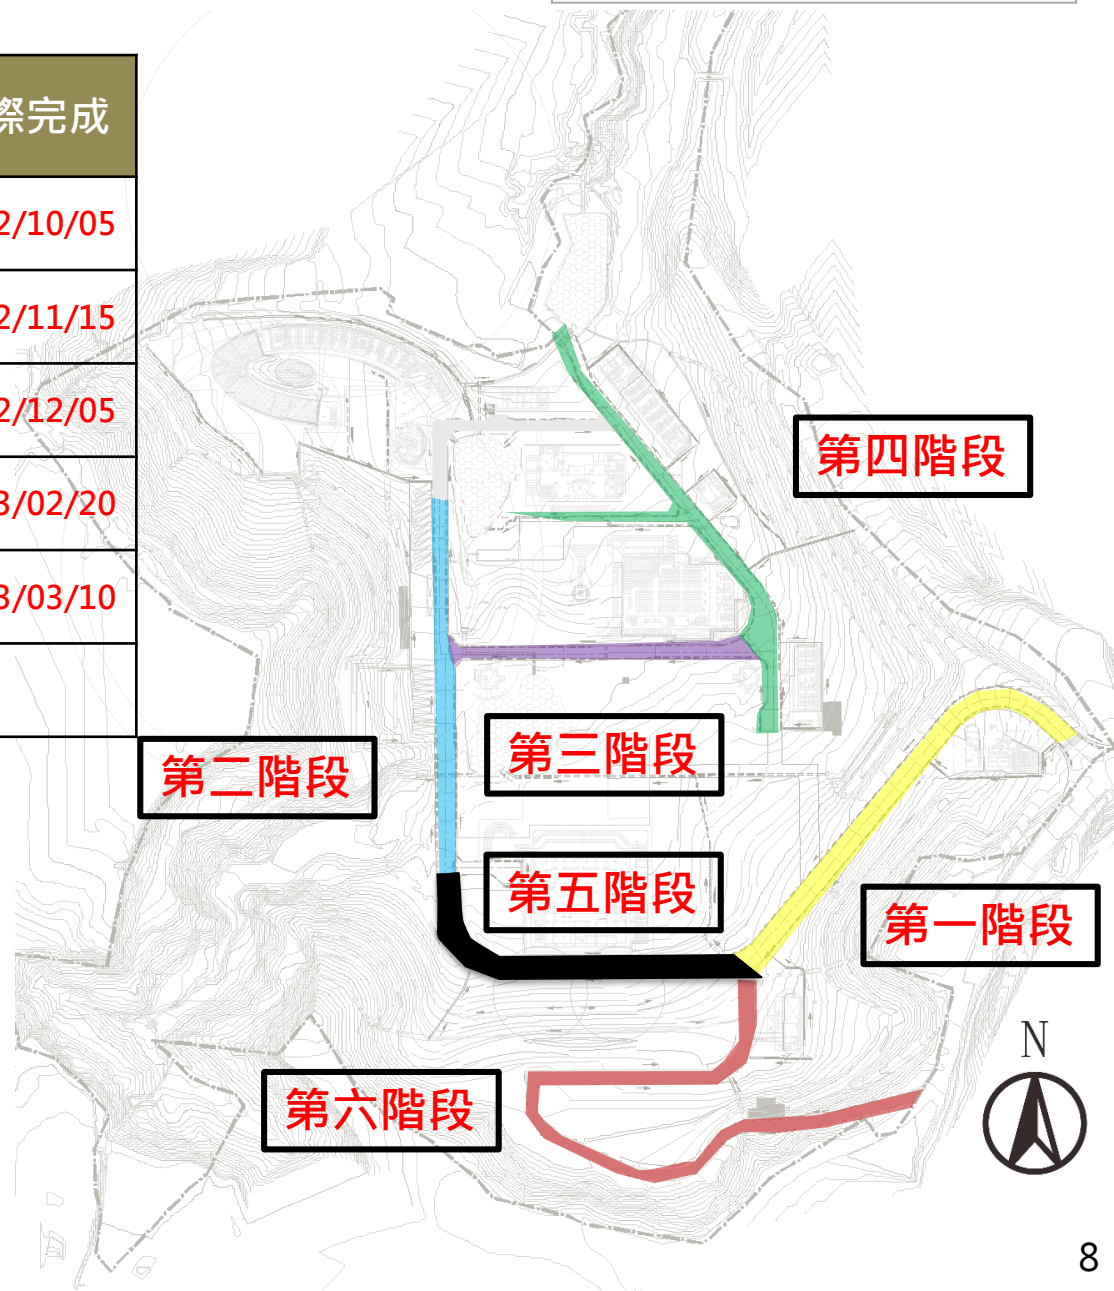


正覺寺新建工程

水保預定進度表

進度管理

	型式	預計開始	預計完成	實際完成
	R1擋土牆	2022/09/12	2022/11/30	2022/11/28
	R3擋土牆	2022/12/01	2022/12/31	2023/12/24
	R2擋土牆	2023/01/01	2023/01/31	2023/01/04
	PA滯洪池	2022/08/22	2023/02/28	
	PB滯洪池	2022/10/15	2023/02/28	
	PC滯洪池	2023/02/28	2023/05/31	
	靜水池	2023/06/01	2023/06/20	

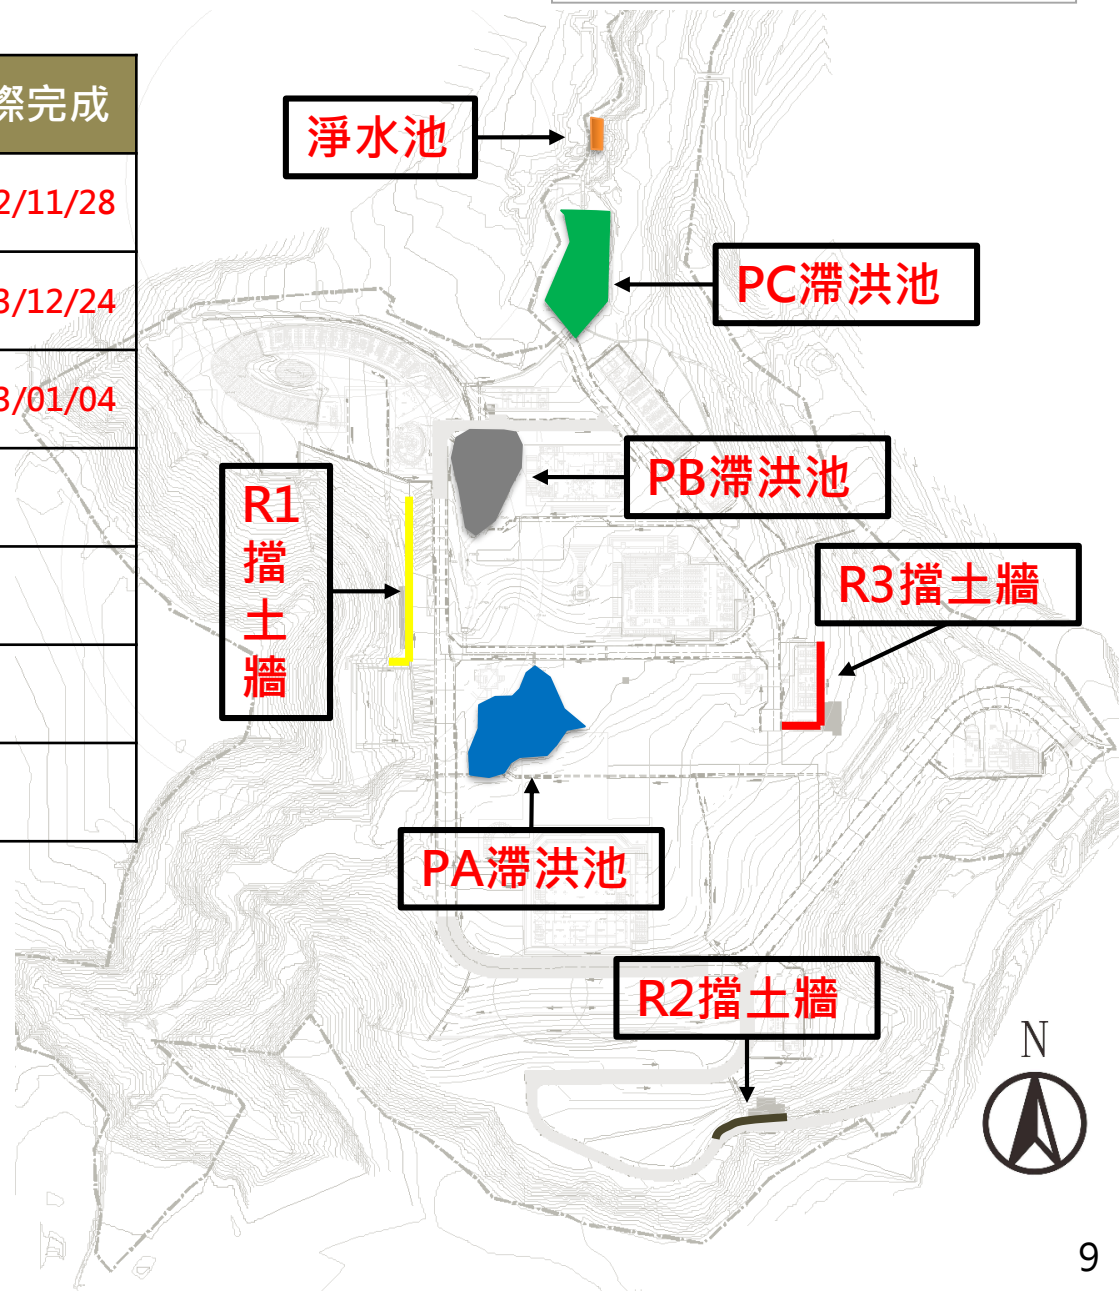

目前完成進度

擋土牆:100%(3座)

滯洪池:74.3%(2.23座)

靜水池:0%(0座)

正覺寺新建工程


道路AC預定進度表

進度管理

道路AC	預計開始	預計完成	實際完成
第一階段	2022/12/06	2022/12/08	2022/12/13
第二階段	2023/01/12	2023/01/19	2023/01/19
第三階段	2023/01/12	2023/01/19	2023/01/19
第四階段	2023/03/13	2023/03/15	
第五階段	2023/04/10	2023/04/15	
第六階段	2023/06/10	2023/6/15	

目前完成進度

道路AC鋪設:41.4%(6015m²)

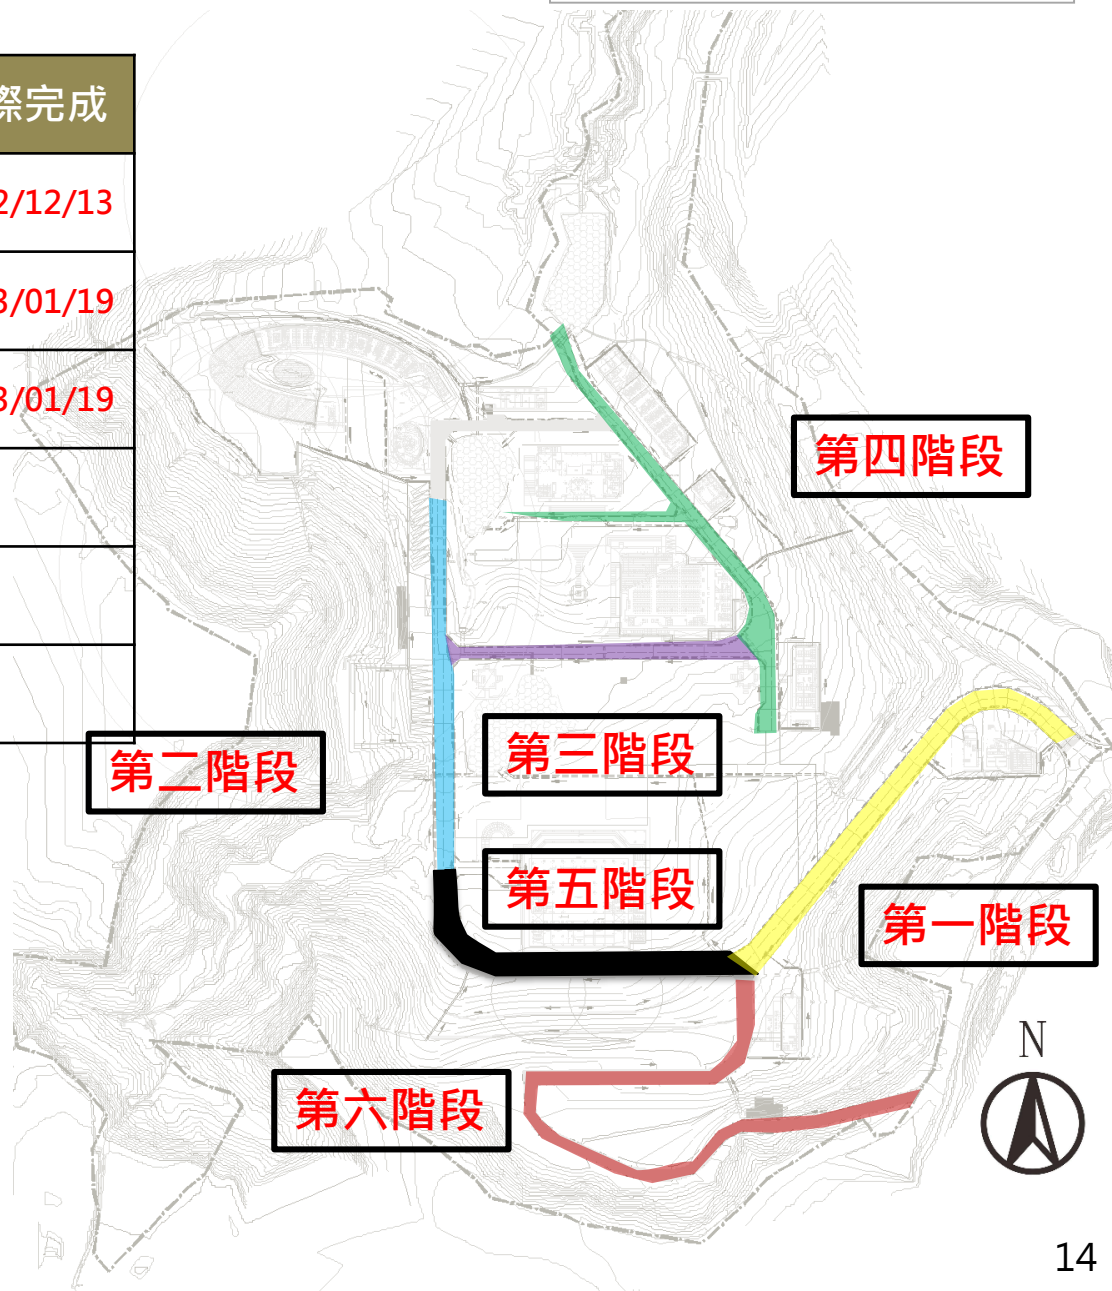




鑽掘



鋼筋籠綁紮

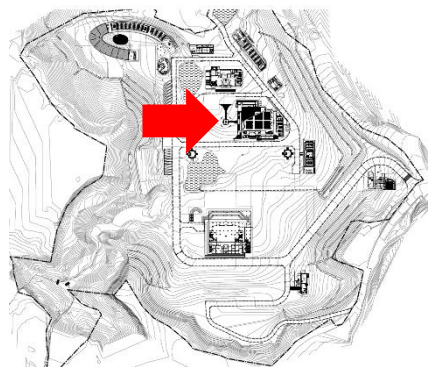

北






鋼筋籠查驗



鋼筋間隔器查驗

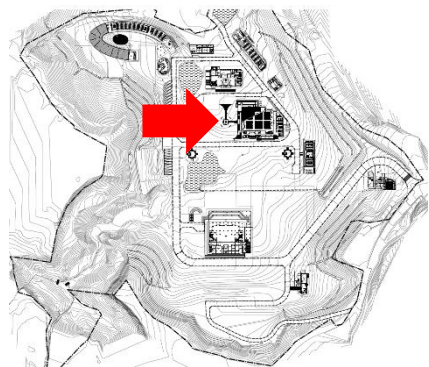


北





鋼筋籠護耳焊接

鋼筋籠焊接

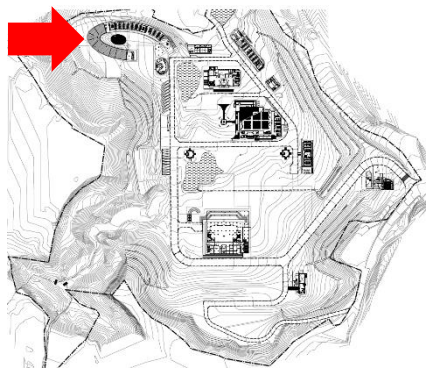

北






深度查驗



鋼筋籠查驗

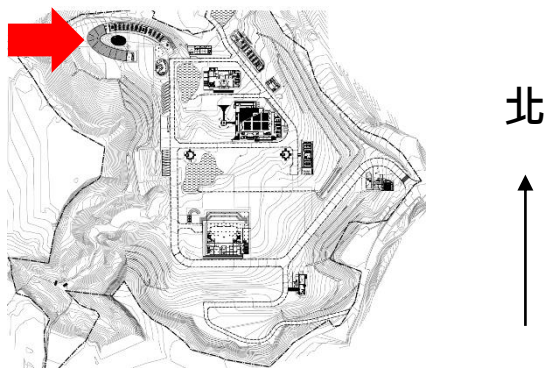




樁頭劣質打除



樁頭劣質打除

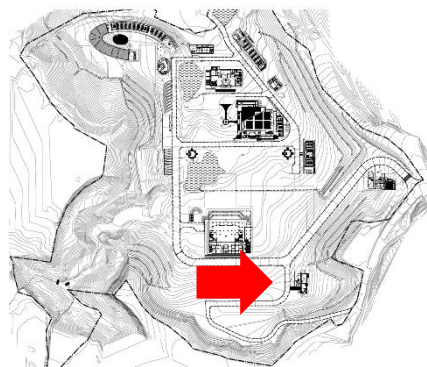

北



正覺寺新建工程

預定進度表

進度管理


排水管路進度

排水現階段進度

高壓、動力、弱電現階段進度

消防、給水、澆灌、雨水回收現階段進度

外管路	預計開始	預計完成
第一階段	2022/04/20	2022/06/25
第二階段	2022/06/26	2023/07/31
第三階段	2022/08/01	2023/07/31

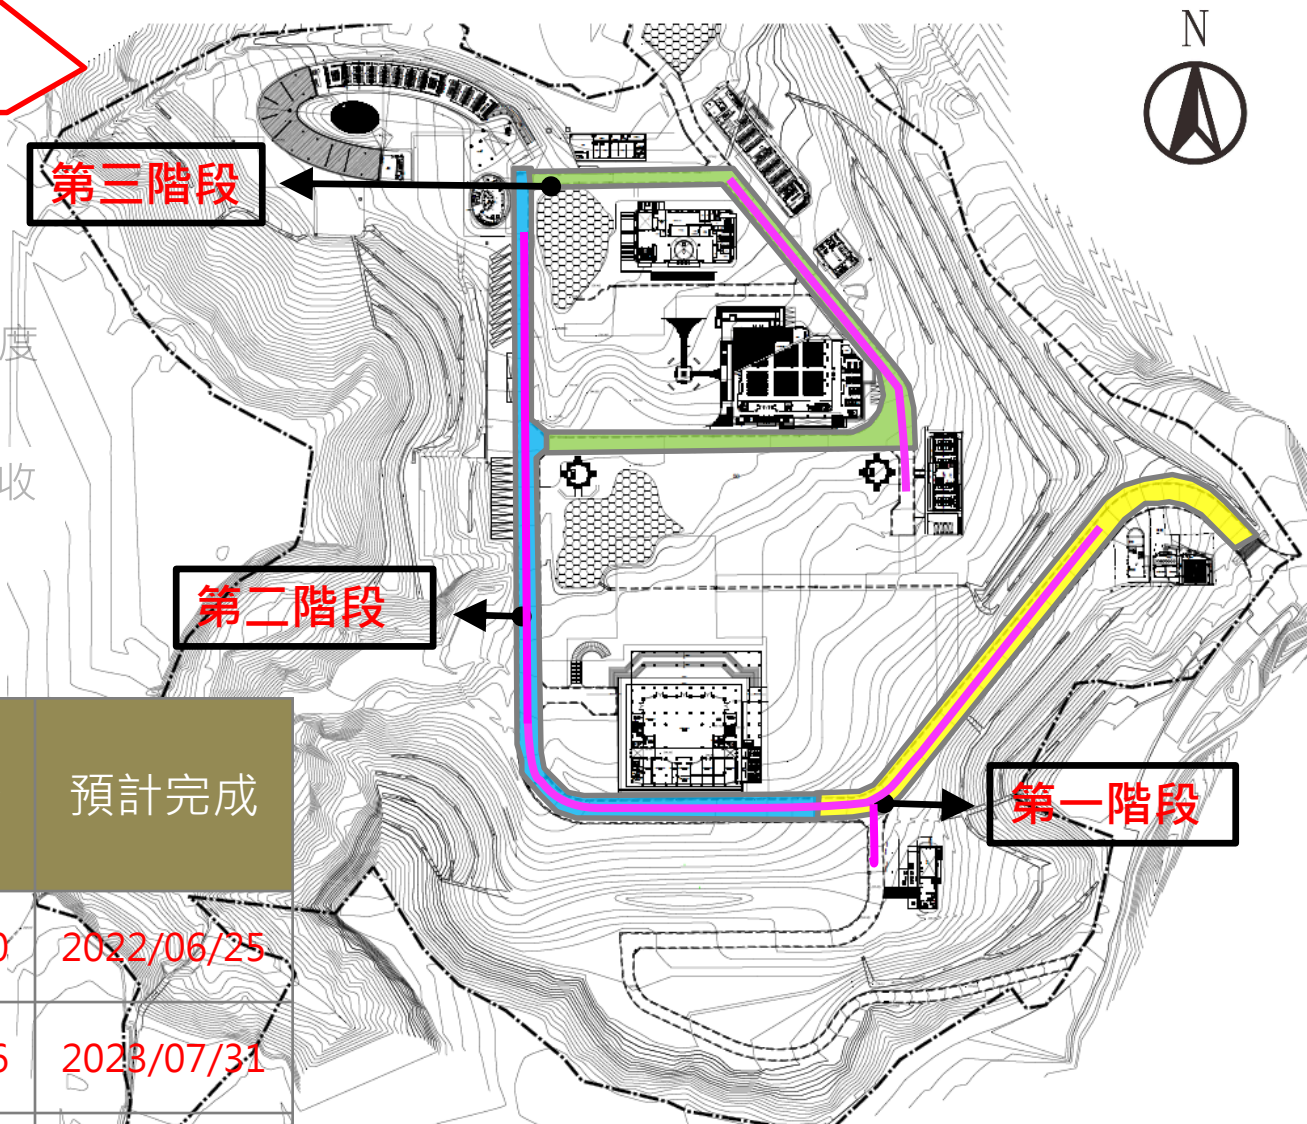

目前完成進度
排水:84.71%(1119M)

正覺寺新建工程

預定進度表

進度管理


高壓、動力、弱電管路進度

污水現階段進度

高壓、動力、弱電現階段進度

消防、給水、澆灌、雨水回收
現階段進度

外管路	預計開始	預計完成
第一階段	2022/04/20	2022/06/25
第二階段	2022/06/26	2023/07/31
第三階段	2022/08/26	2023/07/31

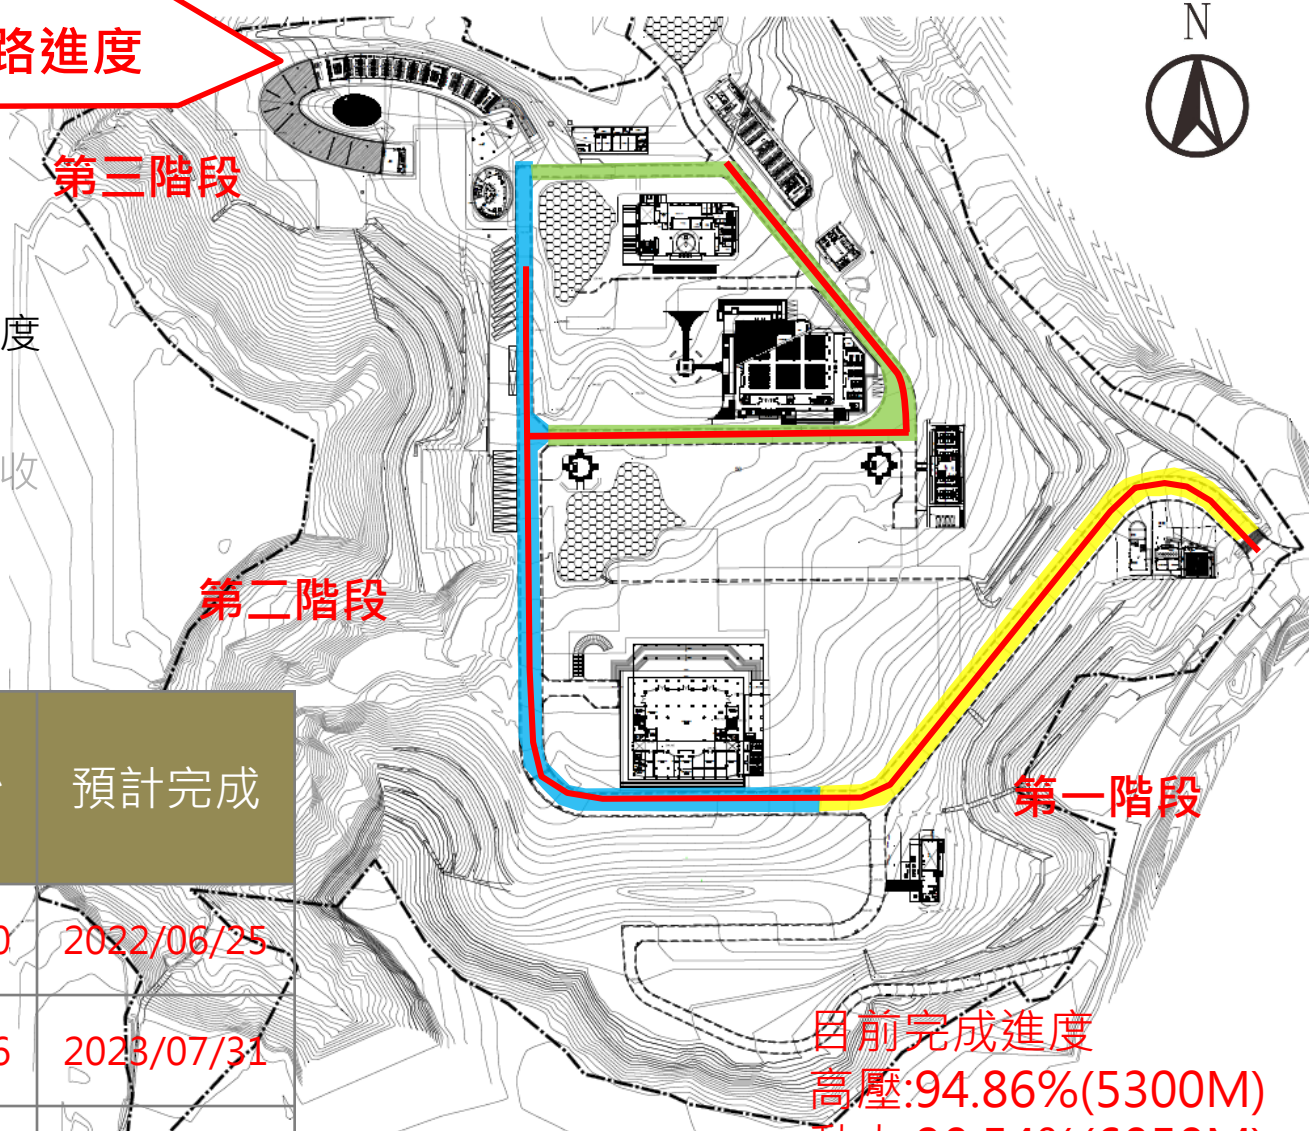

目前完成進度
高壓:94.86%(5300M)
動力:90.54%(6050M)
弱電:90.06%(5317M)

正覺寺新建工程

預定進度表

進度管理

消防、給水、澆灌、雨水回收管路進度

污水現階段進度

高壓、動力、弱電現階段進度

消防、給水、澆灌、雨水回收
現階段進度

外管路	預計開始	預計完成
第一階段	2022/04/20	2022/06/25
第二階段	2022/06/26	2023/07/31
第三階段	2022/08/26	2023/07/31

第三階段

第二階段

第一階段

目前完成進度

給水:95.65%(2464M)

澆灌:51.33%(1858M)

消防、雨水回收、監控、路燈電源預


留管:83.91%(1017M)





臨時水電管路施作

臨時水電管路施作

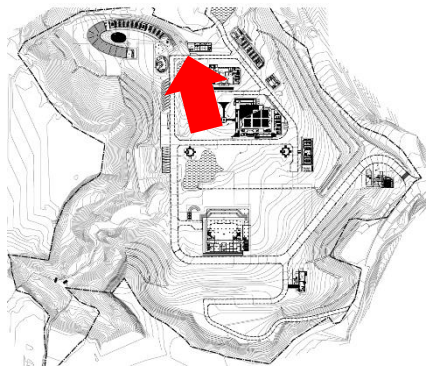


北





臨時水電管路施作


臨時水電管路施作

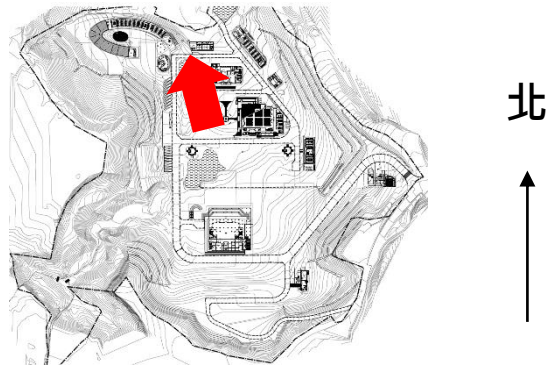



臨時水電管路施作

臨時水電管路施作

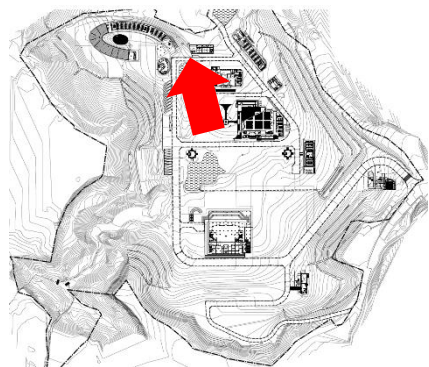

北

