

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月03日
施工工期	1171日曆天
累計工期	322日曆天（截至113年06月06日）
剩餘工期	849日曆天
預定進度(113.06.06)	16.23%
實際進度(113.06.06)	15.70%
本週進度(超前/ <u>落後</u>)	0.53%



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景




正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景



主殿



女寮

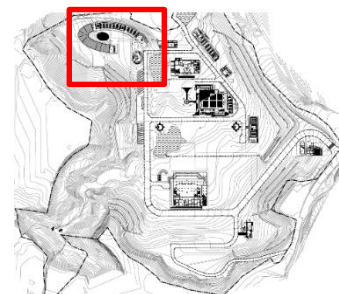




齋堂



玄文


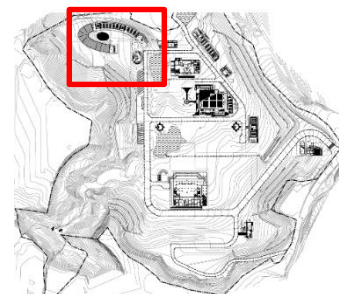




主殿PC打底、地梁放樣




齋堂第二層地錨施作

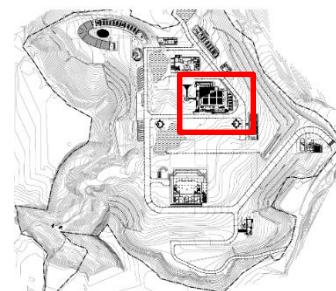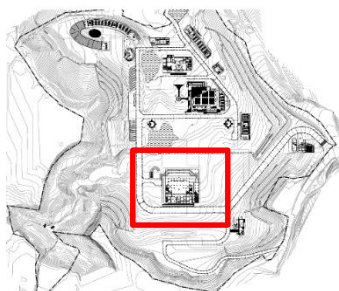




女寮2區2F梁版鋼筋、模板、水電施作

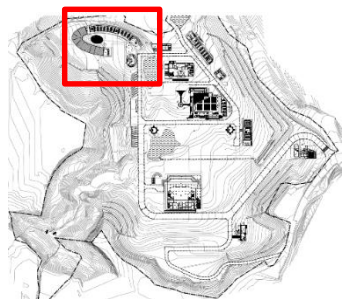


女寮1區B1F柱牆鋼筋、模板、水電施作

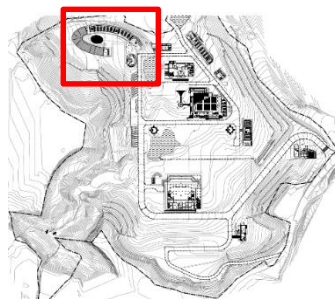




玄文第二層地錨施作、土方開挖

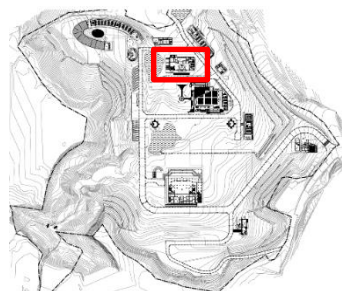

汙水處理廠外牆防水

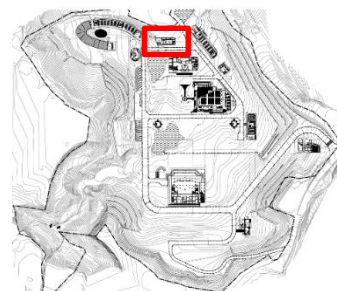



主殿



女寮





齋堂



玄文







主殿筏基層鋼筋、模板、機電施作




齋堂第二層地錨施作(42/42)

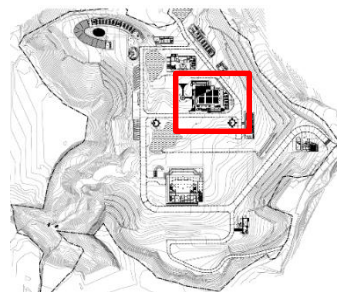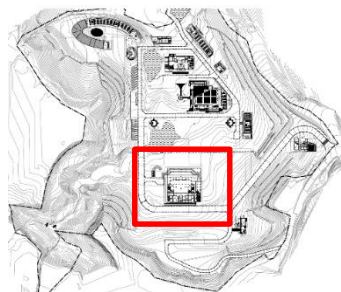




女寮2區1F板模板拆除

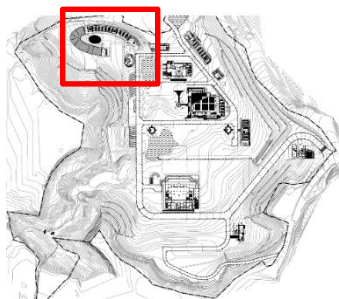

女寮1區B1F柱牆鋼筋、模板、水電施作
1F梁版模板施作


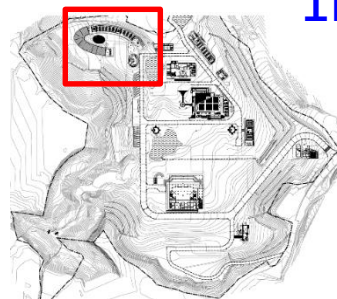




玄文第二層地錨試錨




汙水處理廠外牆拆架

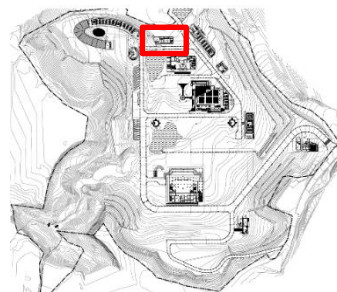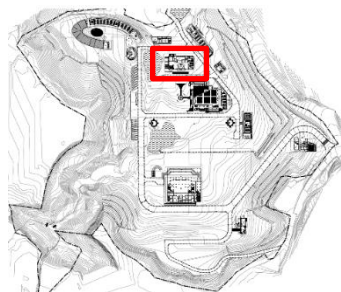



男常住鋼軌樁施作

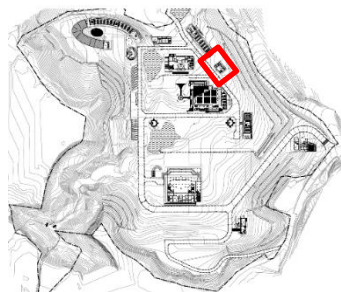

男義工鋼軌樁施作






主殿




女寮

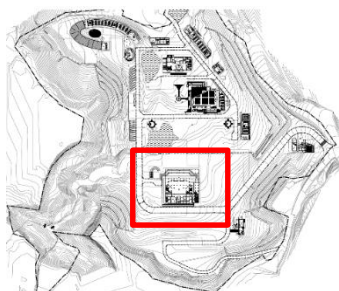



齋堂

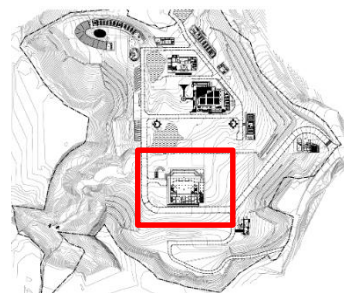

玄文







男義工




男常住

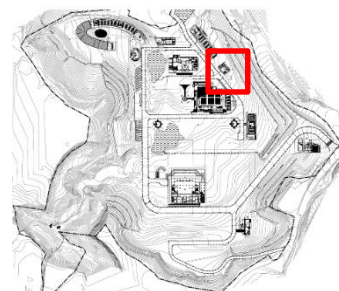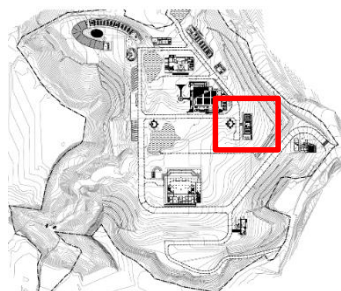




主殿基礎層鋼筋、模板、機電施作
(地梁已澆置完)

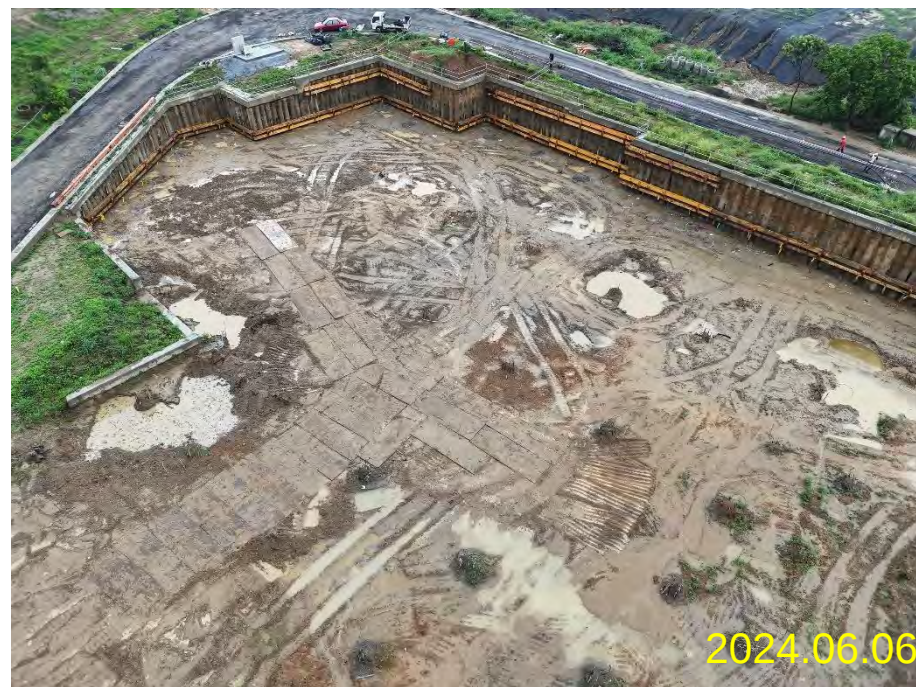

齋堂第二層地錨(圍令背填施作、施預力)
第三層土方開挖

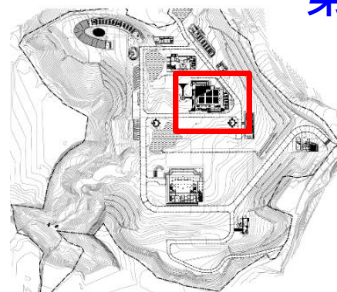



女寮2區2F柱牆鋼筋、模板、水電施作



女寮1區1F梁版鋼筋、模板、水電施作







玄文第二層地錨



汙水處理廠土方回填

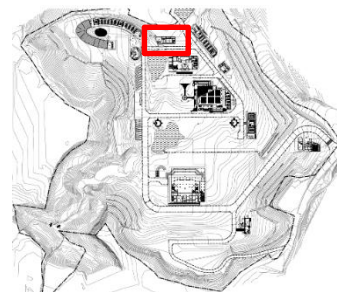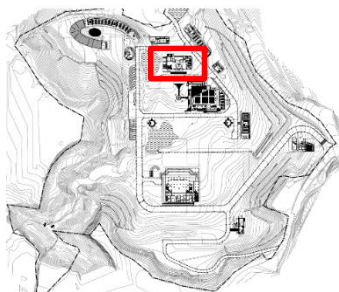




主殿




女寮

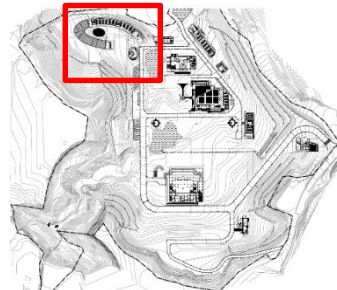




齋堂

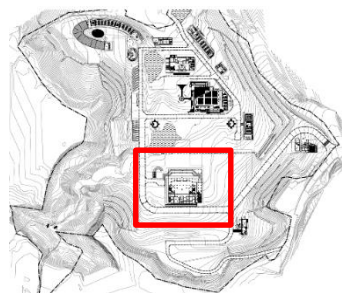


玄文

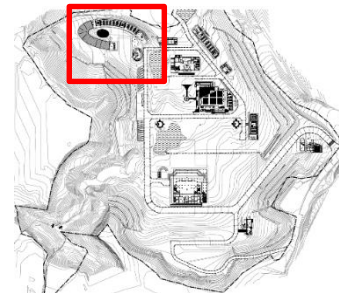




男義工

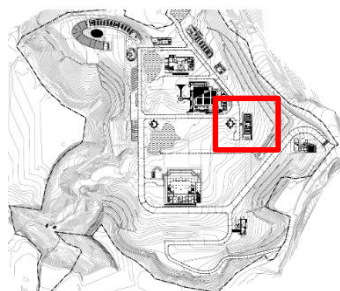

男常住

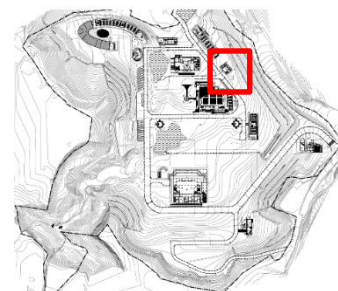




主殿基礎層模板、機電施作




齋堂第三層土方開挖

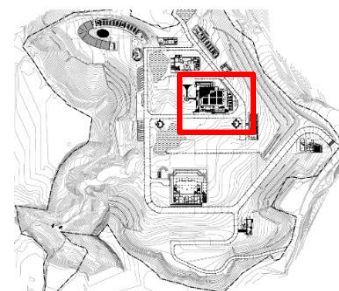




女寮2區2F柱牆鋼筋、模板、水電施作
2-2區基礎版澆置

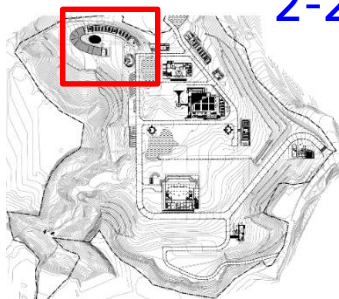


女寮1區1F梁版鋼筋、模板、水電施作
3區基礎版澆置

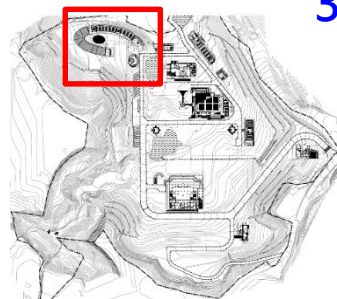



玄文第二層地錨

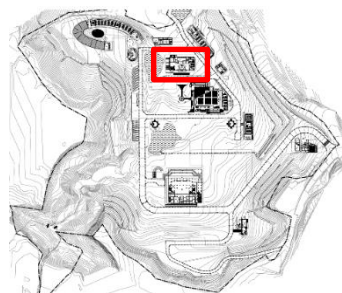

汙水處理廠土方回填
CLSM回填灌漿

