

工程成本進度


工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月08日
施工工期	1170日曆天+展延工期6天
累計工期	616日曆天（截至114年03月27日）
剩餘工期	560日曆天
預定進度(114.03.27)	32.64%
實際進度(114.03.27)	32.05%
本週進度(超前/落後)	0.59%



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片

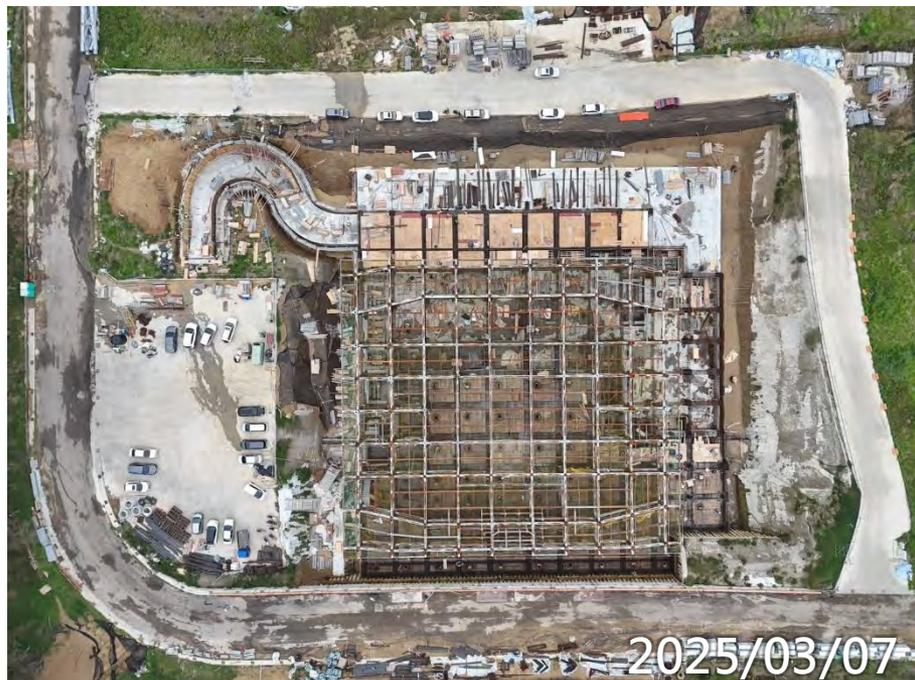

主殿



高版區地梁、低版區1F梁版、
車道牆鋼筋模板水電施作

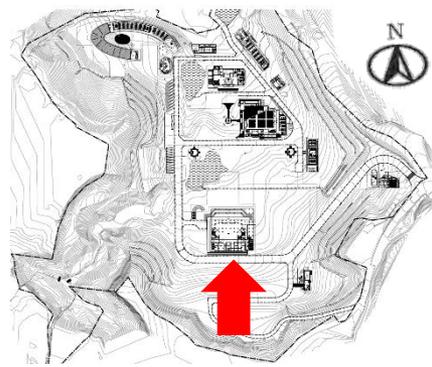

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



齋堂



2F-4F柱牆、4F梁版
鋼筋模板水電施作

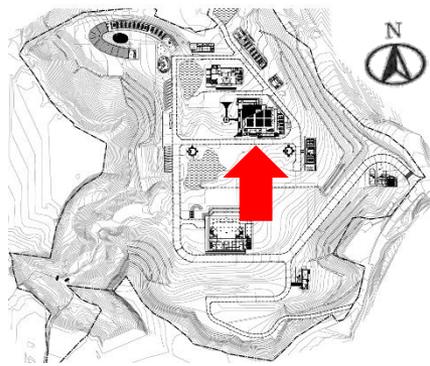

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



1F柱筋綁紮

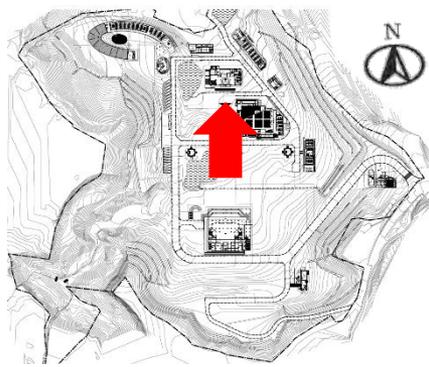

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女寮



4F柱牆、車道
鋼筋模板水電施作

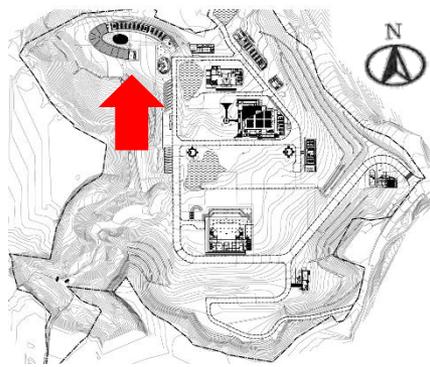

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住




1F柱牆施作

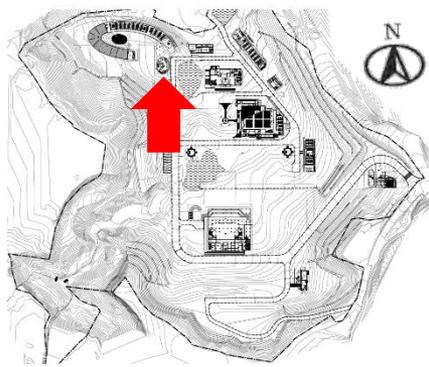

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片

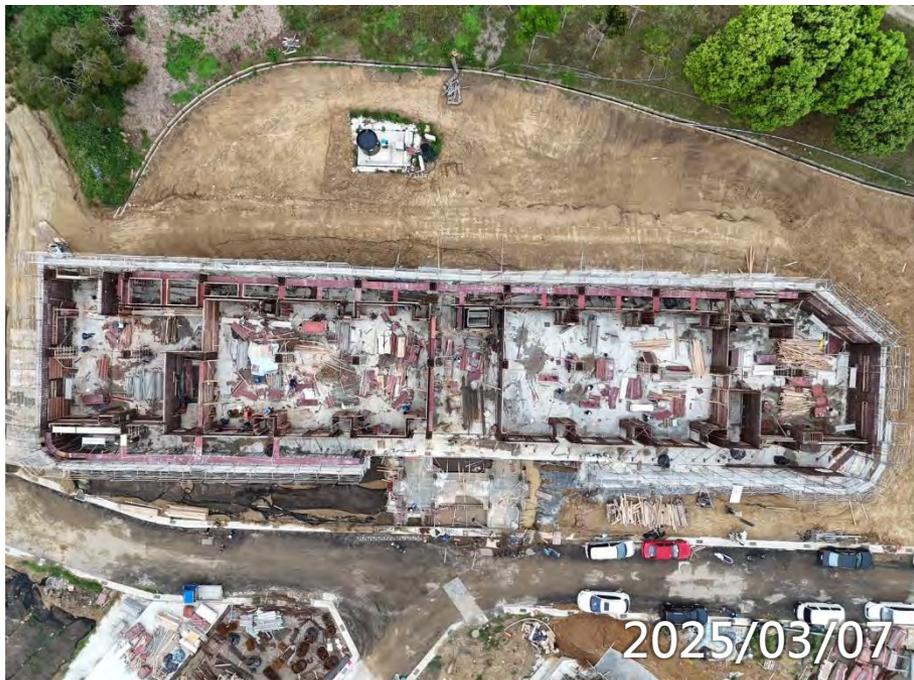

男寮



1F柱牆、2F梁版
鋼筋模板水電施作

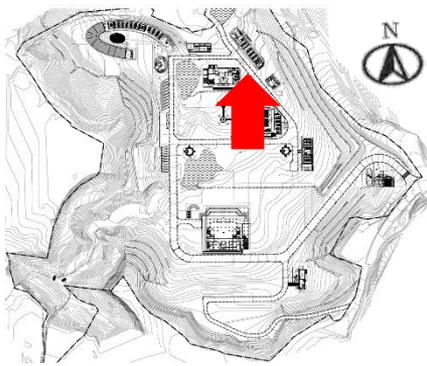

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男義工



RF梁鋼筋模板水電施作
鋼構預埋

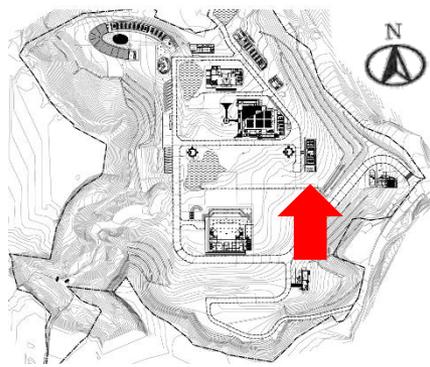

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男常住



RF梁澆置

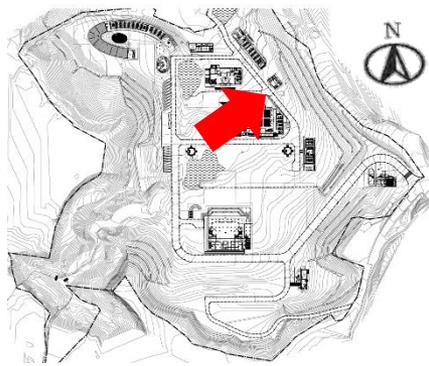




司機休息室



3F梁版澆置

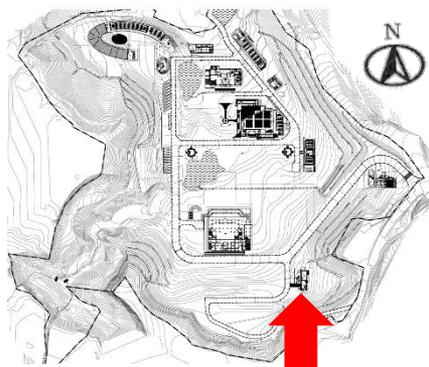




傳達室



土方開挖、噴漿護坡

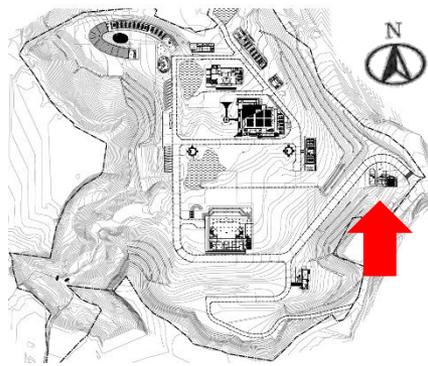





正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片

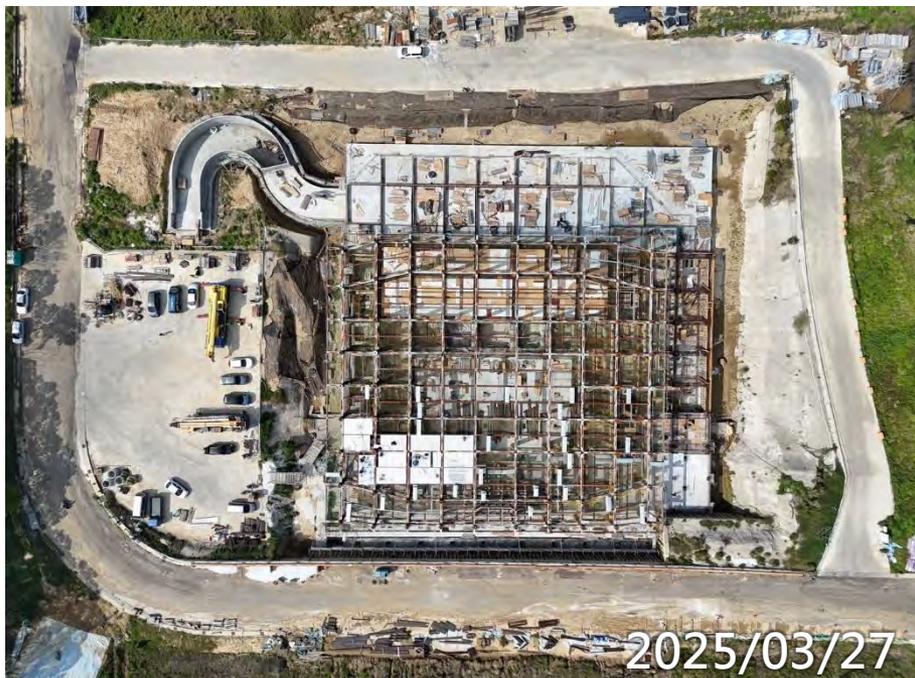

主殿

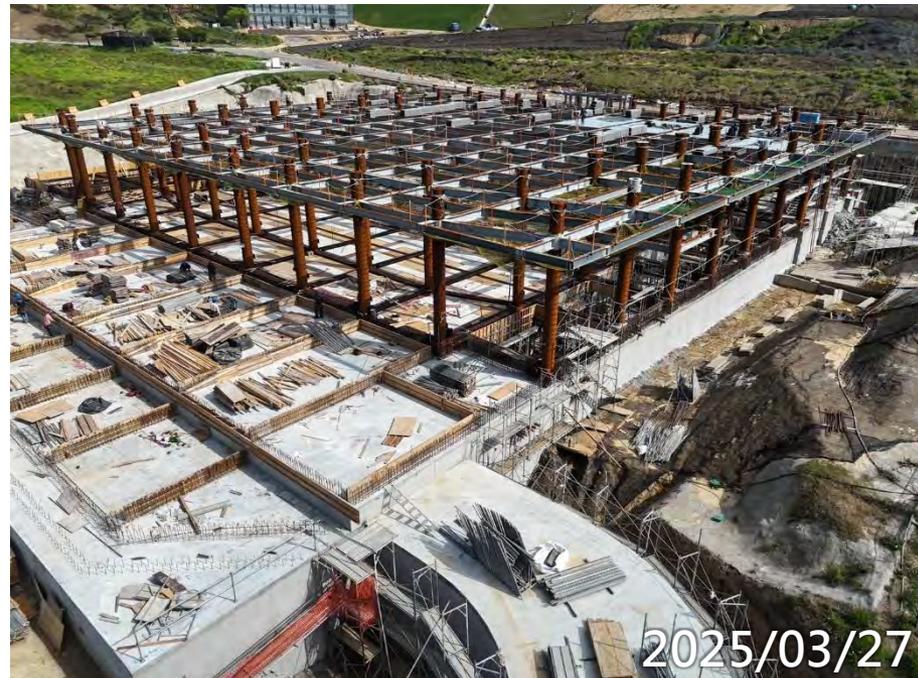


高版區1MF、2F鋼承鈹施作
低版區1F梁版鋼筋模板水電施作

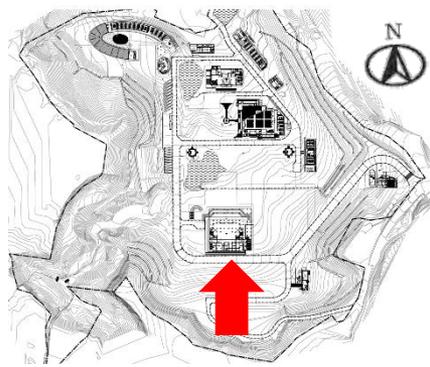

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片

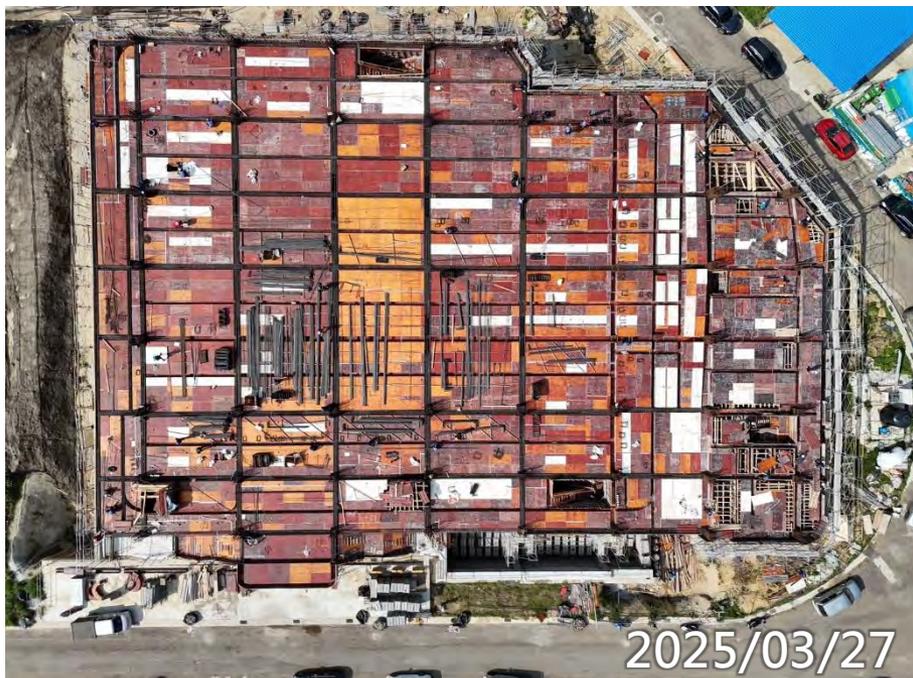

齋堂



2F-4F柱牆、4F梁版
鋼筋模板水電施作

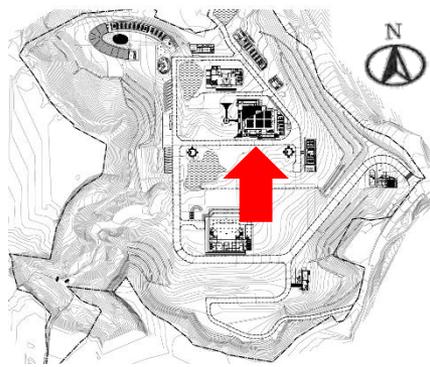

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



1F柱牆鋼筋模板水電施作

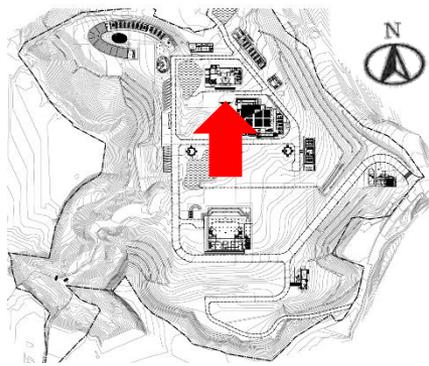

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女寮



4F柱牆鋼筋模板水電施作
B1F泥作吊線

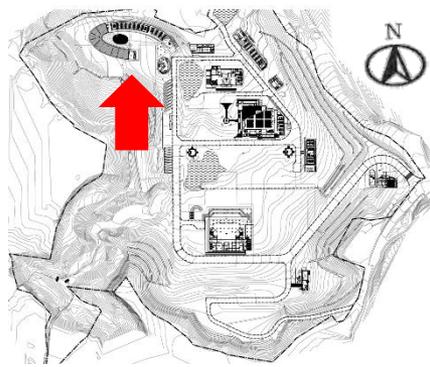





女常住




1F柱牆施作
筏基拆模

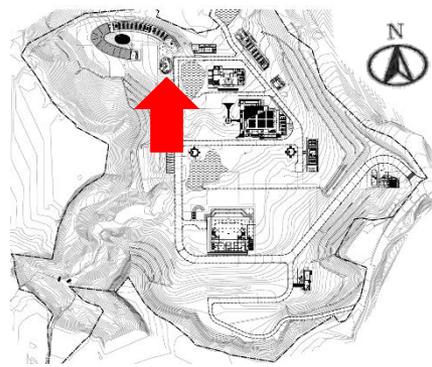


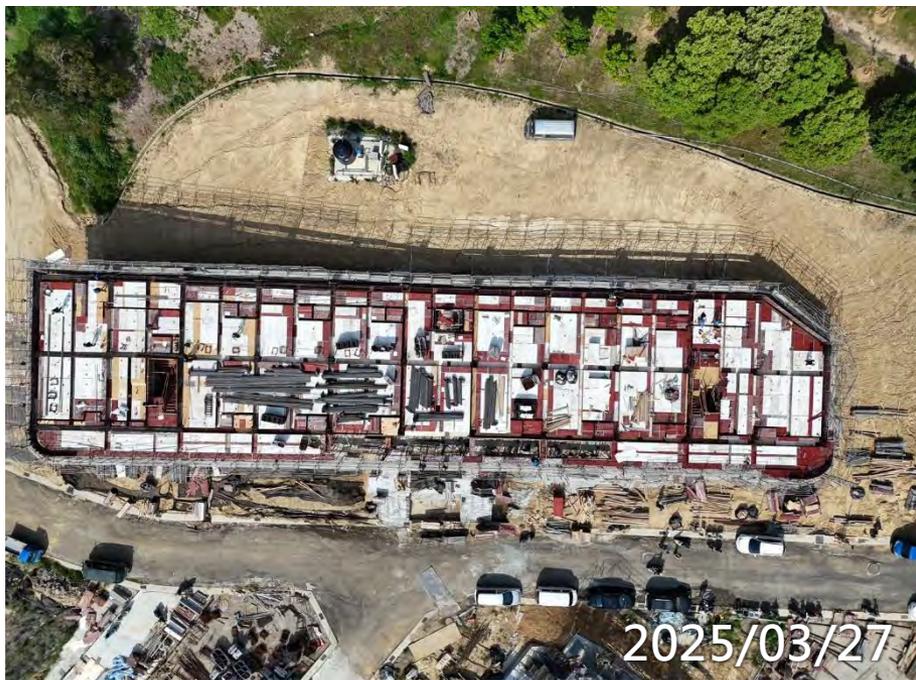

男寮

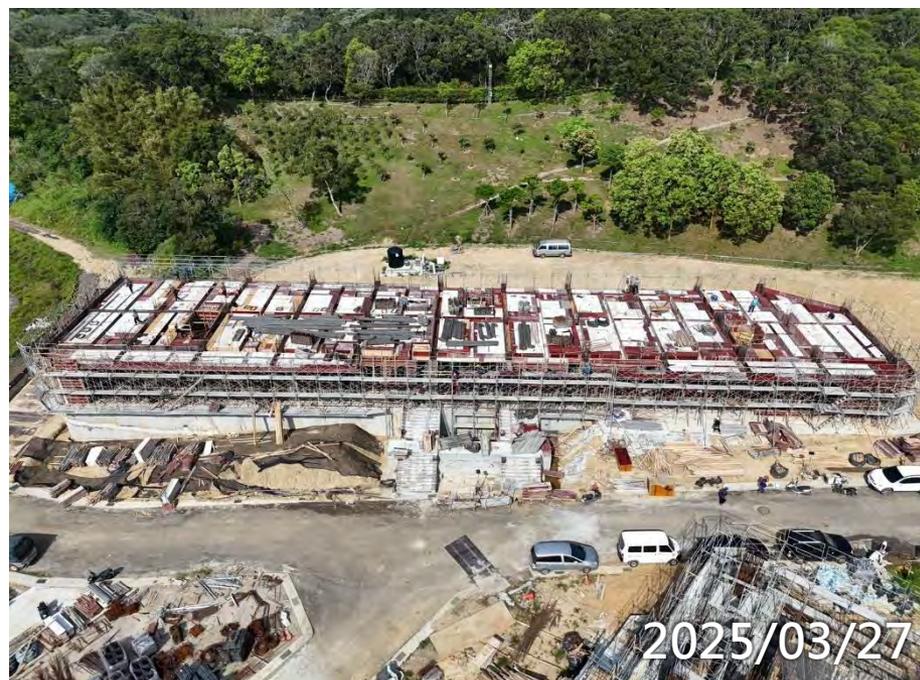

1F柱牆、2F梁版
鋼筋模板水電施作

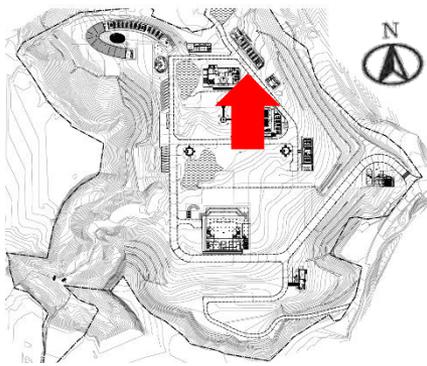

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男義工



RF梁澆置
屋頂待鋼構吊裝

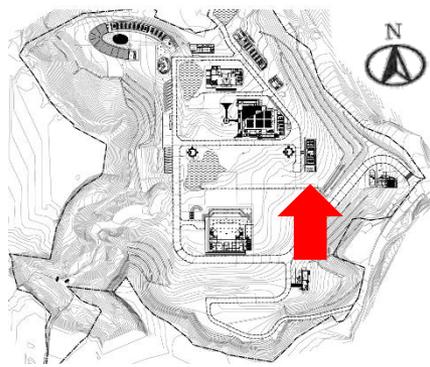

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男常住




1F、2F梁底、螺桿清理
屋頂待鋼構吊裝

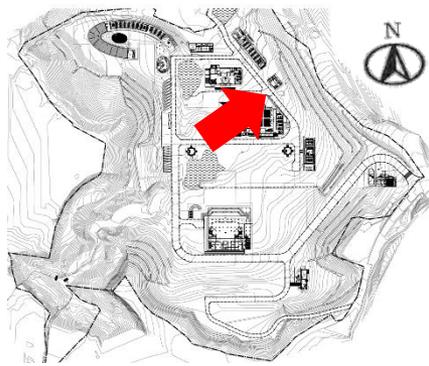

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片

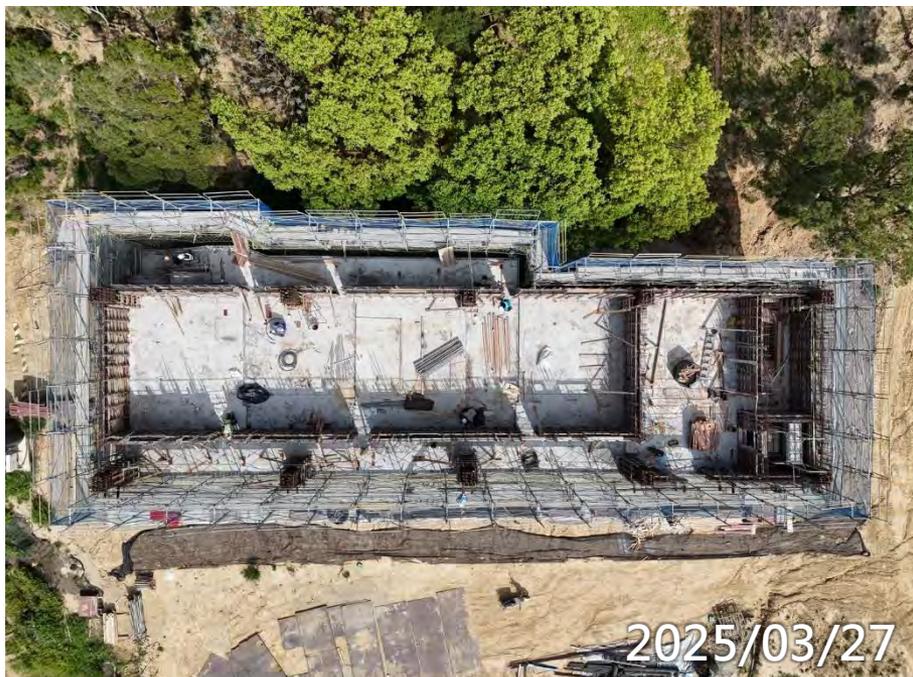

司機休息室



3F柱牆鋼筋模板水電施作

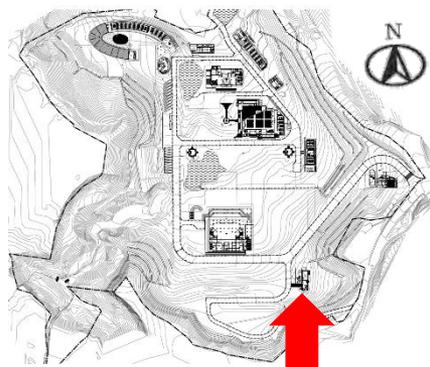

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室




筏基層鋼筋水電施作

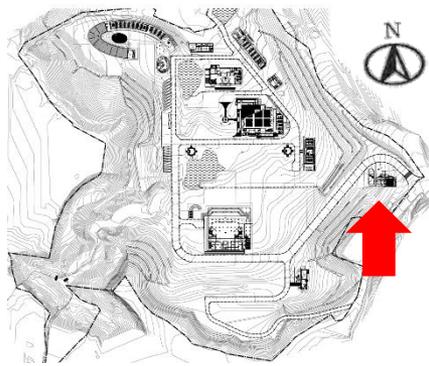

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

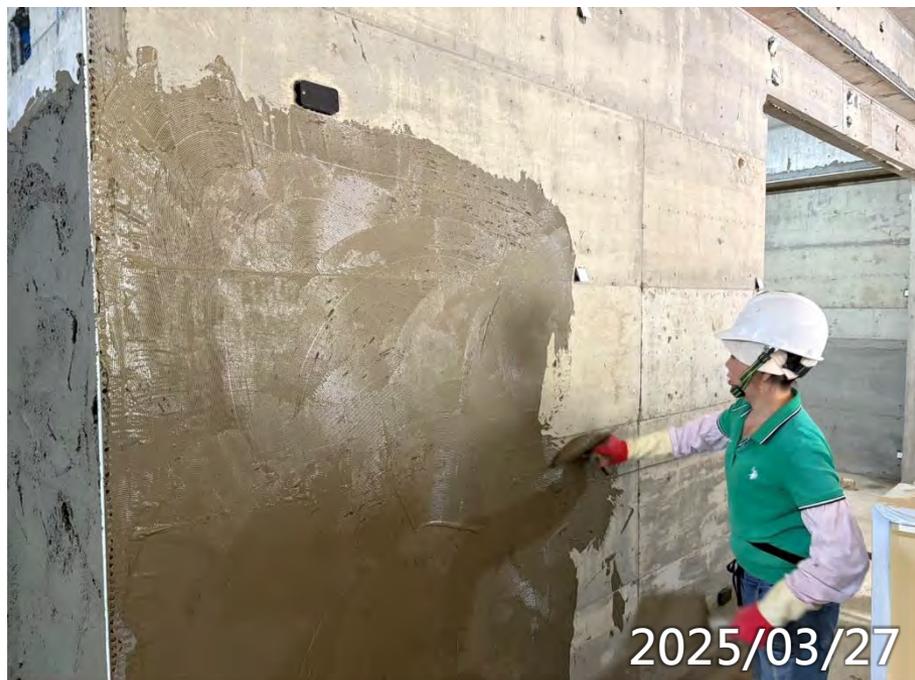

汙水處理廠



B1F泥作打底粉光

