

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月08日
施工工期	1170日曆天+展延工期6天
累計工期	644日曆天（截至114年04月24日）
剩餘工期	532日曆天
預定進度(114.04.24)	34.56%
實際進度(114.04.24)	34.29%
本週進度(超前/ <u>落後</u>)	0.27%



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



高版區1MF、2F鋼承鈑施作
低版區1F梁版鋼筋模板水電施作

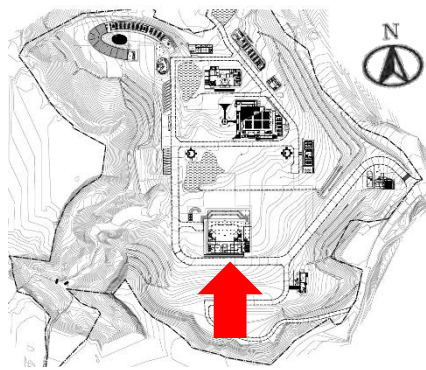

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



齋堂



2F-4F柱牆、4F梁版
鋼筋模板水電施作

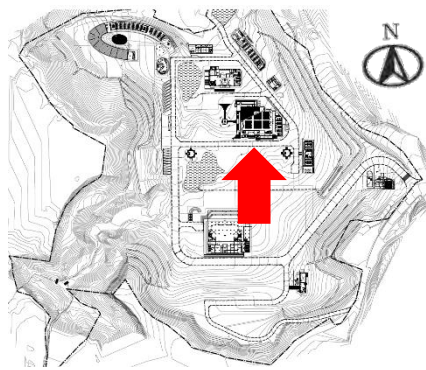

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



1F柱牆鋼筋模板水電施作

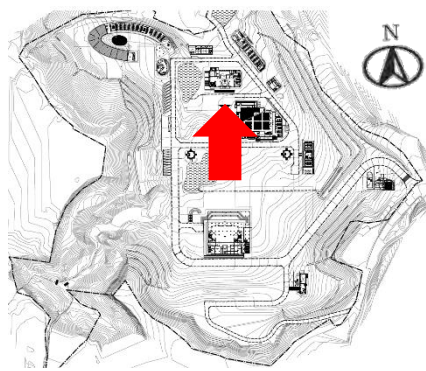

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女寮



4F柱牆鋼筋模板水電施作
B1F泥作吊線

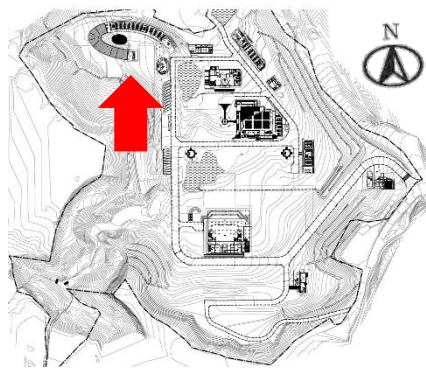

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



1F柱牆施作
筏基拆模

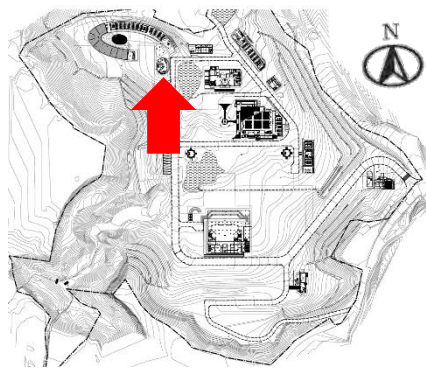

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男寮



1F柱牆、2F梁版
鋼筋模板水電施作

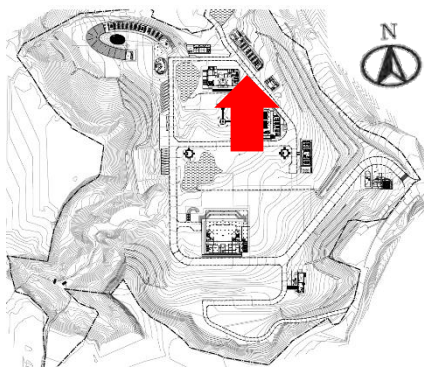

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男義工



1F至RF梁底、螺桿清理
屋頂待鋼構吊裝

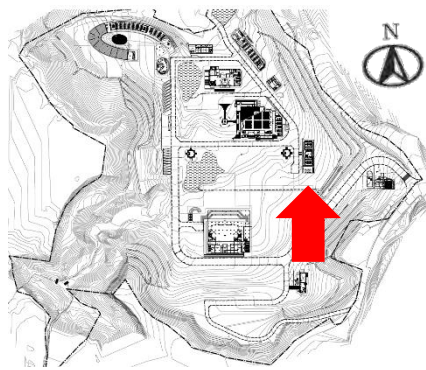

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片




男常住



1F至RF梁底、螺桿清理
屋頂待鋼構吊裝

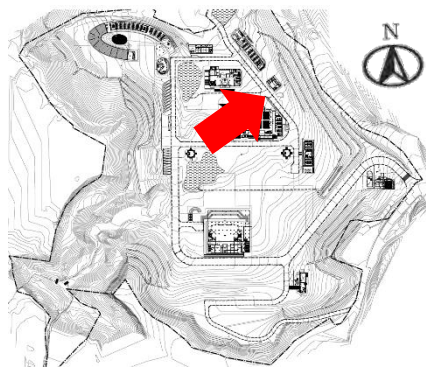


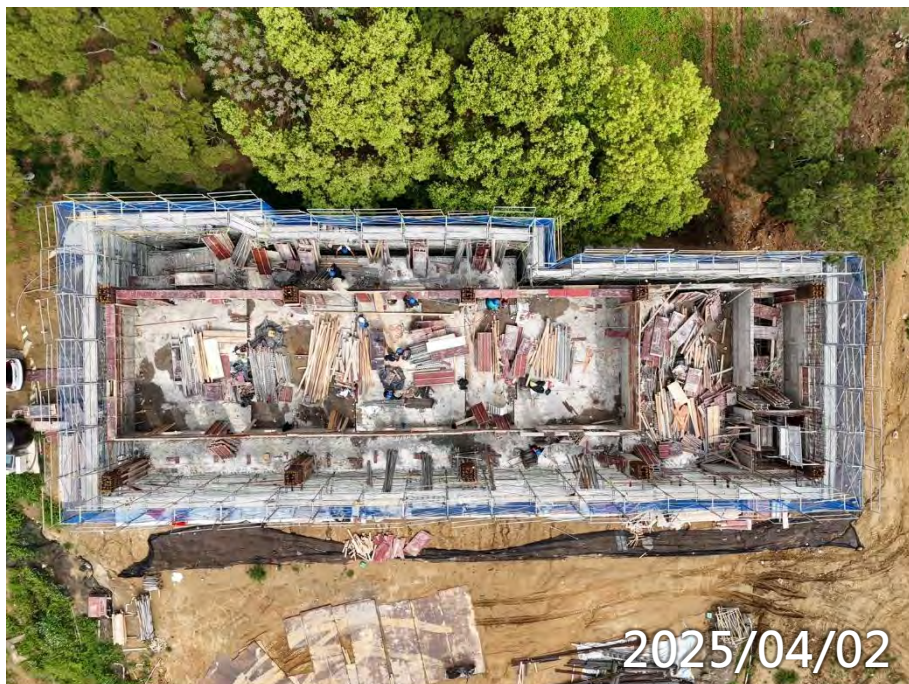

司機休息室



3F柱牆鋼筋模板水電施作

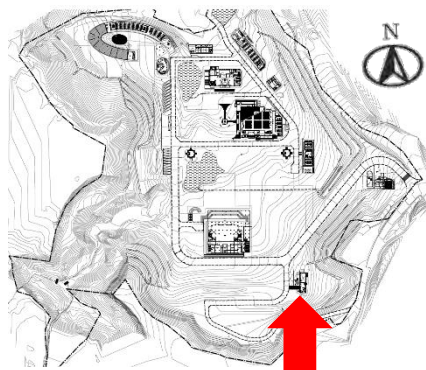

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片




傳達室



筏基層鋼筋水電施作

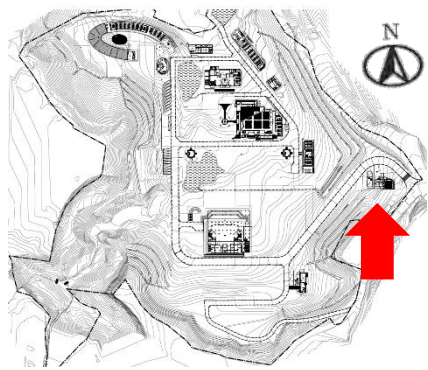


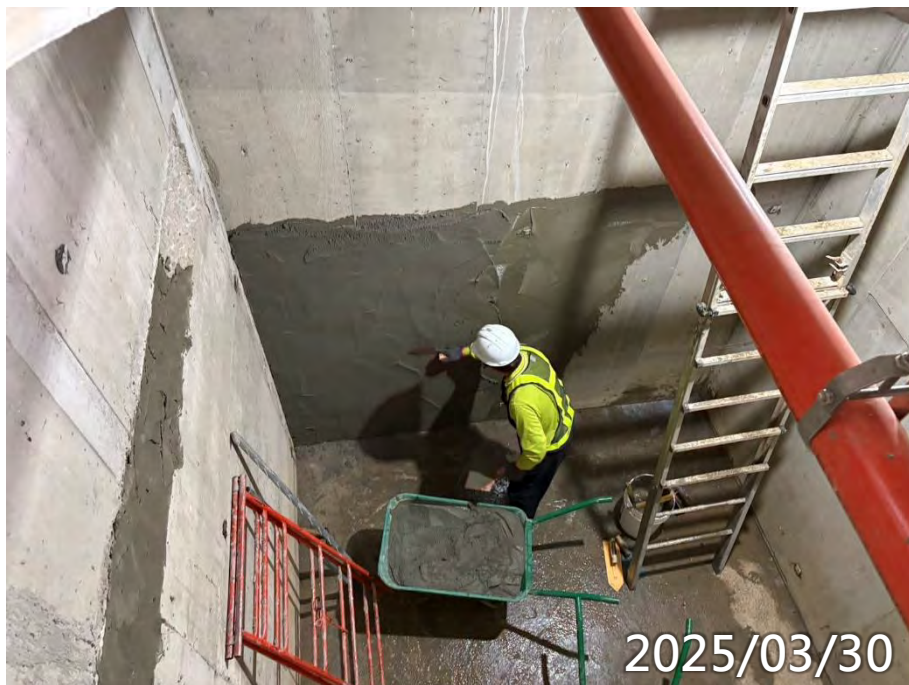

汙水處理廠



B2F泥作打底

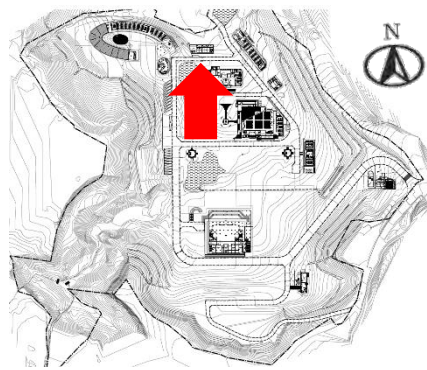



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



高版區1MF、2F鋼承鈑施作
低版區1F梁版鋼筋模板水電施作

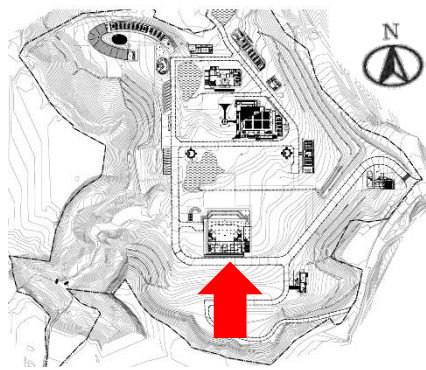

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



齋堂



4F柱牆鋼筋模板水電施作

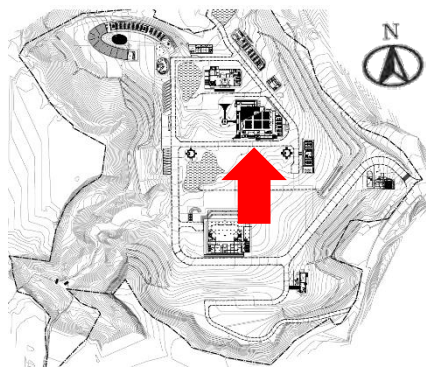




玄文



1F柱牆鋼筋模板水電施作

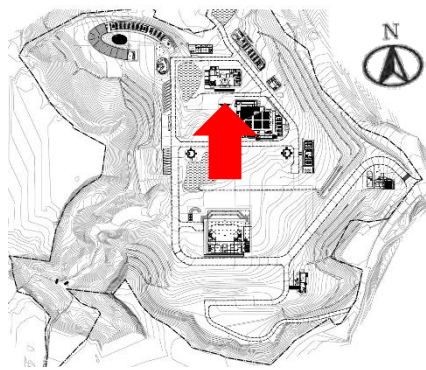

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女寮



1F至RF梁底、螺桿清理
B1F、1F泥作吊線打底
屋頂待鋼構吊裝(預計05/01)

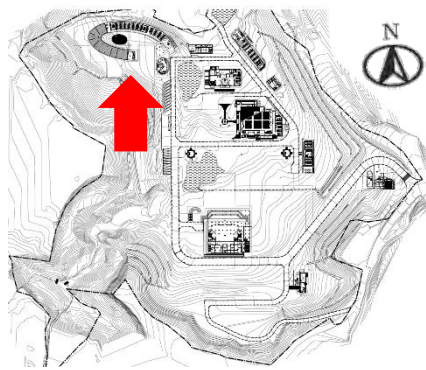




女常住



1F柱牆鋼筋模板水電施作

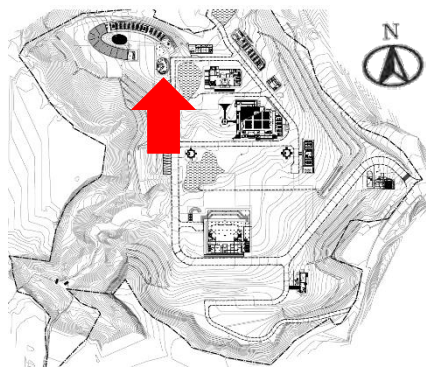

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男寮



2F柱牆鋼筋模板水電施作

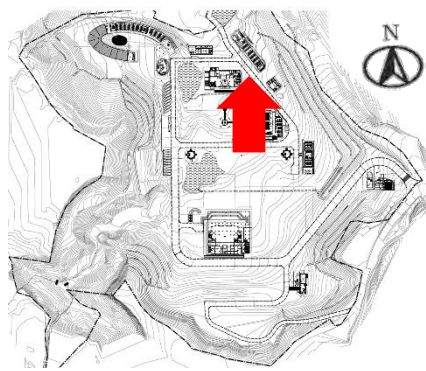

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男義工



1F至RF梁底、螺桿清理
B1F泥作吊線
屋頂待鋼構吊裝(預計5月中)

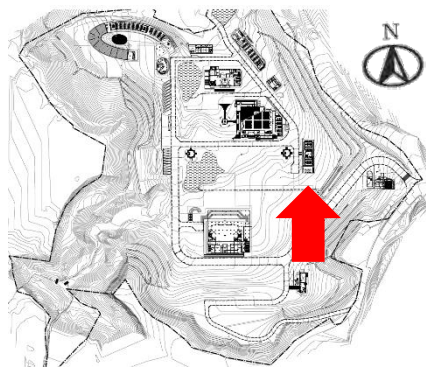

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男常住



1F至RF梁底、螺桿清理
屋頂待鋼構吊裝(預計05/01)

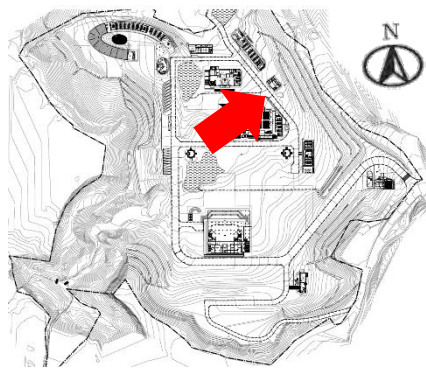

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



司機休息室



3F柱牆、RF梁版鋼筋模板水電
屋頂鋼構預埋備料

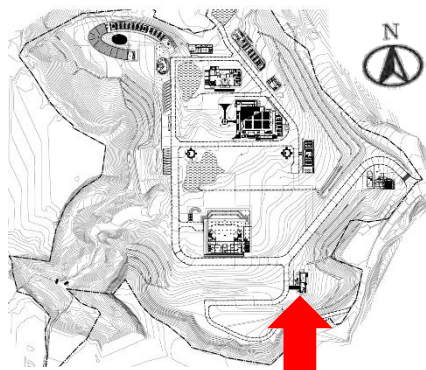

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



筏基層鋼筋水電施作

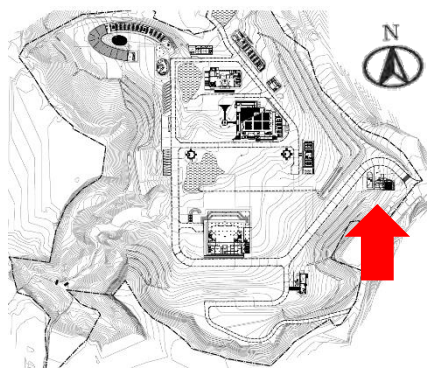

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



鐘樓



PC打底

