

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月08日
施工工期	1170日曆天+展延工期6天
累計工期	672日曆天（截至114年05月22日）
剩餘工期	504日曆天
預定進度(114.05.22)	36.86%
實際進度(114.05.22)	36.59%
本週進度(超前/ <u>落後</u>)	0.27%



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



高版區花台、擋土牆施作
低版區1F梁版施作
2F鋼承鈑施作

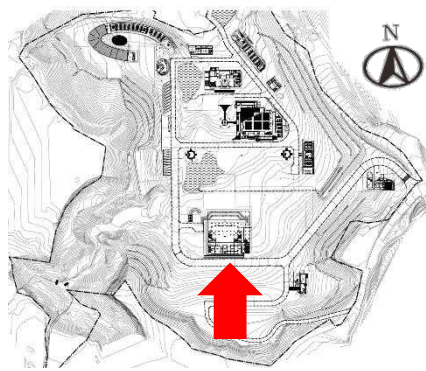

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



齋堂



4F柱牆、4MF梁版
鋼筋模板水電施作

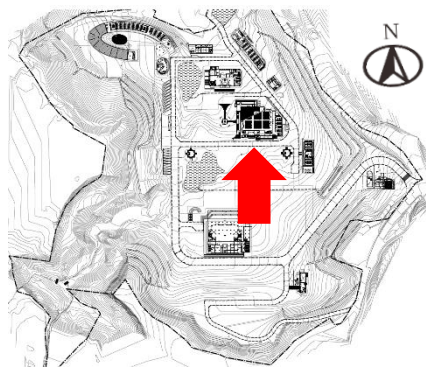

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



1F柱牆2F梁版
鋼筋模板水電施作

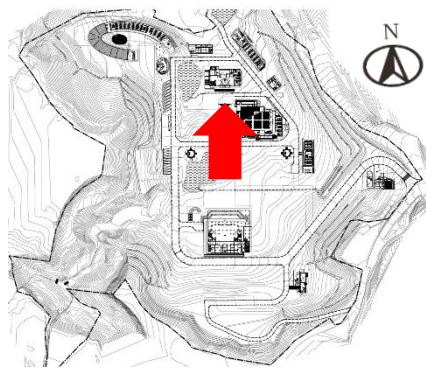

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女寮



2F至RF梁底、螺桿清理
B1F、1F泥作吊線打底
屋頂鋼構吊裝

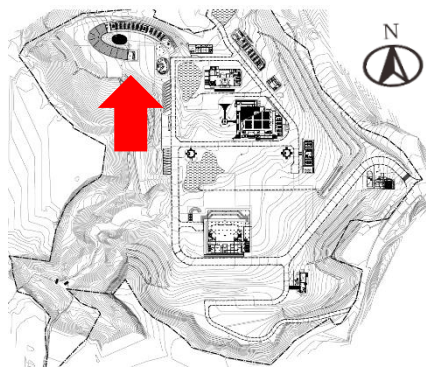

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住




1F圓柱澆置

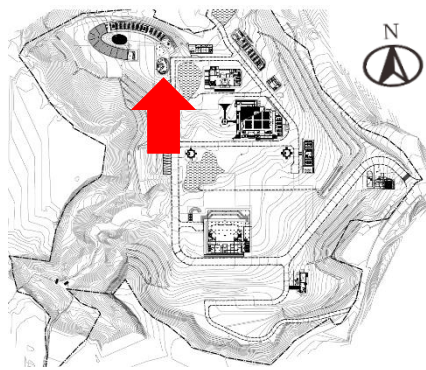

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片

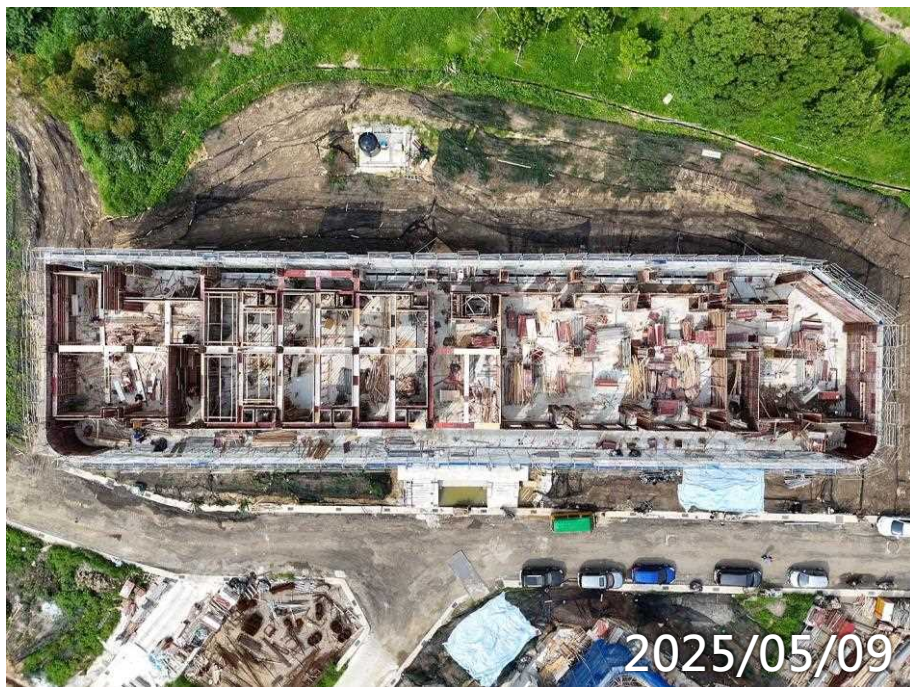

男寮



2F柱牆、3F梁版
鋼筋模板水電施作

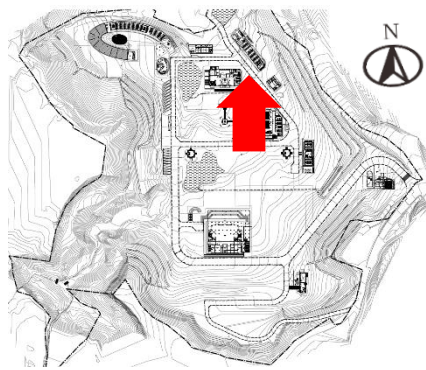

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男義工



2F至RF梁底、螺桿清理
B1F、1F泥作吊線
B1F、1F輕隔間放樣
屋頂待鋼構吊裝(預計05/31)

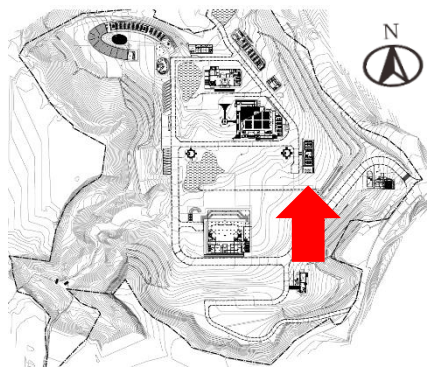

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片




男常住



2F至RF梁底、螺桿清理
1F、2F泥作吊線
1F、2F輕隔間放樣
屋頂待鋼構吊裝(預計05/15)

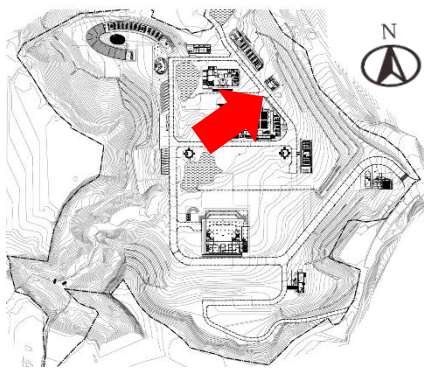


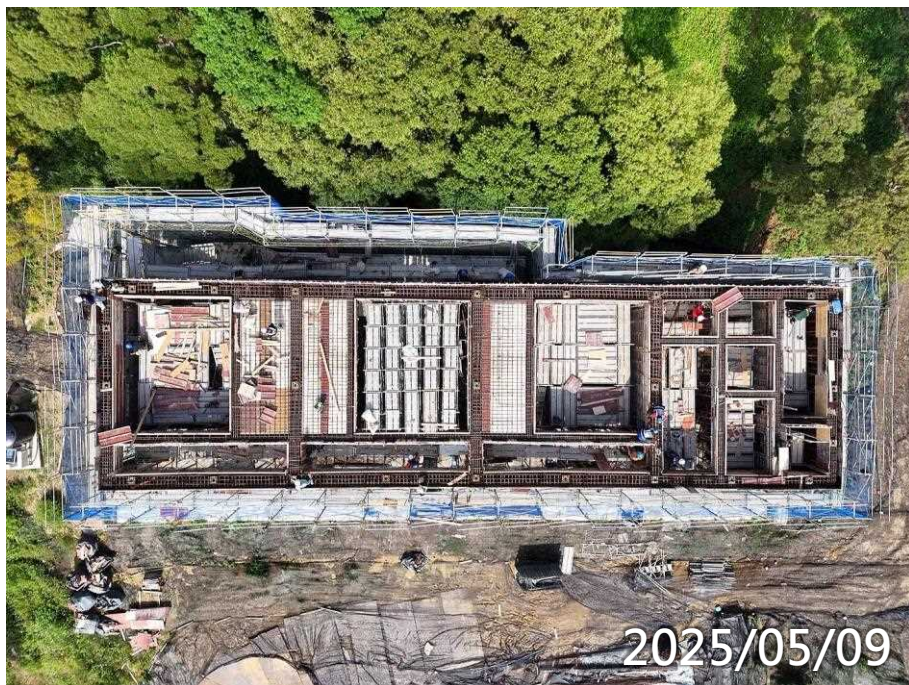

司機休息室




3F柱牆、RF梁版鋼筋模板水電
屋頂鋼構預埋
B1F、1F泥作吊線
B1F、1F輕隔間放樣

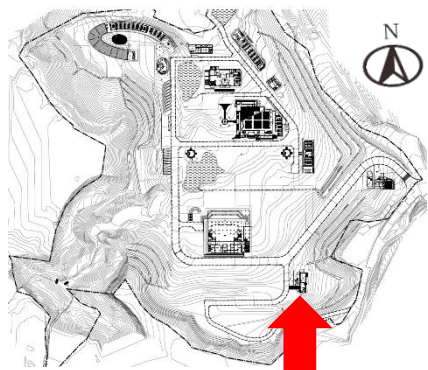

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片

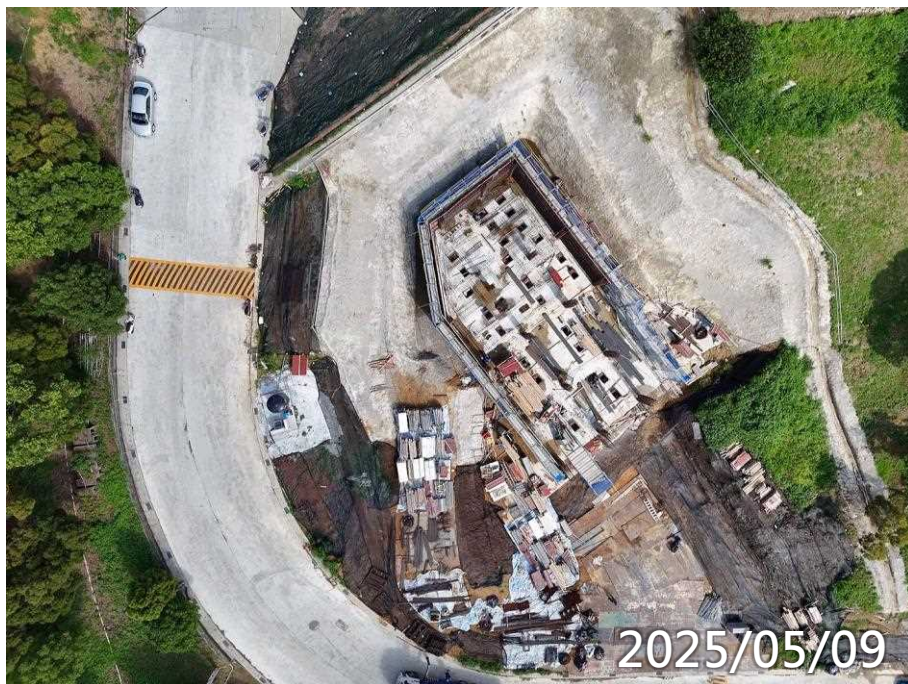

傳達室



高版區2F柱牆鋼筋水電施作

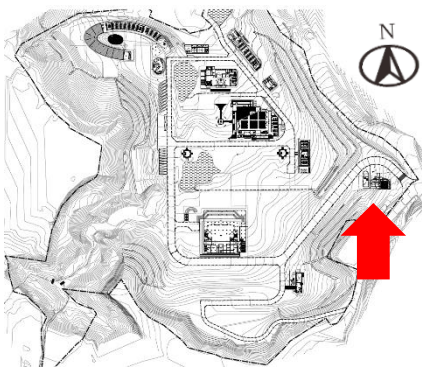




鐘樓



基礎層澆置

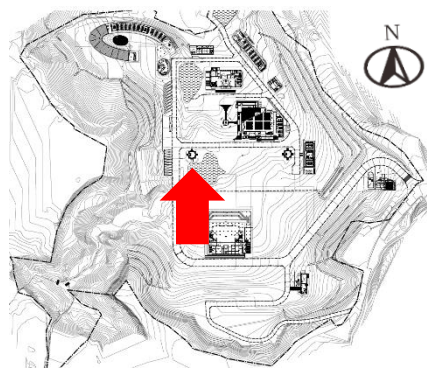



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



高版區花台、擋土牆施作
低版區1F梁版施作
2F鋼承鈑施作
高低版筏基坑聚脲施作

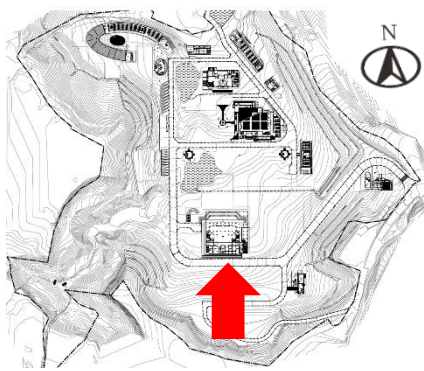

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



齋堂



4F柱牆、閣樓梁版
鋼筋模板水電施作

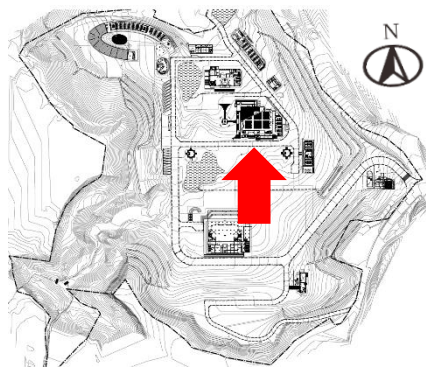

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



1F柱牆2F梁版
鋼筋模板水電施作

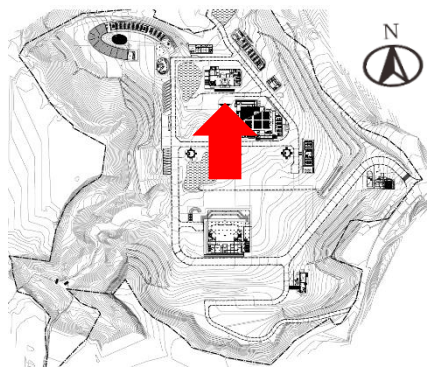


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

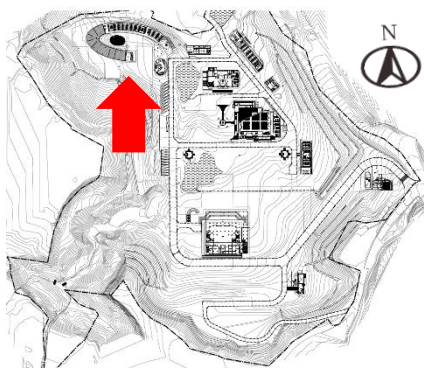

2F至RF梁底、螺桿清理
B1F、1F泥作吊線打底
B1F、1F輕隔間放樣
屋頂鋼構吊裝

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



筏基清潔拆模口回封

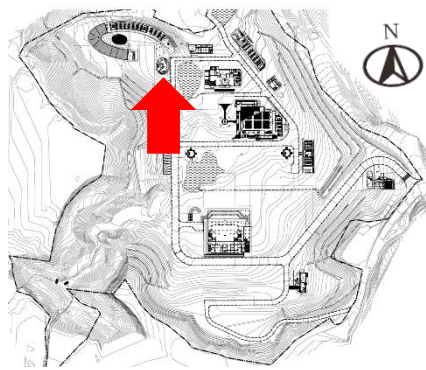

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男寮



2F柱牆、3F梁版
鋼筋模板水電施作
B1F泥作吊線

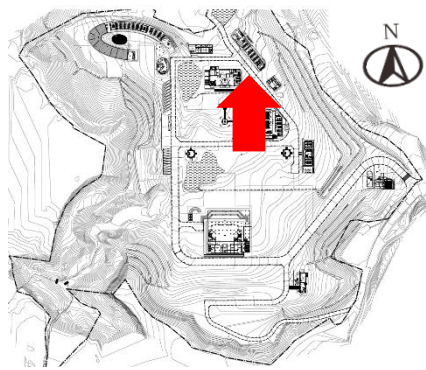

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男義工



2F至RF梁底、螺桿清理
B1F、1F泥作打底
B1F、1F輕隔間放樣
屋頂鋼構吊裝

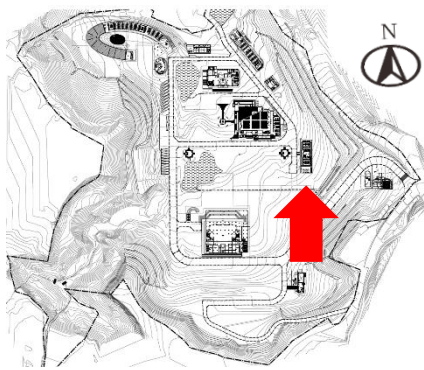

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男常住



2F至RF梁底、螺桿清理
1F、2F泥作打底
1F、2F輕隔間放樣
屋頂鋼構電銲校正

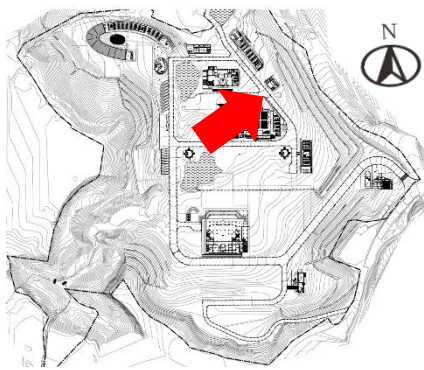


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片




司機休息室

2F至RF梁底、螺桿清理
B1F、1F泥作打底
B1F、1F輕隔間放樣
屋頂鋼構待吊裝

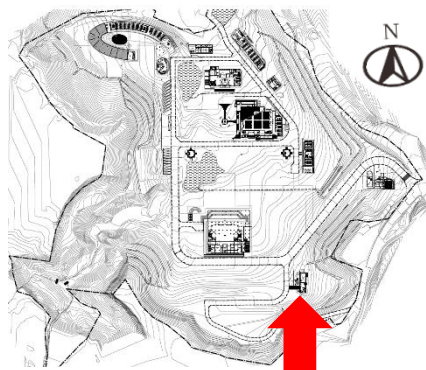

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片

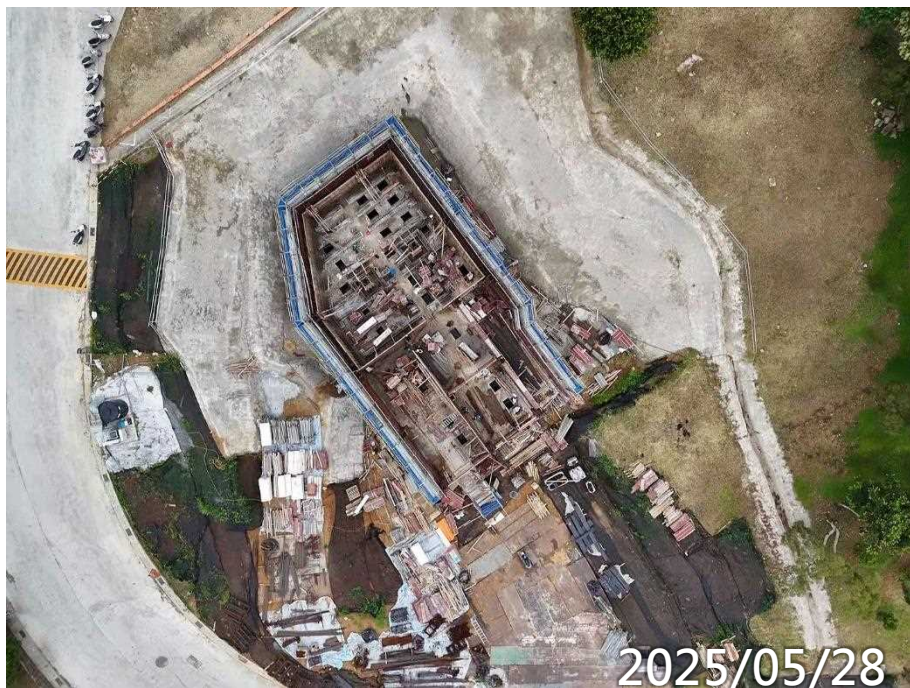

傳達室



高版區2F柱牆鋼筋水電施作

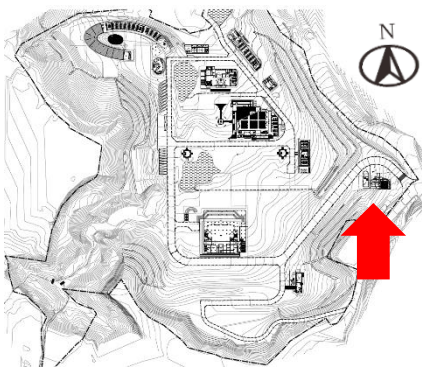

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



鐘樓



1F柱鋼筋綁紮
土方回填

