

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	116年06月12日
施工工期	1170日曆天+展延工期253日曆天
累計工期	1064日曆天（截至115年06月18日）
剩餘工期	359日曆天
預定進度(115.06.18)	63.42%
實際進度(115.06.18)	63.29%
本週進度(超前/ <u>落後</u>)	0.13%

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理



全區空拍照片


機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、製或對外揭2。

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



主殿

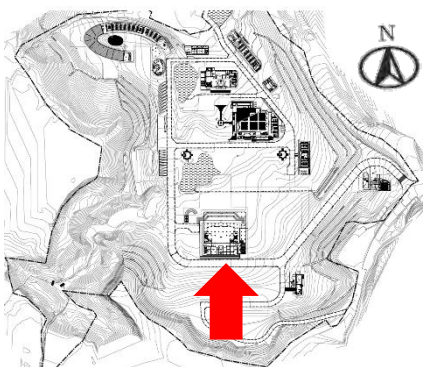

鋼構屋頂吊裝


B2F-1F泥作、輕隔間、油漆、鐵捲門施作、造型柱組模灌漿
樹穴聚脲防水
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



齋堂

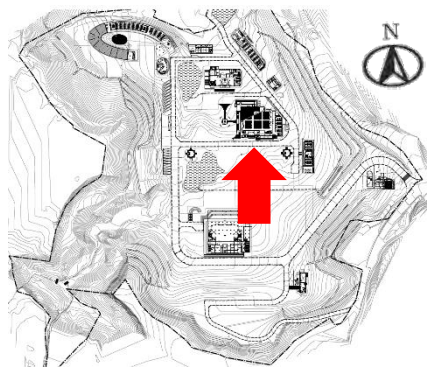

金屬屋頂防火層施作
1F-4F泥作、輕隔間、油漆、戶
外欄杆墩座、鐵捲門、鋁窗、
金屬門施作
RF屋頂防水施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作、油漆、電梯施作
屋頂防水施作

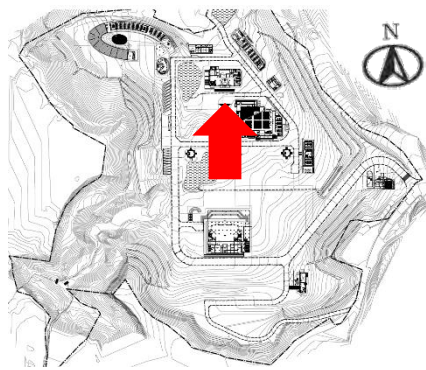


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

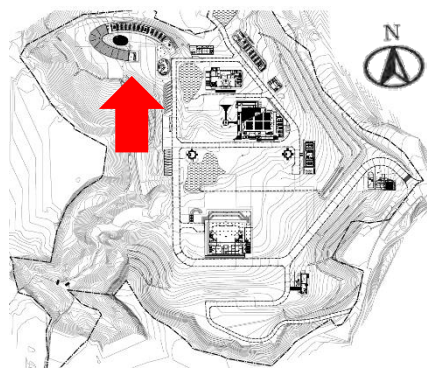

金屬屋頂防火層施作
B1F-4F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門、電梯、防火漆施
作
1F-4F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



金屬屋頂防火層施作
1F-2F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作

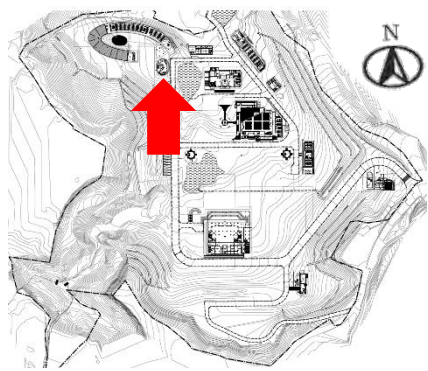


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

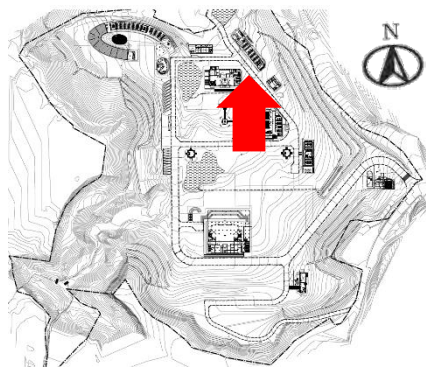


金屬屋頂面層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作
1F-3F造型遮陽板施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男義工

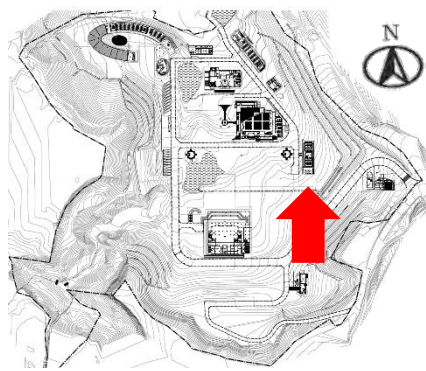

金屬屋頂面層施作

B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯、防火漆施作

1F-3F造型遮陽板施作

3F金屬三明治版施作


機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男常住

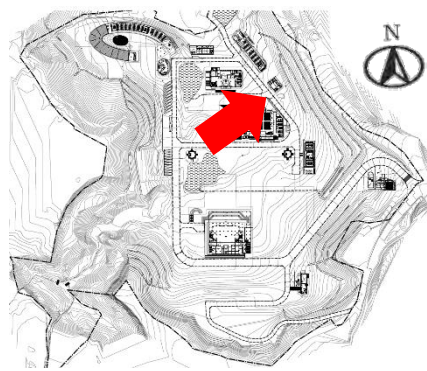

金屬屋頂面層施作

1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯、防火漆、造型遮陽板施作

3F金屬三明治版施作


機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



司機休息室

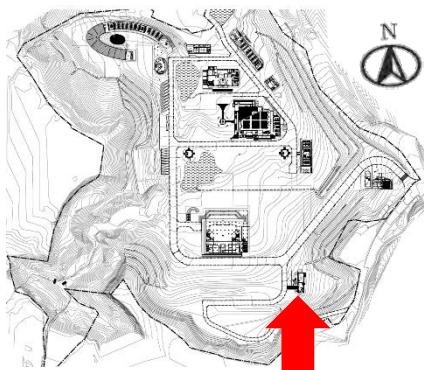

金屬屋頂面層施作

B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作

1F-3F戶外欄杆預埋施作

3F金屬三明治版施作


機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



傳達室

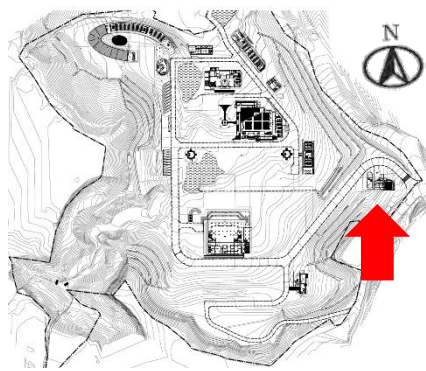

全區1F-2F泥作
高版區屋頂聚脲防水壓層
屋頂鋼構吊裝
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鐘樓



待金屬屋頂施作
1F泥作

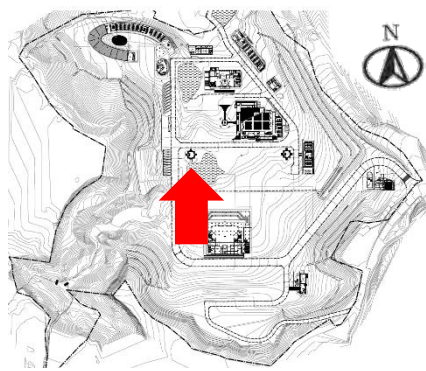

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鼓樓



待金屬屋頂施作
1F泥作

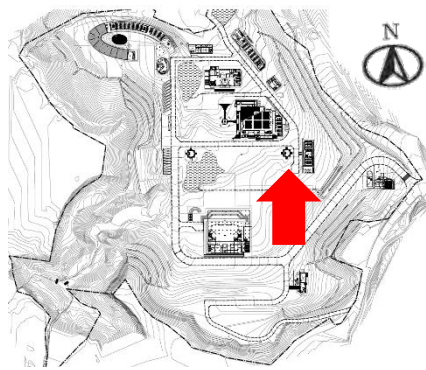

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



山門



屋頂梁澆置

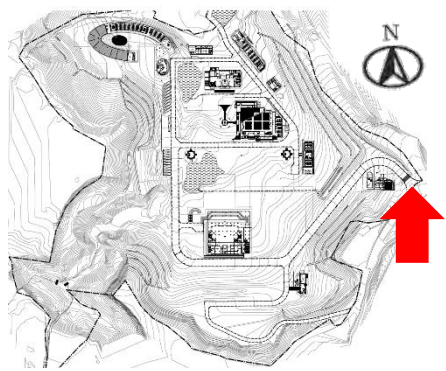

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


範疇管理



全區空拍照片


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

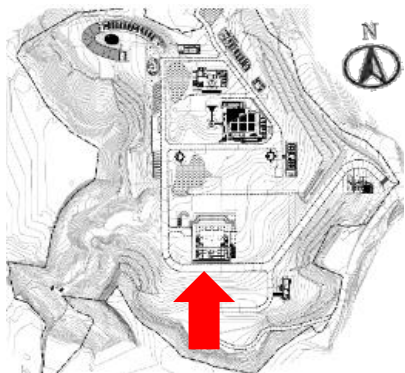


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

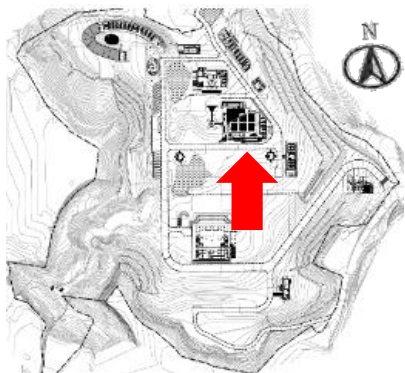


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

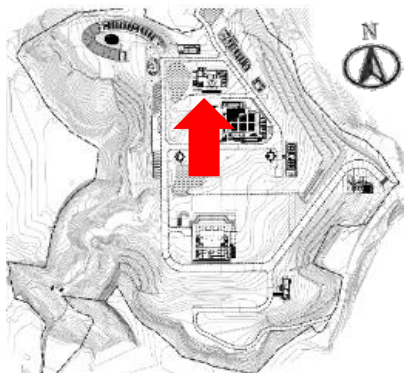

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

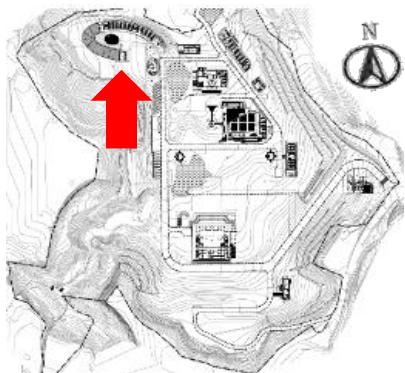


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女常住
待屋頂防火層鋪設

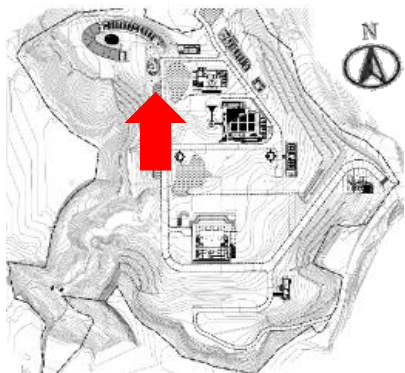




男寮

2F:咖關插座、廣播喇叭安裝(80%)、北側廁所壁磚(100%)

3F:電梯百葉窗安裝(100%)、外牆打底(82%)

1F-3F:雨水排水管路徑確認及備料(80%)

RF:屋頂面板施作(95%)

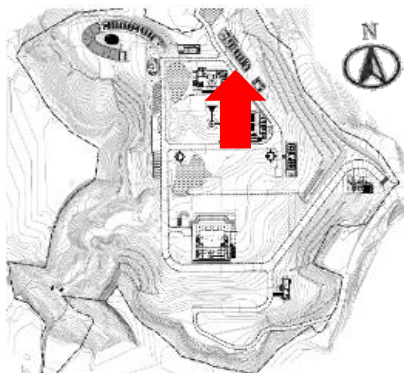

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男常住

2F:開關插座安裝(95%)

3F:開關插座安裝(90%)

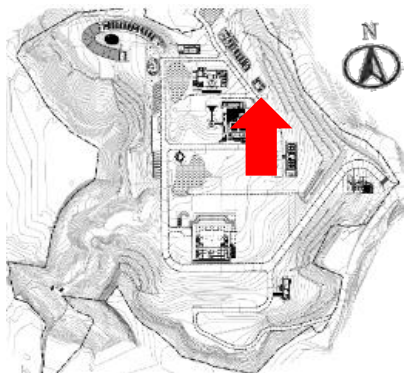

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男義工
筏基礎磚(100%)




正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



司機休息室
筏基礎磚(100%)
2F:排水管路徑變更(20%)
RF:金屬屋頂面層施作

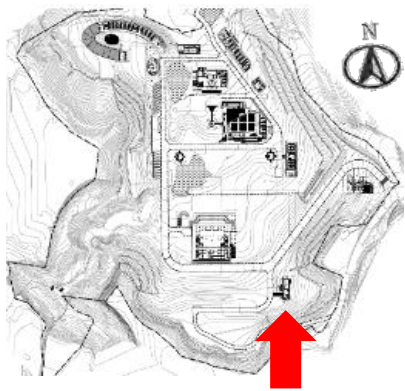

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室


1F-2F:消防箱消防管配置(90%)

RF:屋頂鋼構吊裝電鍍

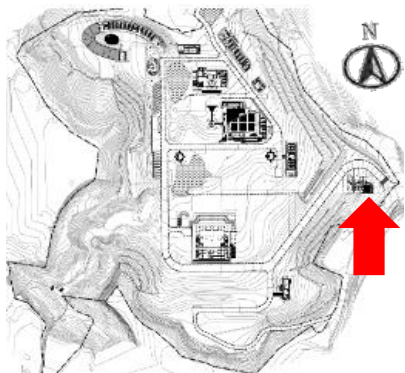



鐘樓
待金屬屋瓦防火層施作

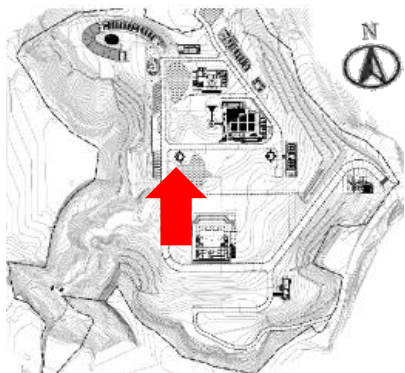


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



鼓樓
待金屬屋瓦防火層施作

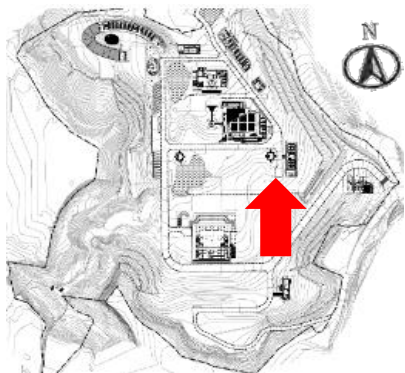

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



山門
施工架搭設(100%)
待屋頂鋼構吊裝

