

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	116年06月14日
施工工期	1170日曆天+展延工期255日曆天
累計工期	1106日曆天（截至115年07月30日）
剩餘工期	319日曆天
預定進度(115.07.30)	65.58%
實際進度(115.07.30)	65.45%
本週進度(超前/ <u>落後</u>)	0.13%

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理




全區空拍照片

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

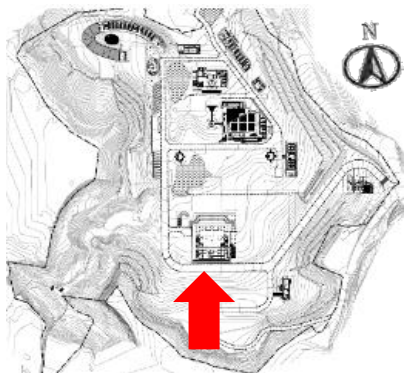


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

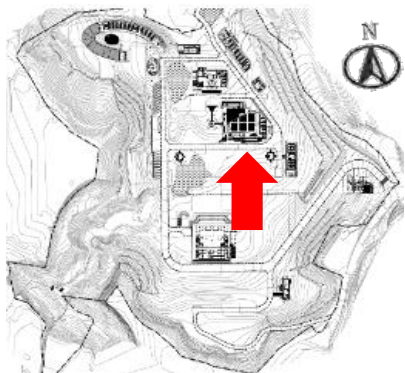


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

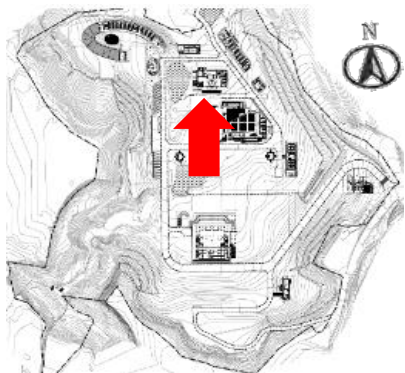

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

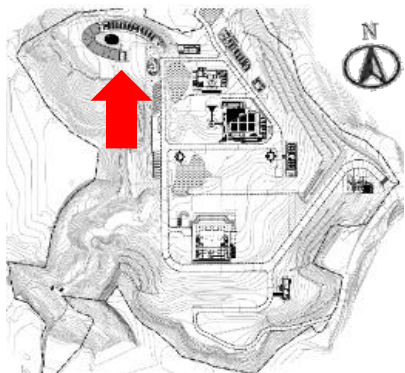


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女常住
1F隔間配管(95%)
隔間開口及單面板安裝(95%)
待屋頂防火層鋪設

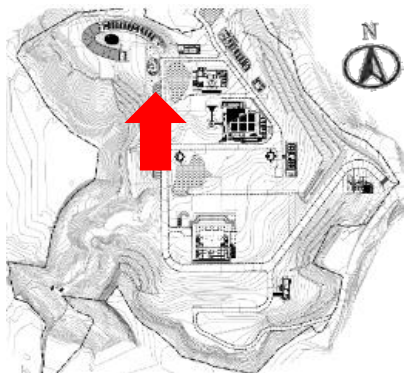

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片




男寮

3F電梯百葉窗安裝(100%)、外牆打底(88%)

1F-3F雨水排水管路徑確認及備料(100%)

RF斜屋頂面板施作(80%)

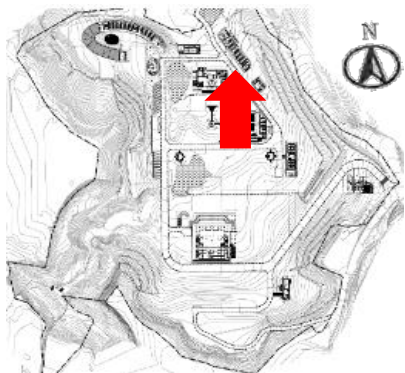


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男常住
3F噴漆作業(100%)

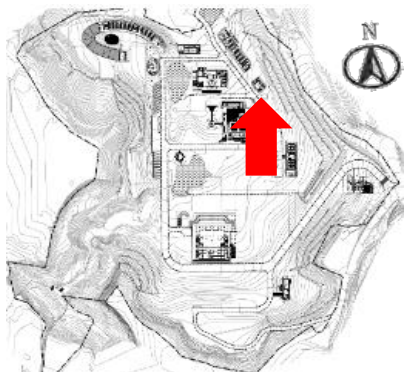

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男義工

B1F人孔調整及澆置2處(業主變更)

3F三明治板安裝(85%)




正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



司機休息室
2F排水管路徑變更(90%)

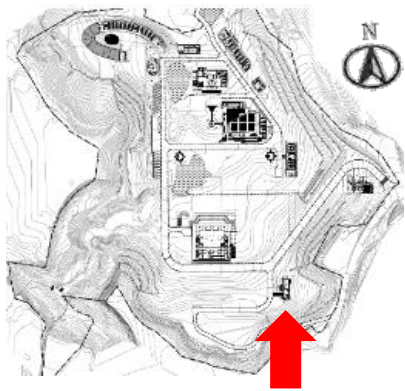


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



傳達室
設備基座美耐磨打底、面塗(100%)
RF鋼構電焊(10%)

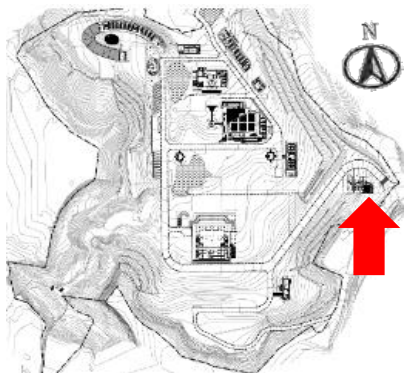


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



鐘樓
待金屬屋瓦防火層施作

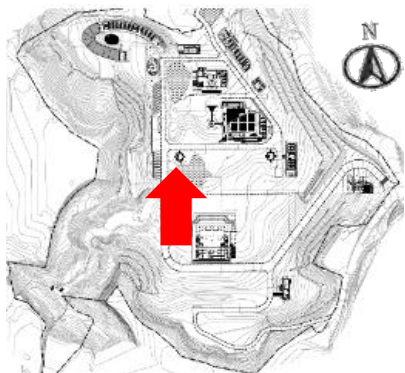


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



鼓樓
待金屬屋瓦防火層施作

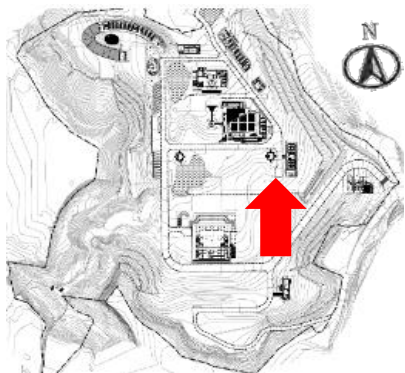


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



山門
泥作吊線完成
待屋頂鋼構吊裝

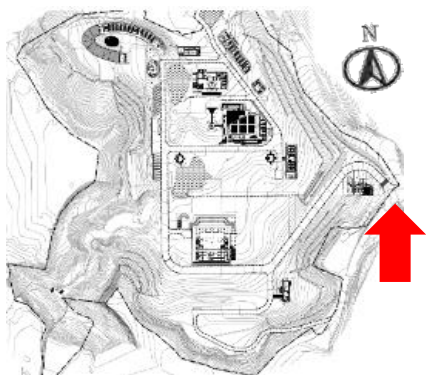

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理




2026/07/31

全區空拍照片



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

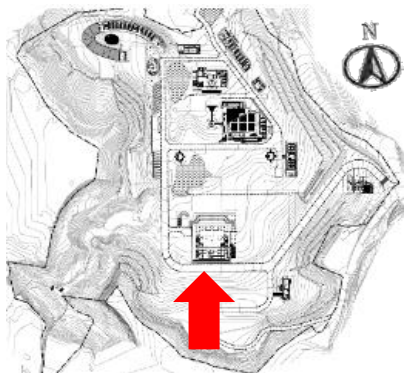


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

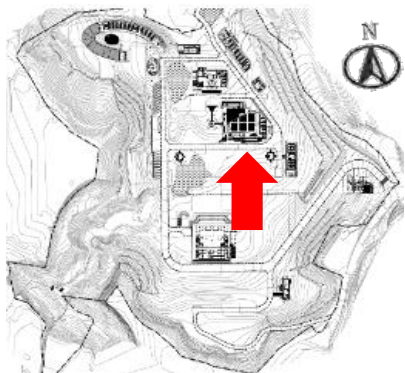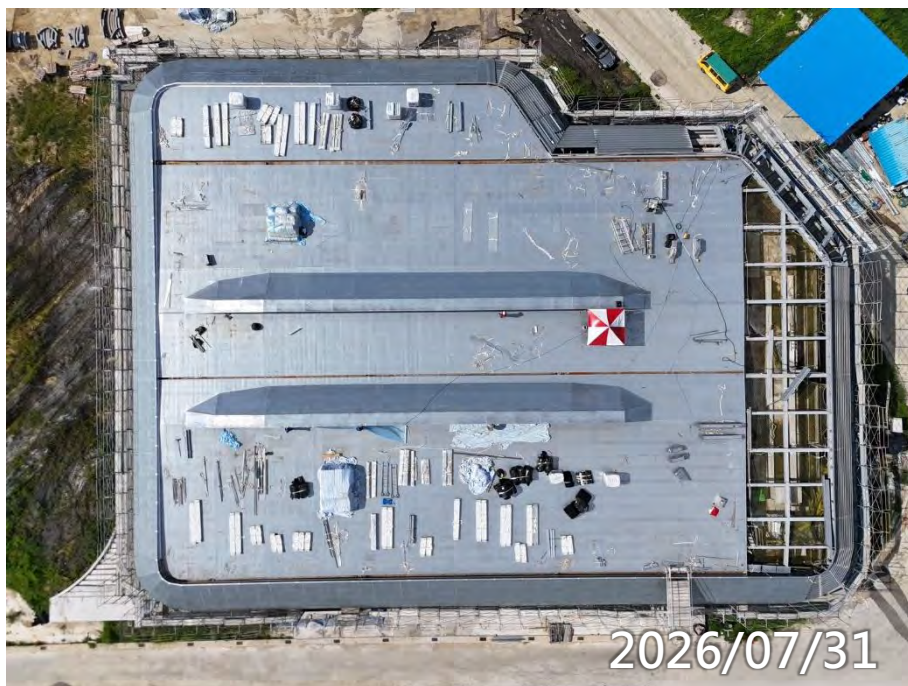


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

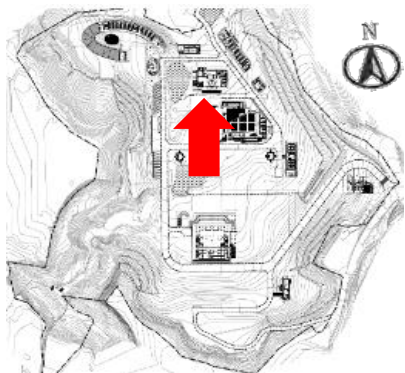

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

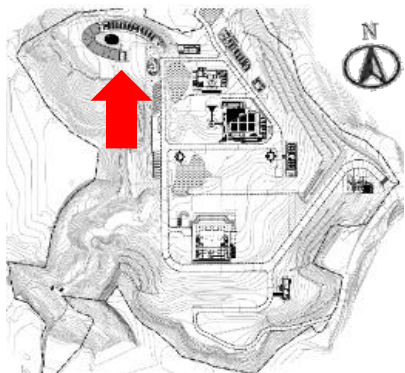


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女常住
1F隔間雙面板安裝(20%)
2F配合鋼構拆架(100%)
待屋頂防火層鋪設

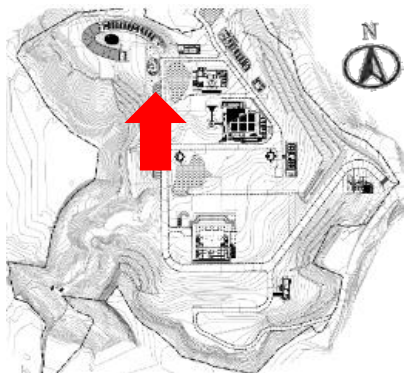

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

2F壁磚(80%)、2F外牆打底(50%)


3F外牆打底(100%)、3F外牆粉光(100%)

RF三明治版安裝(50%)

整棟雨水排水管配管(20%)

整棟遮陽板預埋件鐵網加固(100%)

斜屋頂面板施作(100%)

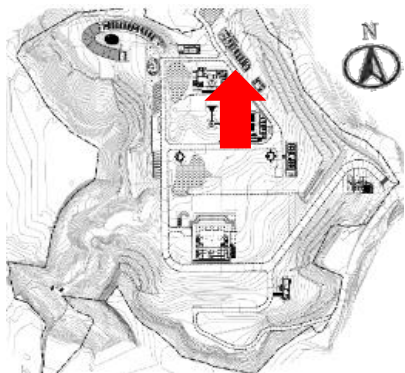


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男常住
廁所線排電焊安裝(80%)

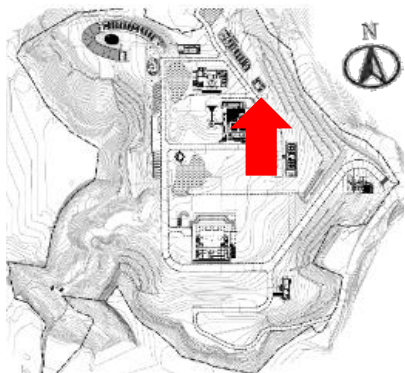

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男義工

1F-3F梯廳飲水機配管(30%)

3F陽台及廁所防水施作(100%)




正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



司機休息室
1F人孔調整(業主變更)
消防感知配管(10%)

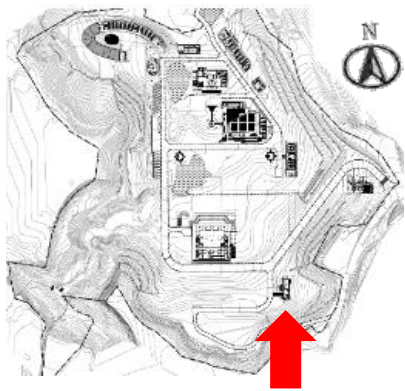


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



傳達室
空橋鋼筋綁紮(90%)
外管路路徑修改(40%)
消防拉線(60%)
電氣拉線(70%)
RF鋼構除鏽(100%)
RF鋼構電焊UT檢測(100%)

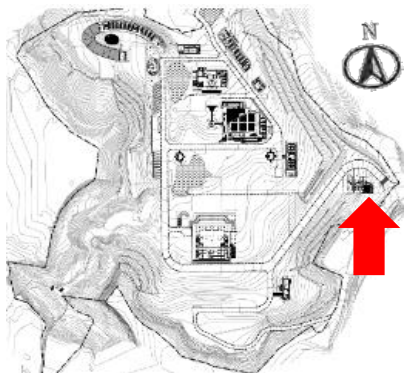


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



鐘樓
待金屬屋瓦防火層施作

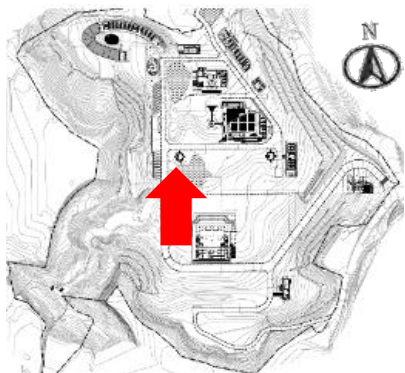


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



鼓樓
待金屬屋瓦防火層施作

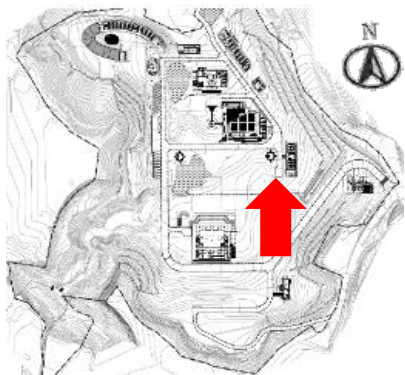

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



山門
屋頂鋼構吊裝(100%)
施工架防塵網搭設(100%)

