

# 工程成本進度

| 工程名稱                 | 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案       |
|----------------------|----------------------|
| 開工日期                 | 112年07月21日           |
| 預定完工日期               | 115年10月08日           |
| 施工工期                 | 1170日曆天+展延工期6天       |
| 累計工期                 | 700日曆天（截至114年06月19日） |
| 剩餘工期                 | 476日曆天               |
| 預定進度(114.06.19)      | 38.83%               |
| 實際進度(114.06.19)      | 37.87%               |
| 本週進度(超前/ <u>落後</u> ) | 0.96%                |



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



主殿



高版區花台、擋土牆施作  
低版區1F梁版施作  
2F鋼承鈑施作  
高低版筏基坑聚脲施作

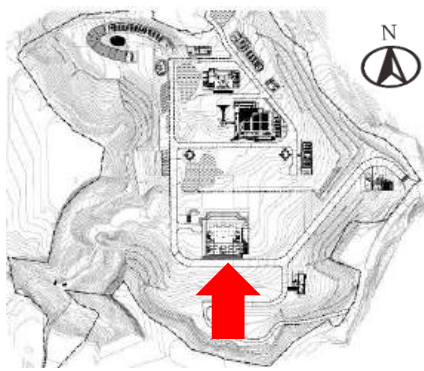


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



齋堂

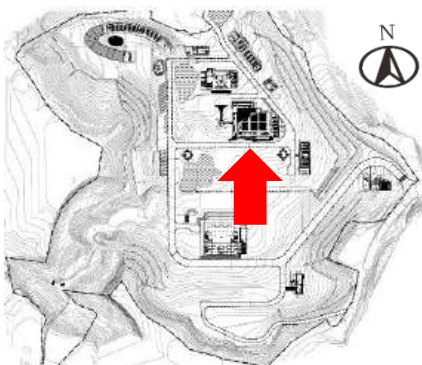

4F柱牆、閣樓梁版  
鋼筋模板水電施作  
鋼構預埋  
1F平頂油漆批土

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



玄文



1F柱牆2F梁版  
鋼筋模板水電施作

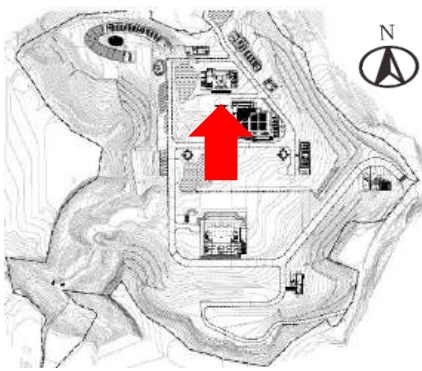


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



女寮

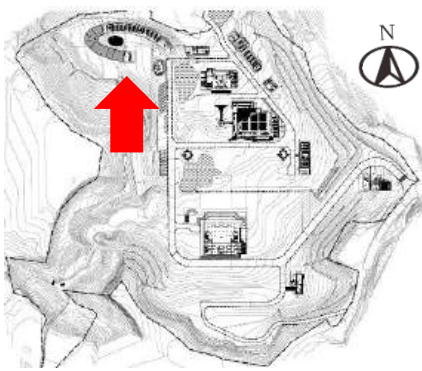

2F至RF梁底、螺桿清理  
B1F、1F泥作吊線打底  
B1F、1F輕隔間放樣  
屋頂鋼構吊裝

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



女常住



筏基清潔拆模口回封

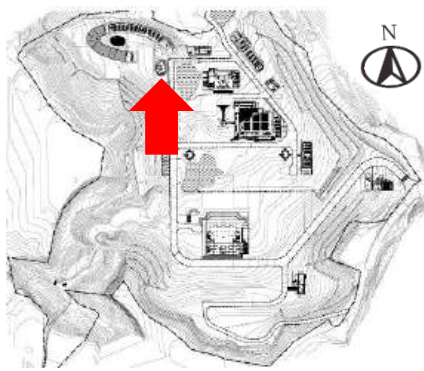

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



男寮



2F柱牆、3F梁版澆置  
B1F泥作吊線

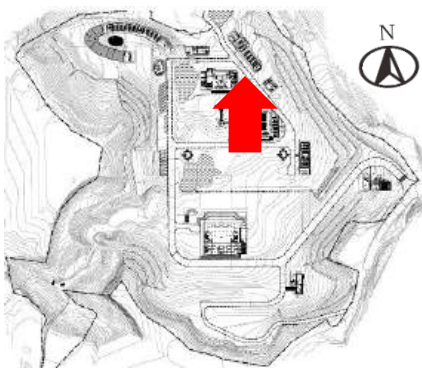

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



男義工



2F至RF梁底、螺桿清理  
B1F、1F泥作打底  
B1F、1F輕隔間放樣  
屋頂鋼構電銲校正

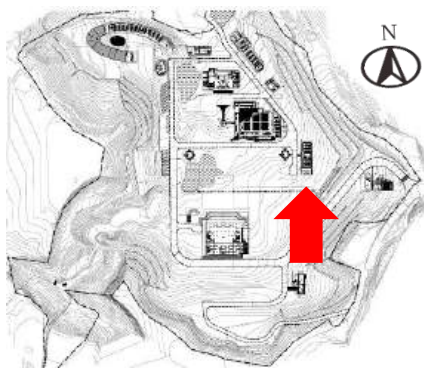

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



男常住



2F至RF梁底、螺桿清理  
1F、2F泥作打底  
1F、2F輕隔間放樣  
屋頂鋼構電銲校正

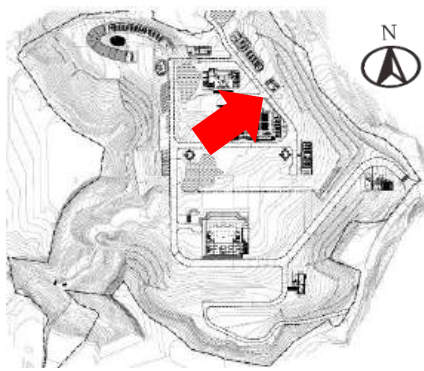


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



司機休息室

2F至RF梁底、螺桿清理  
B1F、1F泥作打底  
B1F、1F輕隔間放樣  
屋頂鋼構待吊裝

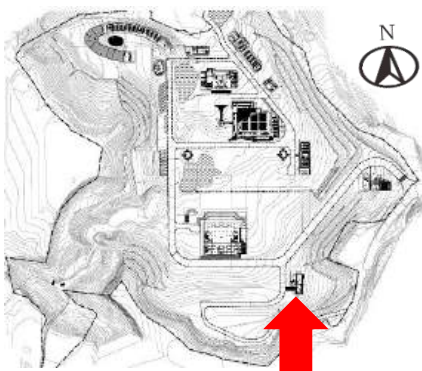

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



傳達室



高版區2F柱牆鋼筋水電施作

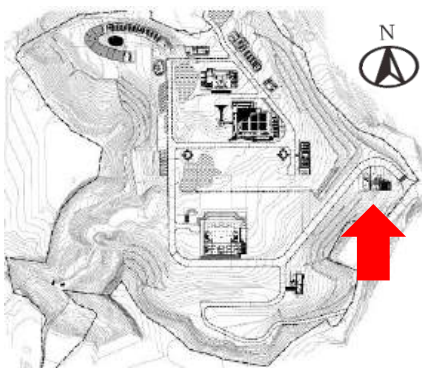

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



鐘樓



1F柱鋼筋綁紮  
土方回填

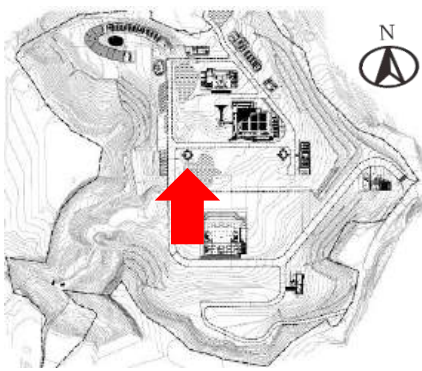



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



主殿



低版區1F梁版澆置  
全區2F鋼承鈑施作、水電放樣、  
鋼筋綁紮  
周邊五大管線施作

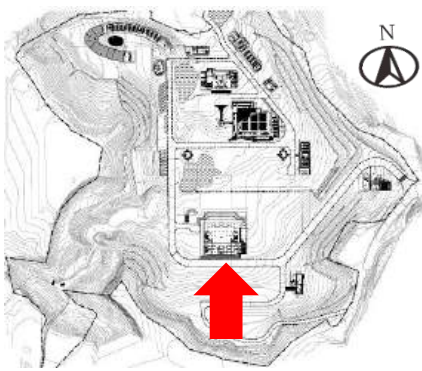


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



齋堂

閣樓版水箱基座施作  
1F油漆平頂批土  
1F輕隔間放樣

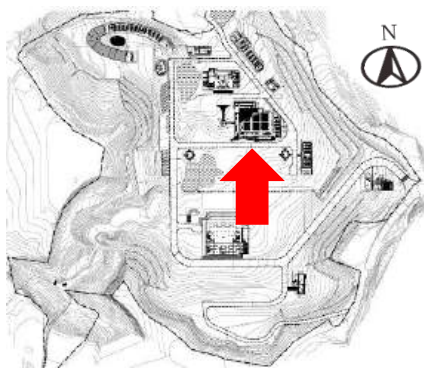

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



玄文



2F柱牆鋼筋模板施作

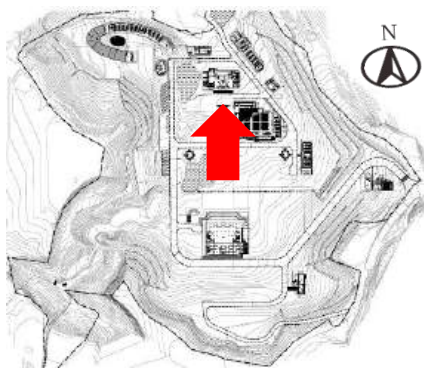


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



女寮

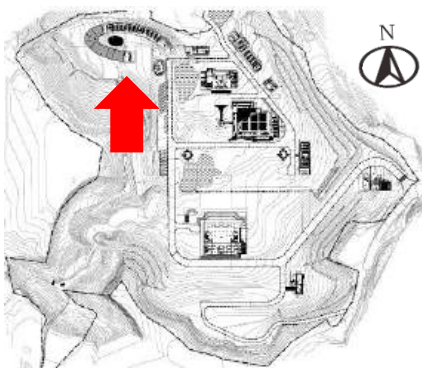

B1F-3F泥作打底粉光  
B1F-4F輕隔間放樣  
B1F-2F油漆平頂批土  
屋頂鋼構吊裝

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



女常住



筏基清潔拆模口回封

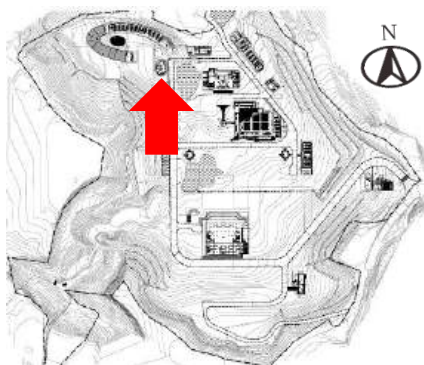

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



男寮



3F柱牆鋼筋綁紮、單面模施作  
B1F泥作打底粉刷

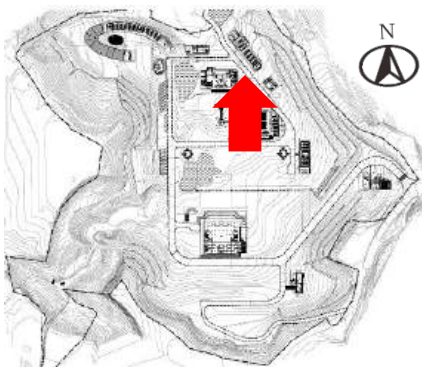


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



男義工

B1F-2F泥作打底  
B1F-2F輕隔間放樣  
屋頂鋼構電銲校正

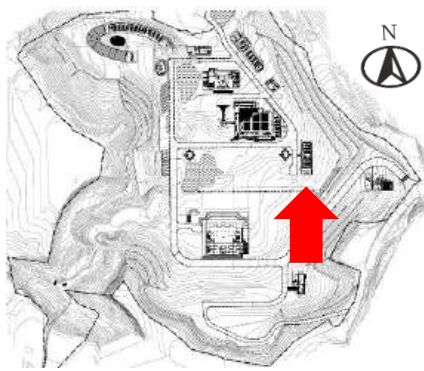


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



男常住

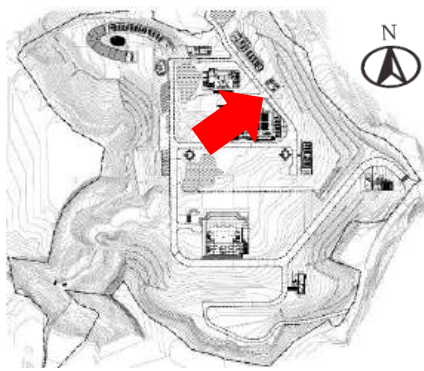

1F、2F泥作打底  
1F、2F輕隔間放樣  
1F、2F油漆平頂批土  
金屬屋頂防火層施作

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



司機休息室



B1F-2F泥作打底  
B1F-2F輕隔間放樣  
屋頂鋼構吊裝

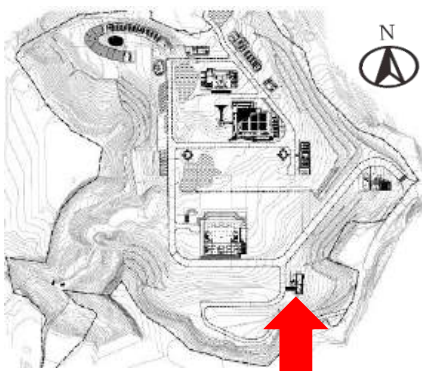

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



傳達室



高版區3F柱牆鋼筋綁紮

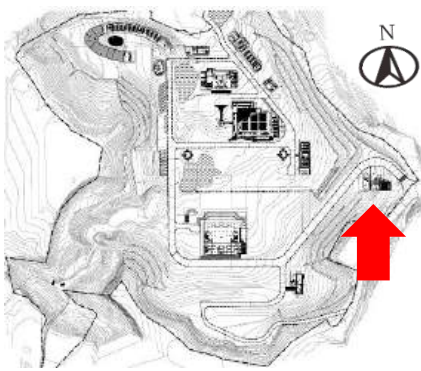

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



鐘樓



2F梁版鋼筋模版水電施作  
施工架搭設

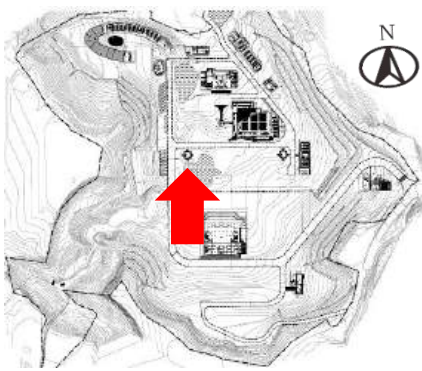



鼓樓



基礎版鋼筋模板水電施作

