

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月09日
施工工期	1170日曆天+展延工期7天
累計工期	770日曆天（截至114年08月28日）
剩餘工期	407日曆天
預定進度(114.08.28)	43.28%
實際進度(114.08.28)	43.05%
本週進度(超前/ <u>落後</u>)	0.23%



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



鋼構第二節柱吊裝
車道頂版聚脲防水施作

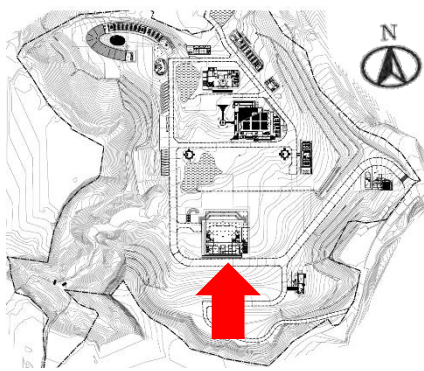


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



齋堂

1F油漆平頂批土
1F輕隔間放樣
1F泥作打底粉光
機電配管拉線

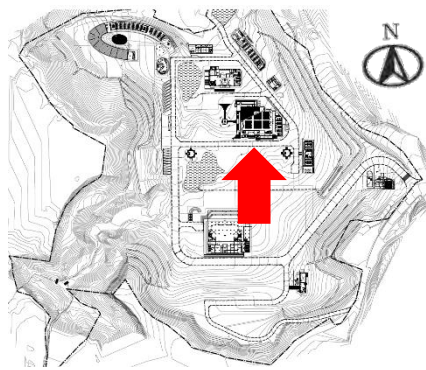

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



2F柱牆鋼筋模板施作
1F景觀梯施作
B1F泥作打底

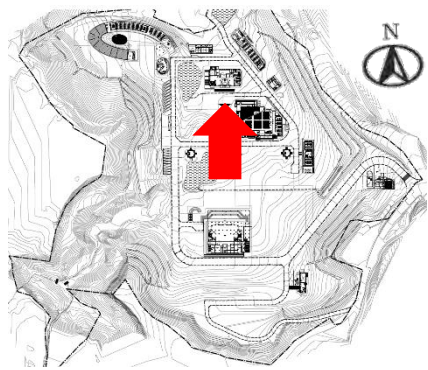


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

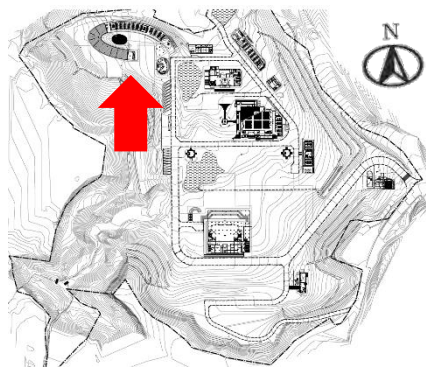

B1F-3F泥作打底粉光
B1F-4F輕隔間放樣
B1F-2F油漆平頂批土
屋頂鋼構吊裝
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



2F梁版模板施作

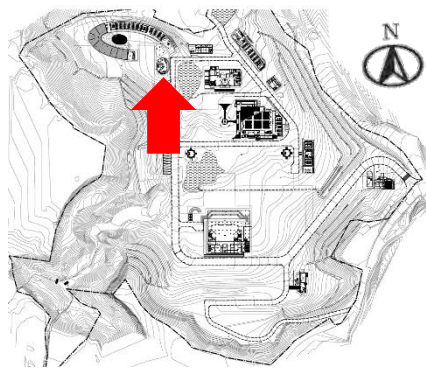


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

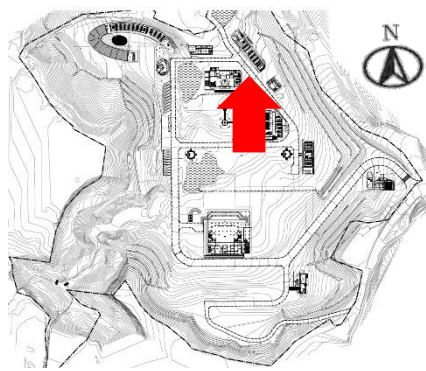

3F柱牆鋼筋模板水電
屋頂鋼構預埋
B1F-1F泥作打底粉刷
B1F輕隔間放樣
B1F-1F油漆平頂批土
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男義工



金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作打底
B1F-2F輕隔間放樣
B1F-2F油漆平頂批土
1F-3F鋁裝安裝嵌縫防水
1F-3F金屬門分料安裝
機電配管拉線

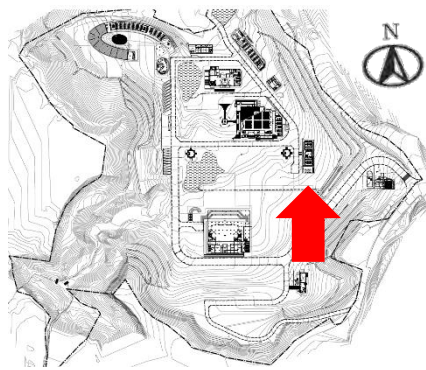

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男常住



金屬屋頂防火層施作
1F、2F泥作打底
1F、2F輕隔間放樣
1F、2F油漆平頂批土
1F-3F鋁裝安裝嵌縫防水
1F-3F金屬門分料安裝
機電配管拉線

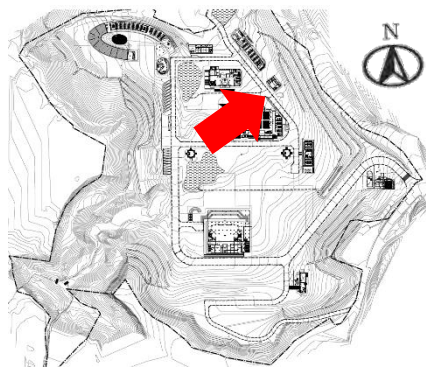

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



司機休息室



金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作打底
B1F-2F輕隔間放樣
機電配管拉線

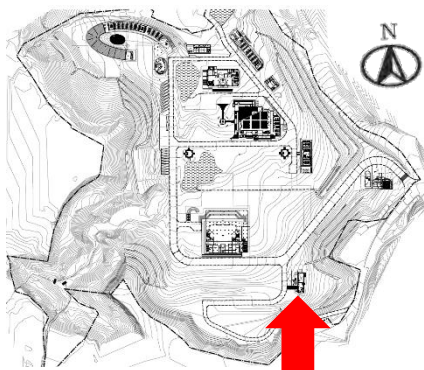

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



高版區3F柱牆鋼筋模板水電
外牆聚脲防水施作

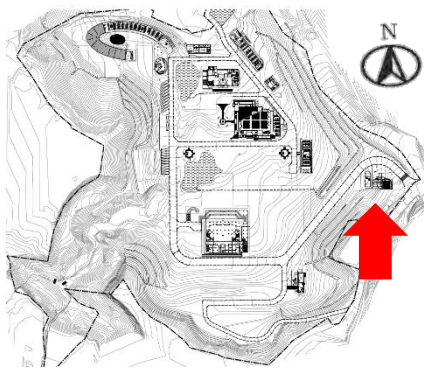

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鐘樓



鋼構屋頂待吊裝

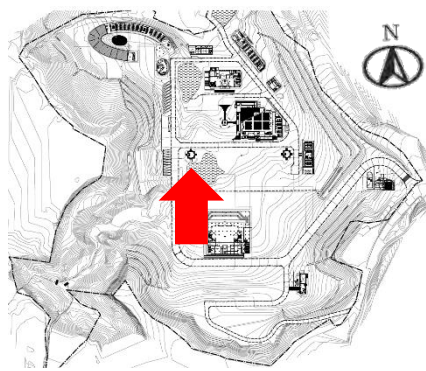

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鼓樓



1F樓梯鋼筋模板施作

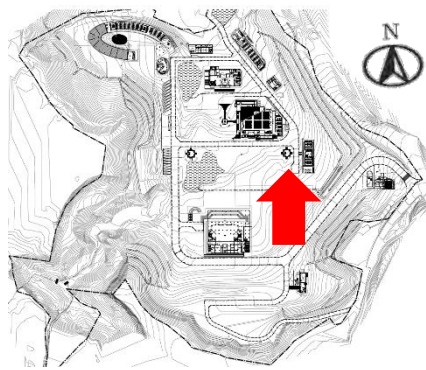



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



鋼構3F桁架吊裝

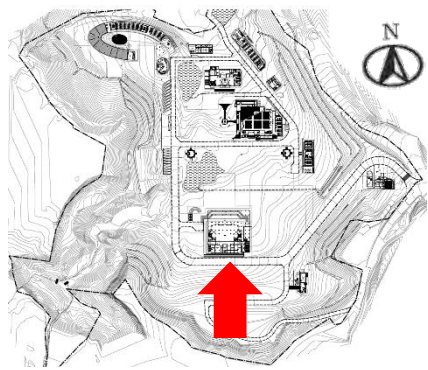

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



齋堂



1F油漆平頂批土
1F輕隔間放樣
1F-2F泥作打底粉光
機電配管拉線

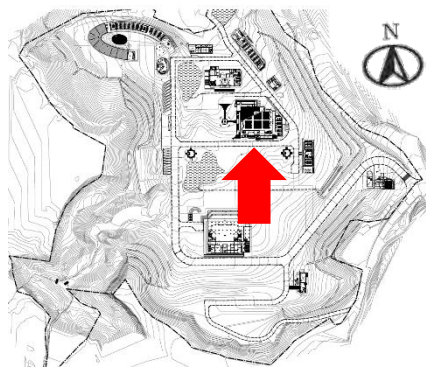

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



3F梁版鋼筋模板施作
B1F泥作打底

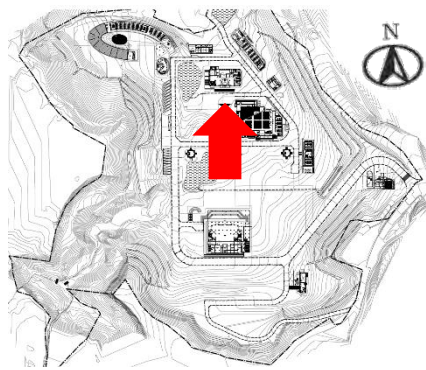


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

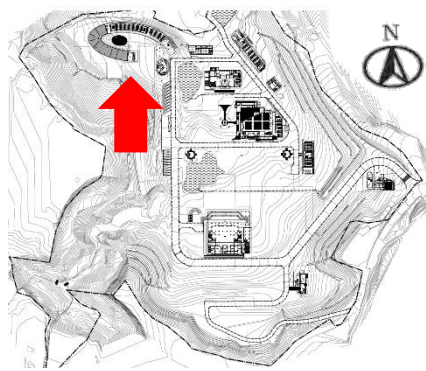

B1F-3F泥作打底粉光
B1F-4F輕隔間施作
B1F-2F油漆平頂批土
1F-3F鋁窗、金屬門安裝
屋頂鋼構吊裝
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



2F梁版鋼筋模板水電施作

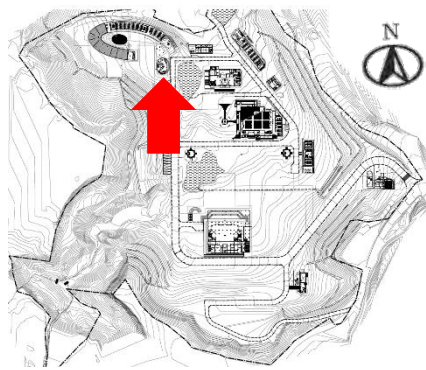


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

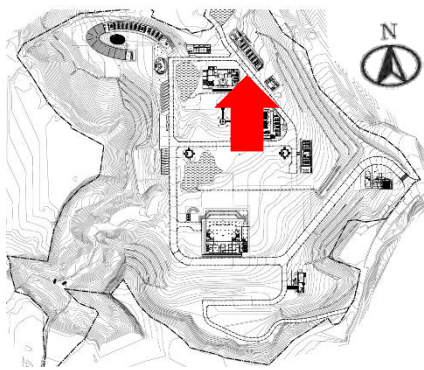

B1F-1F泥作打底粉刷
B1F輕隔間施作
B1F-1F油漆平頂批土
1F-2F鋁窗金屬門安裝
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男義工



金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作打底
B1F-2F輕隔間施作
B1F-2F油漆平頂批土
1F-3F戶外欄杆施作
1F-3F金屬門安裝

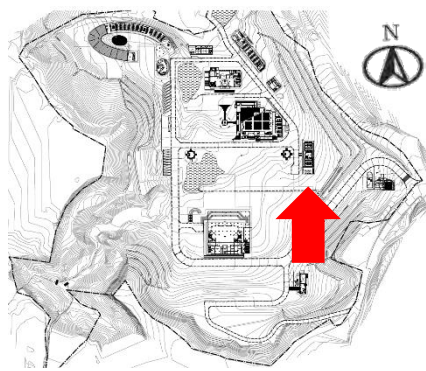

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男常住



金屬屋頂防火層施作
1F、2F泥作打底
1F、2F輕隔間施作
1F、2F油漆平頂批土
1F-3F鋁裝安裝嵌縫防水
1F-3F戶外欄杆施作
機電配管拉線

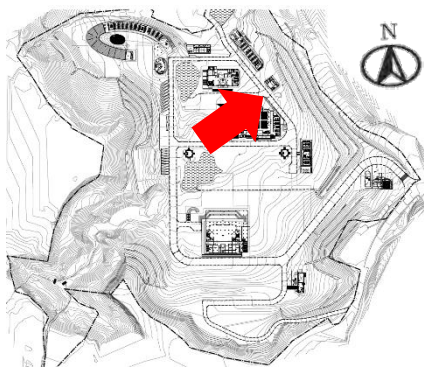

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



司機休息室



金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作打底
B1F-2F輕隔間放樣
機電配管拉線

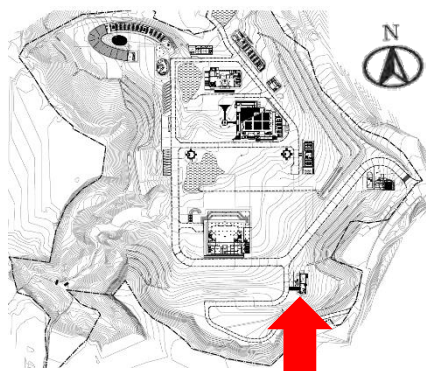

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



高版區RF梁版鋼筋模板水電
低版區土方開挖、五大管路引進

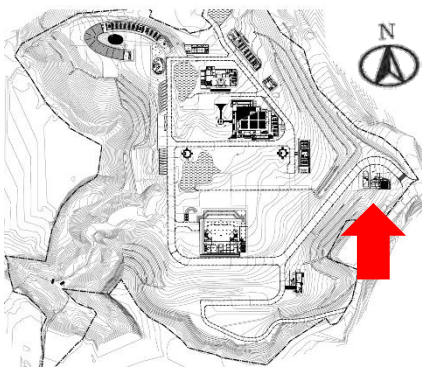

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鐘樓



鋼構屋頂待吊裝

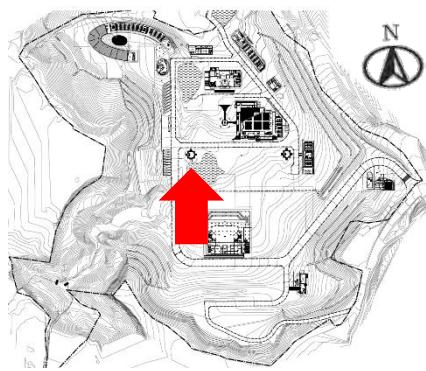

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



鼓樓



2F梁版鋼筋模板施作
木欄杆基座預埋

