

# 工程成本進度

| 工程名稱                 | 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案       |
|----------------------|----------------------|
| 開工日期                 | 112年07月21日           |
| 預定完工日期               | 115年10月09日           |
| 施工工期                 | 1170日曆天+展延工期7天       |
| 累計工期                 | 798日曆天（截至114年09月25日） |
| 剩餘工期                 | 379日曆天               |
| 預定進度(114.09.25)      | 46.25%               |
| 實際進度(114.09.25)      | 46.08%               |
| 本週進度(超前/ <u>落後</u> ) | 0.17%                |

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理




全區空拍照片

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外2。



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片

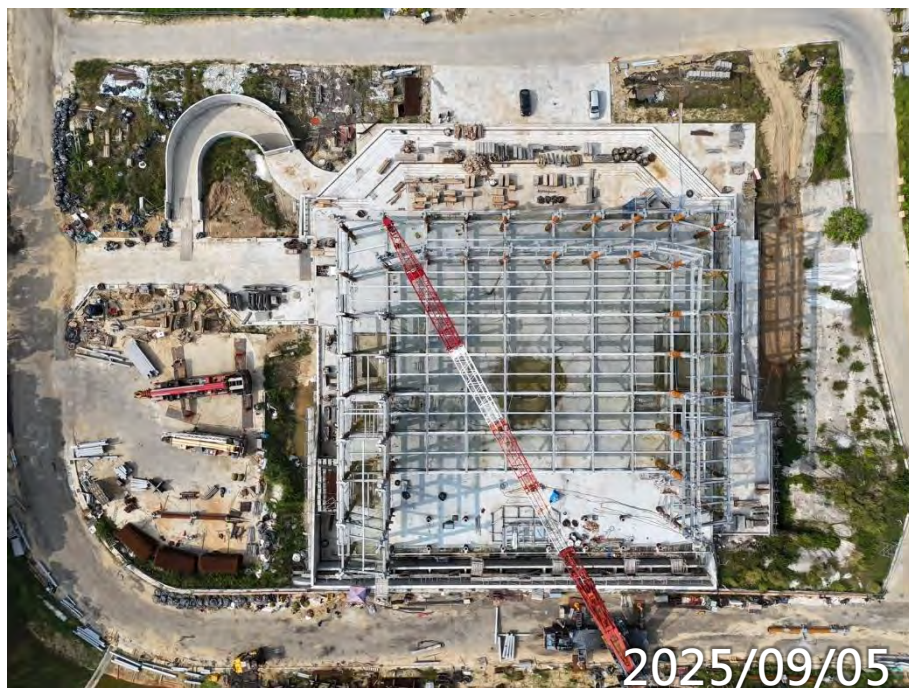

主殿



鋼構3F梁吊裝

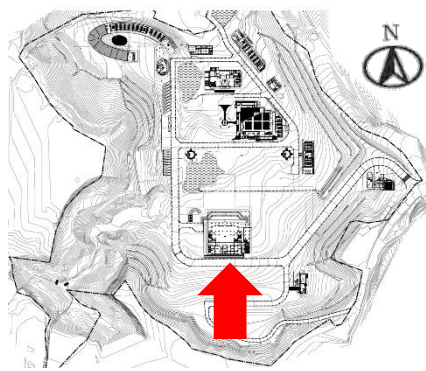




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



齋堂

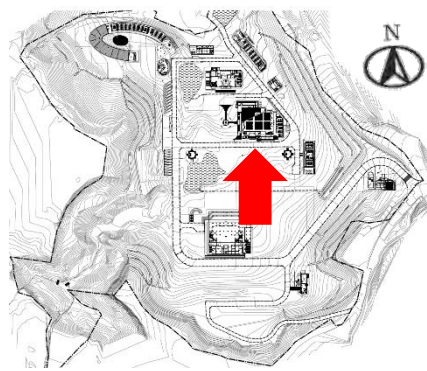


1F油漆平頂批土  
1F輕隔間放樣  
1F-2F泥作打底粉光  
機電配管拉線




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片

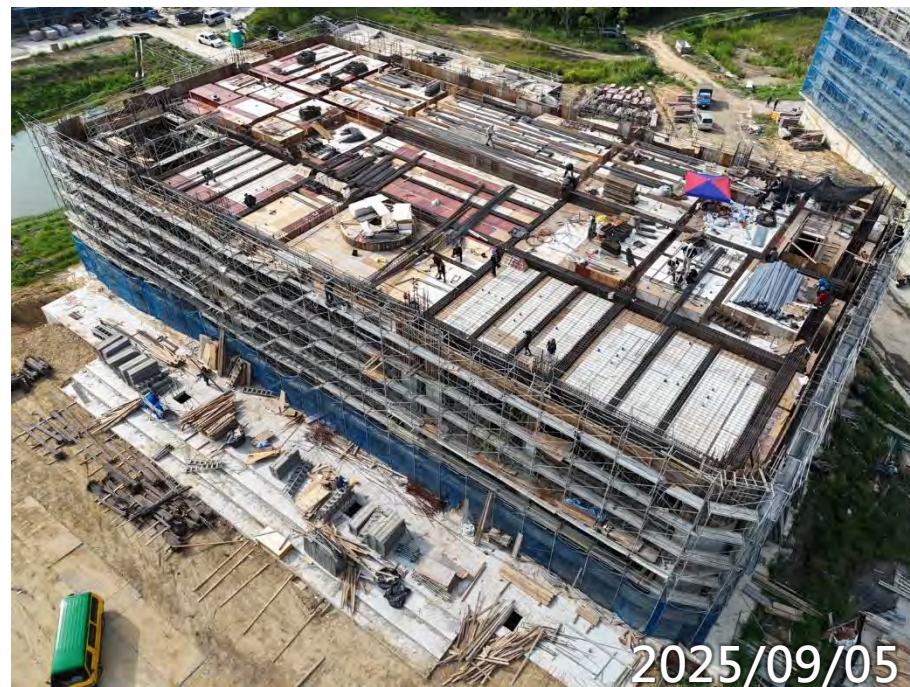

玄文

3F梁版鋼筋模板施作  
B1F泥作打底

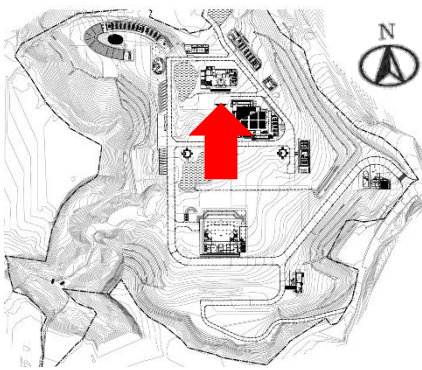




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



女寮

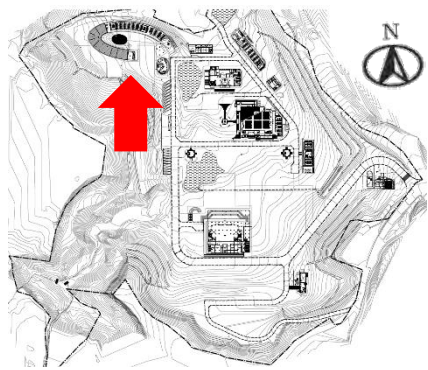

B1F-3F泥作打底粉光  
B1F-4F輕隔間施作  
B1F-2F油漆平頂批土  
1F-3F鋁窗、金屬門安裝  
屋頂鋼構吊裝  
機電配管拉線



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



女常住



2F梁版澆置

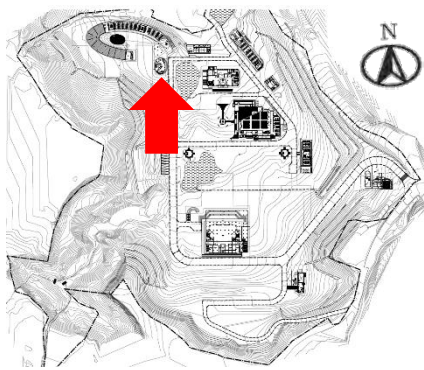




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



男寮

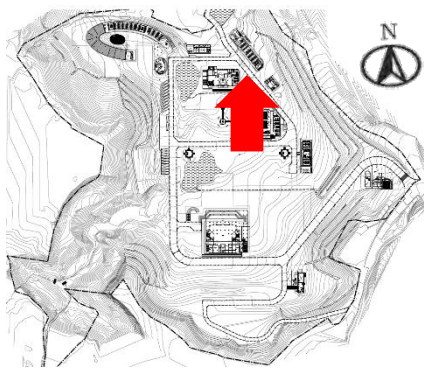

B1F-1F泥作打底粉刷  
B1F輕隔間施作  
B1F-1F油漆平頂批土  
1F-2F鋁窗金屬門安裝  
機電配管拉線



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



男義工



金屬屋頂防火層施作  
B1F-2F泥作打底  
B1F-2F輕隔間施作  
B1F-2F油漆平頂批土  
1F-3F戶外欄杆施作  
1F-3F金屬門安裝

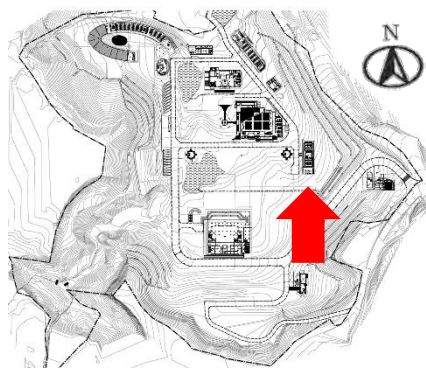



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



男常住



金屬屋頂防火層施作  
1F、2F泥作打底  
1F、2F輕隔間施作  
1F、2F油漆平頂批土  
1F-3F鋁裝安裝嵌縫防水  
1F-3F戶外欄杆施作  
機電配管拉線

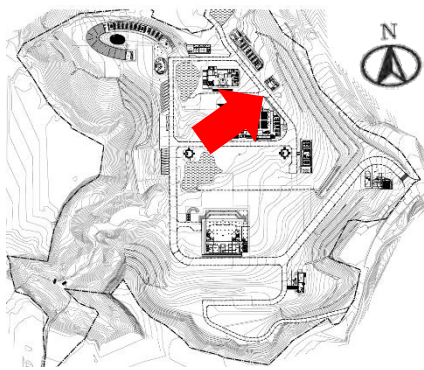



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



司機休息室



金屬屋頂防火層施作  
B1F-2F泥作打底  
B1F-2F輕隔間放樣  
機電配管拉線

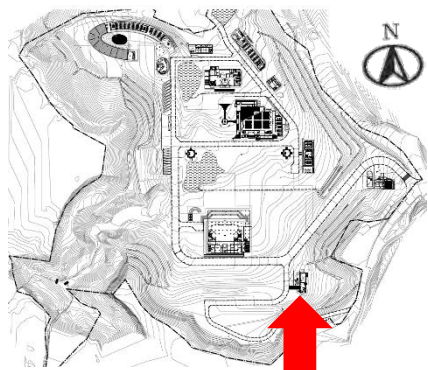



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



傳達室



高版區RF梁版鋼筋模板水電  
低版區基礎層鋼筋綁紮

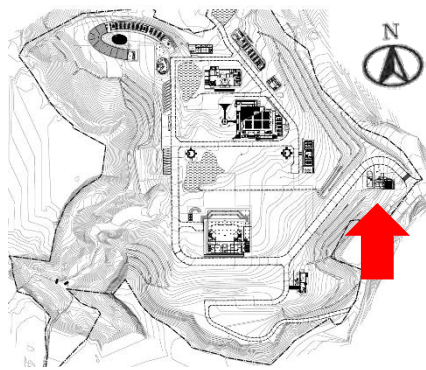



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



鐘樓




鋼構屋頂待吊裝

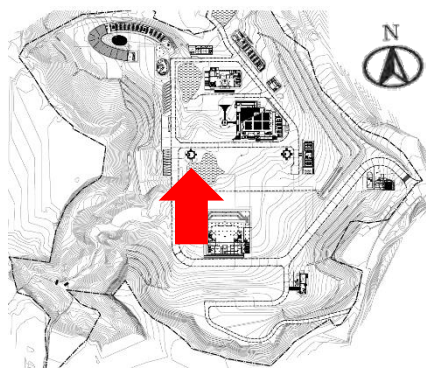



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片

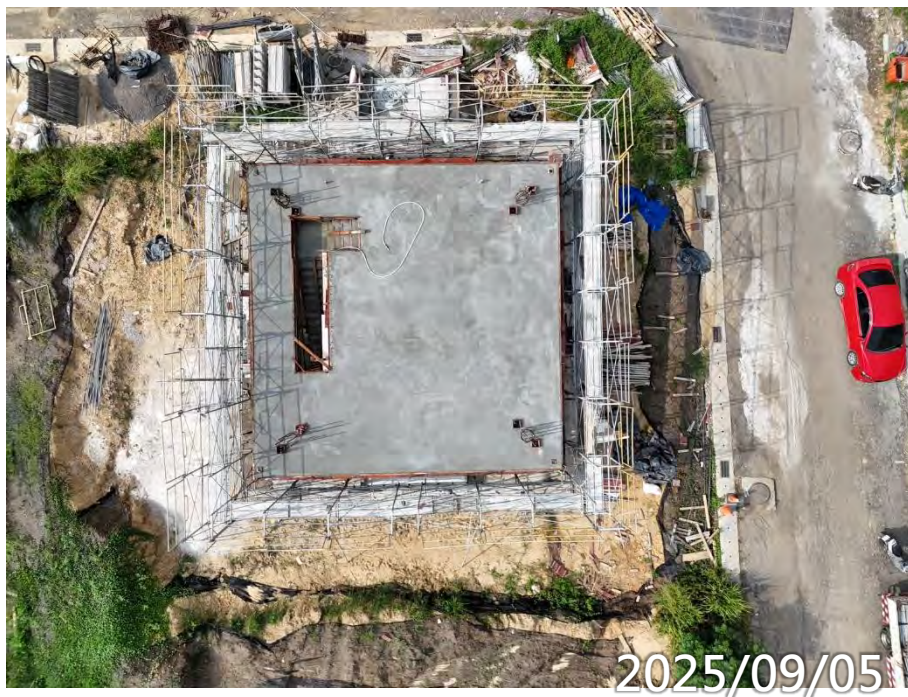

鼓樓



2F梁版澆置

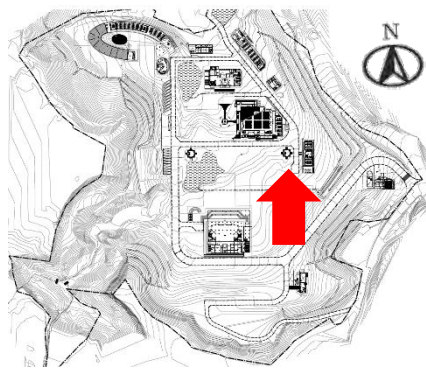



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理





# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



主殿



鋼構3F梁柱、下層屋簷吊裝  
B2F-B1F泥作吊線  
聚脲防水施作

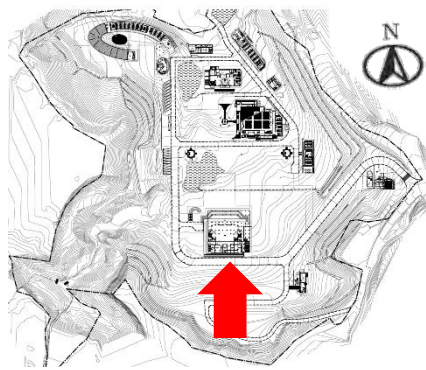



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



齋堂



1F-3F油漆平頂批土  
1F-3F輕隔間施作  
1F-3F泥作打底粉光  
機電配管拉線

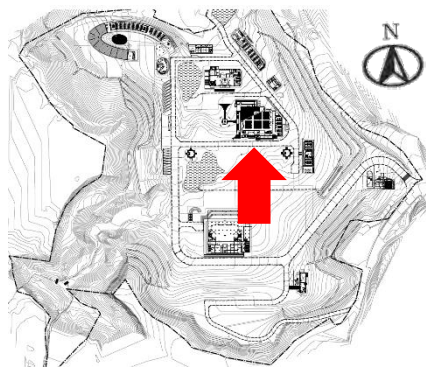



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



玄文



3F梁版澆置  
B1F泥作打底

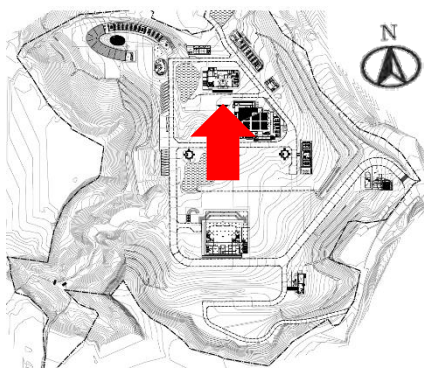




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



女寮

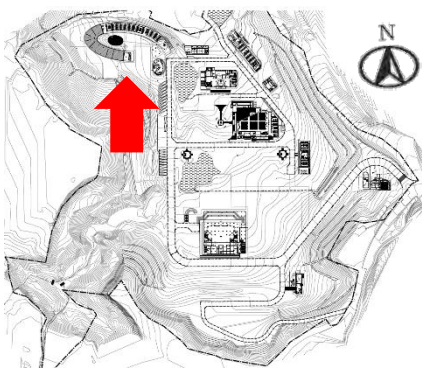

金屬屋頂防火層施作  
B1F-3F泥作打底粉光  
B1F-4F輕隔間施作  
B1F-3F油漆平頂批土  
1F-3F鋁窗、金屬門安裝  
機電配管拉線



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



女常住



2F柱澆置

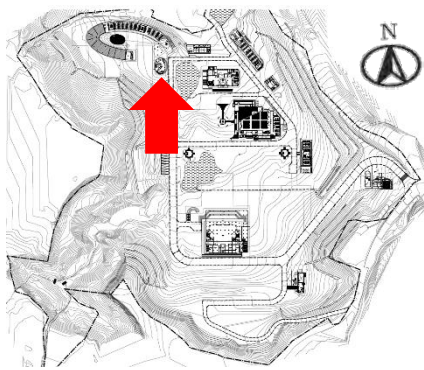




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



男寮

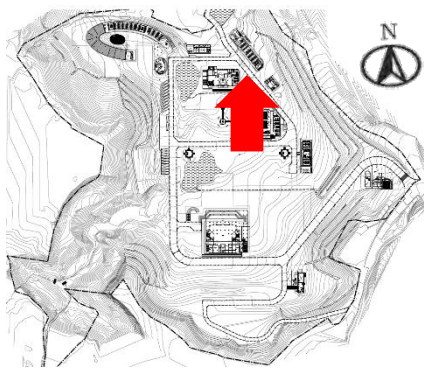

屋頂鋼構吊裝  
B1F-2F泥作打底粉刷  
B1F-2F輕隔間施作  
B1F-2F油漆平頂批土  
1F-3F鋁窗金屬門安裝  
機電配管拉線



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



男義工



金屬屋頂防火層施作  
B1F-3F泥作打底粉光  
B1F-3F輕隔間施作  
B1F-3F油漆施作  
B1F-3F金屬門安裝  
機電配管拉線

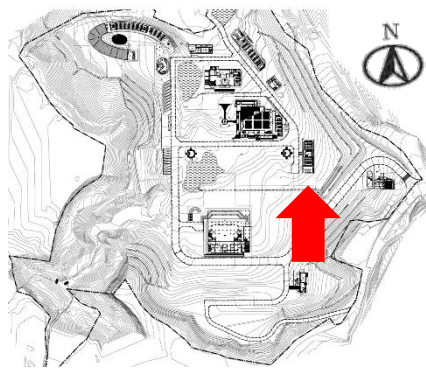




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



男常住

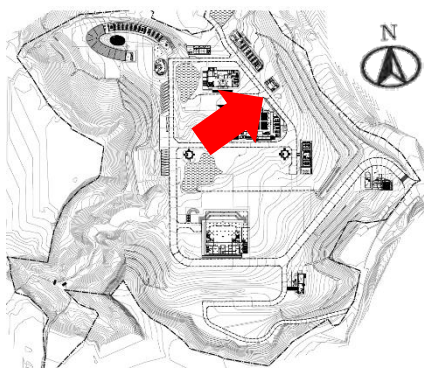

金屬屋頂防火層施作  
1F-3F泥作打底粉光  
1F-3F輕隔間施作  
1F-3F油漆施作  
1F-3F戶外欄杆施作  
機電配管拉線




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



司機休息室

金屬屋頂防火層施作  
B1F-2F泥作打底粉光  
B1F-2F輕隔間施作  
B1F-2F油漆施作  
1F-3F戶外欄杆施作  
機電配管拉線

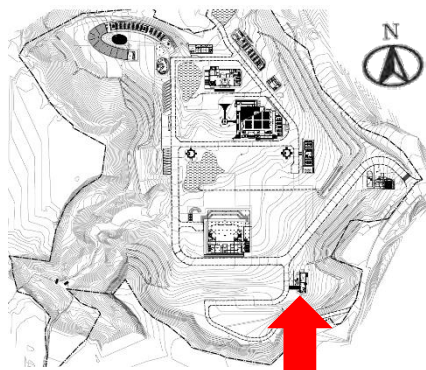



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



傳達室



高版區RF梁版鋼筋模板水電  
低版區基礎層澆置

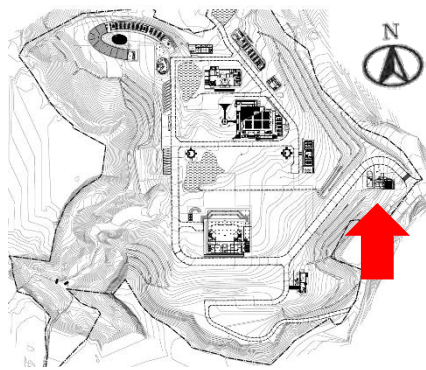



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



鐘樓



鋼構屋頂待吊裝

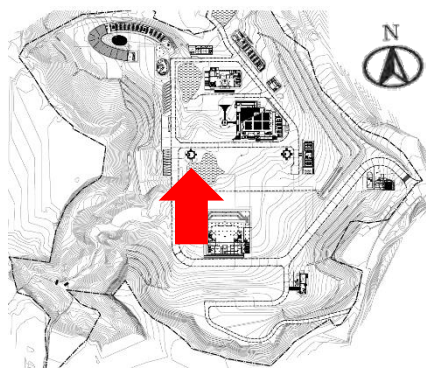



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



鼓樓



2F柱澆置

