

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月09日
施工工期	1170日曆天+展延工期7天
累計工期	826日曆天（截至114年10月23日）
剩餘工期	351日曆天
預定進度(114.10.23)	47.20%
實際進度(114.10.23)	47.09%
本週進度(超前/ <u>落後</u>)	0.11%



全區空拍照片

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



鋼構3F梁柱、下層屋簷吊裝
B2F-B1F泥作吊線
聚脲防水施作

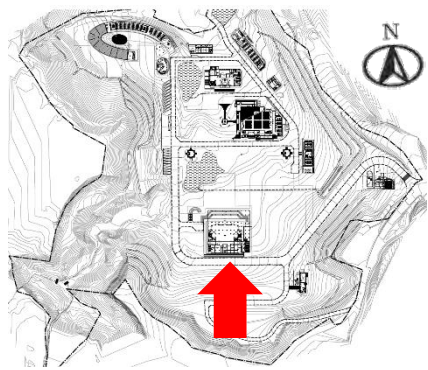


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



齋堂

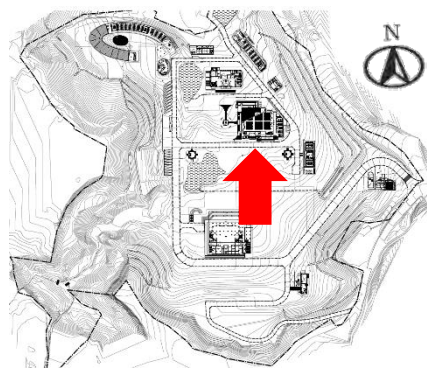

屋頂鋼構吊裝
1F-3F油漆平頂批土
1F-3F輕隔間施作
1F-3F泥作打底粉光
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



3F柱牆鋼筋模板水電施作
B1F泥作打底粉光
B1F油漆批土刷漆

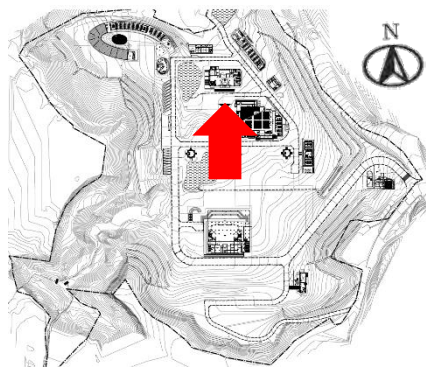


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

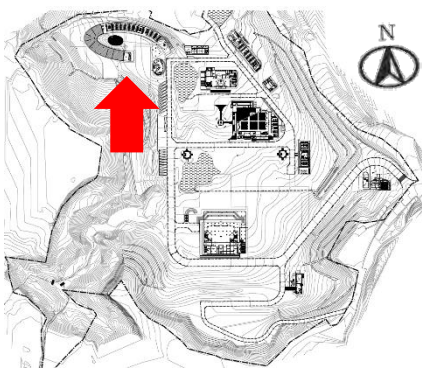

金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作打底粉光
B1F-4F輕隔間施作
B1F-3F油漆批土刷漆
1F-3F鋁窗、金屬門安裝
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



2F牆鋼筋模板水電施作

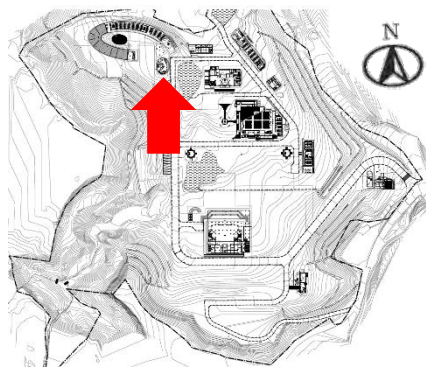


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片




男寮

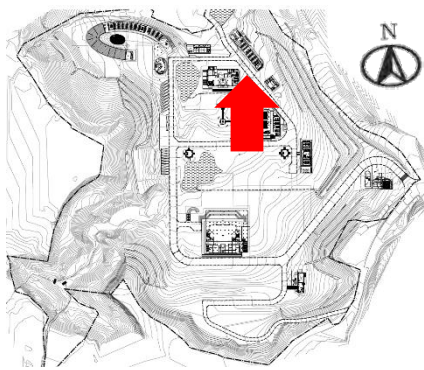


屋頂鋼構吊裝
B1F-2F泥作打底粉刷
B1F-2F輕隔間施作
B1F-2F油漆批土刷漆
1F-3F鋁窗金屬門安裝
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

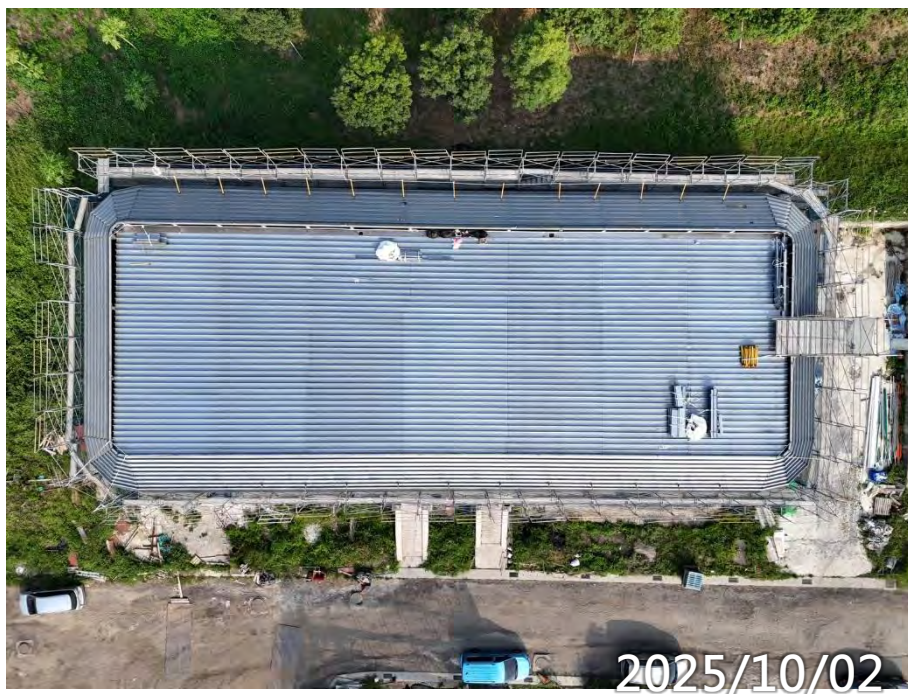

男義工

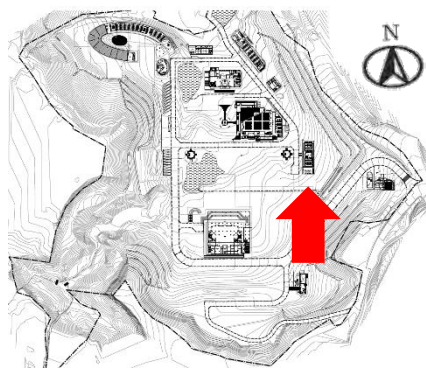


金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作打底粉光
B1F-3F輕隔間施作
B1F-3F油漆批土刷漆
B1F-3F金屬門安裝
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男常住

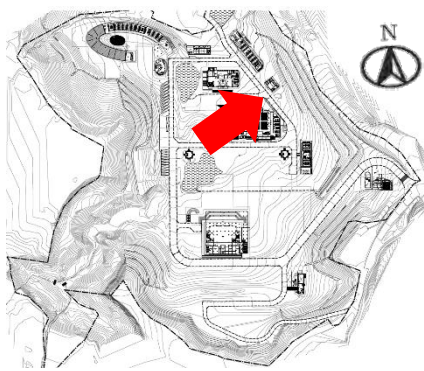


金屬屋頂防火層施作
1F-3F泥作打底粉光
1F-3F輕隔間施作
1F-3F油漆批土刷漆
1F-3F戶外欄杆施作
機電配管拉線



司機休息室



金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作打底粉光
B1F-2F輕隔間施作
B1F-2F油漆批土刷漆
1F-3F戶外欄杆施作
機電配管拉線

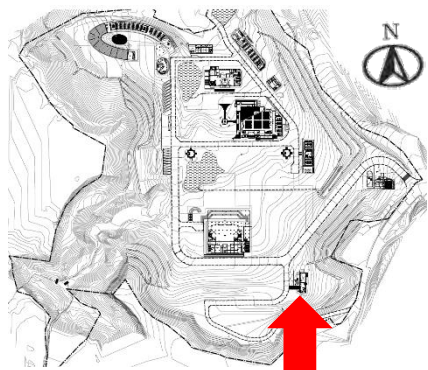

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



高版區RF梁版鋼筋模板水電
高低版交界CLSM回填
低版區1F柱續接

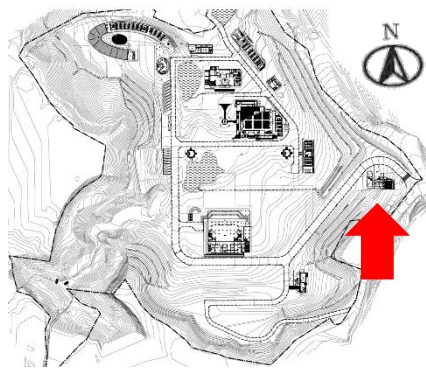

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



汙水處理廠



屋頂聚脲防水試水

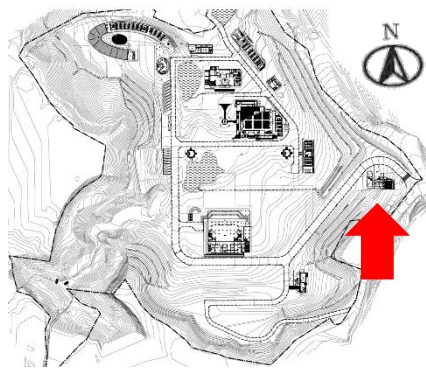




鐘樓



鋼構屋頂待吊裝

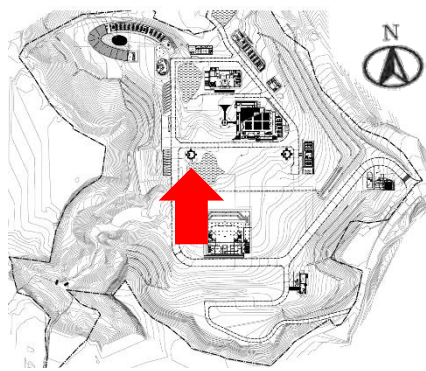

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鼓樓



2F柱澆置
屋頂鋼構預埋

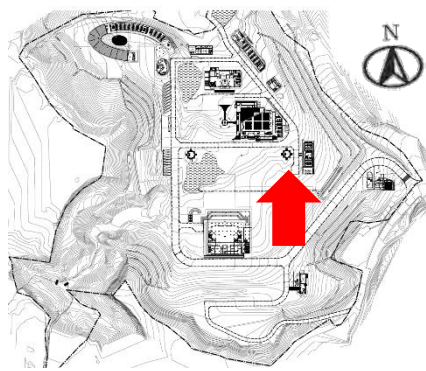



全區空拍照片

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



鋼構3F梁柱、下層屋簷校正電銲
B2F-B1F泥作吊線

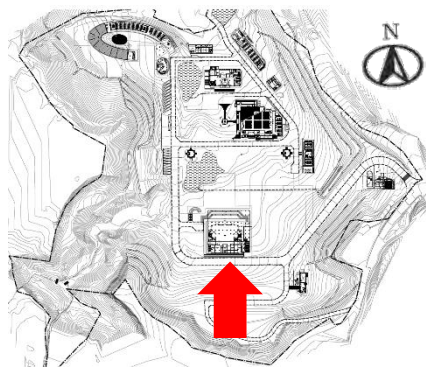


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



齋堂

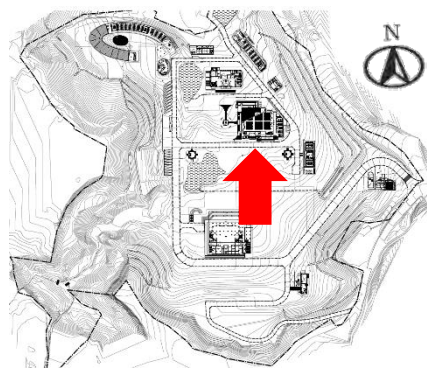

屋頂鋼構吊裝
1F-3F油漆平頂批土
1F-3F輕隔間施作
1F-3F泥作打底粉光
機電配管拉線


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



玄文

3F柱牆鋼筋模板水電施作
B1F泥作打底粉光
B1F油漆批土刷漆

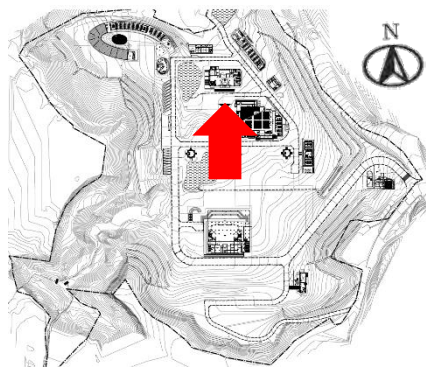


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

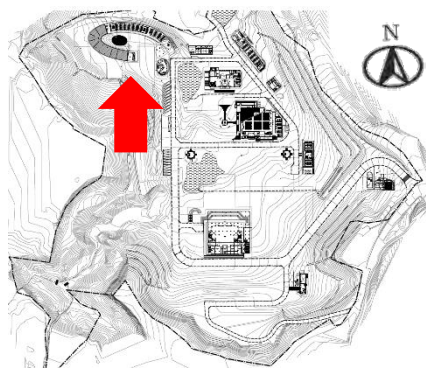

金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作打底粉光
B1F-4F輕隔間施作
B1F-3F油漆批土刷漆
1F-3F鋁窗、金屬門安裝
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



RF梁鋼筋模板水電施作

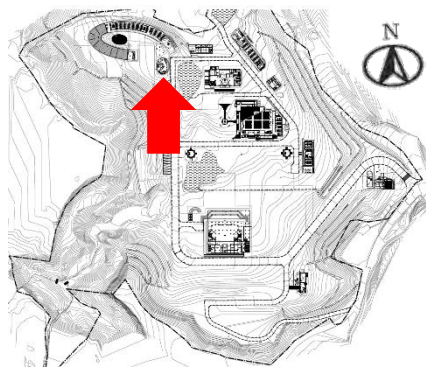


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

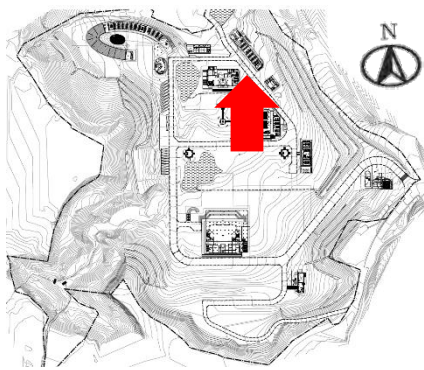


屋頂鋼構吊裝
B1F-2F泥作打底粉刷
B1F-2F輕隔間施作
B1F-2F油漆批土刷漆
1F-3F鋁窗金屬門安裝
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男義工

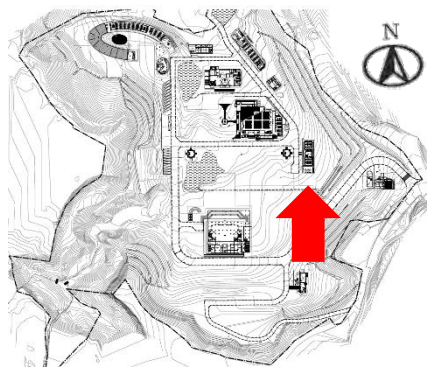


金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作打底粉光
B1F-3F輕隔間施作
B1F-3F油漆批土刷漆
B1F-3F金屬門安裝
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男常住

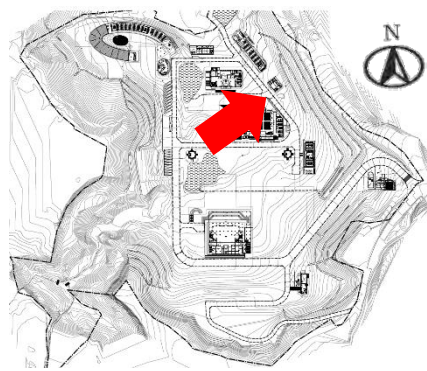

金屬屋頂防火層施作
1F-3F泥作打底粉光
1F-3F輕隔間施作
1F-3F油漆批土刷漆
1F-3F戶外欄杆施作
機電配管拉線


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



司機休息室

金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作打底粉光
B1F-2F輕隔間施作
B1F-2F油漆批土刷漆
1F-3F戶外欄杆施作
機電配管拉線

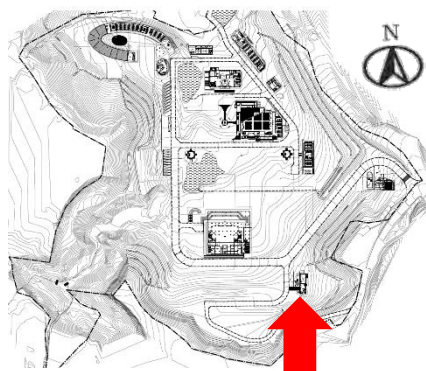

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



高版區水箱鋼筋模板水電
低版區1F柱牆鋼筋模板水電

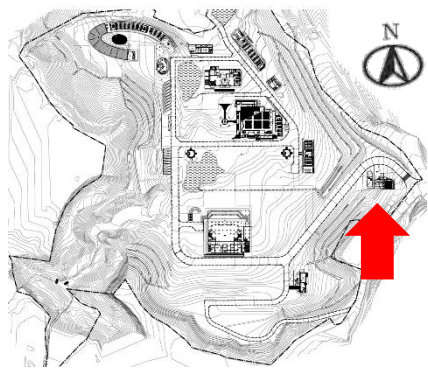




鐘樓



鋼構屋頂待吊裝

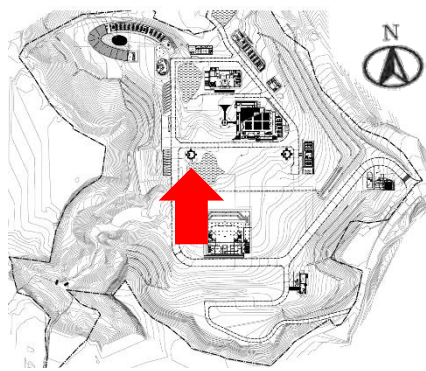



鼓樓



鋼構屋頂待吊裝

