

# 工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月10日
施工工期	1170日曆天+展延工期8天
累計工期	882日曆天（截至114年12月18日）
剩餘工期	296日曆天
預定進度(114.12.18)	51.96%
實際進度(114.12.18)	51.67%
本週進度(超前/ <u>落後</u> )	0.29%

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理



全區空拍照片



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



主殿



鋼構下層屋簷校正電銲  
3F版鋼承鈑、鋼筋鋪設  
B2F-B1F泥作、油漆施作

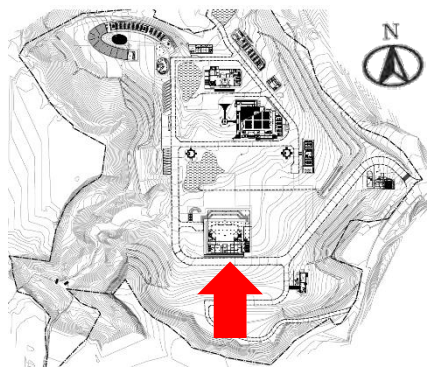




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



齋堂

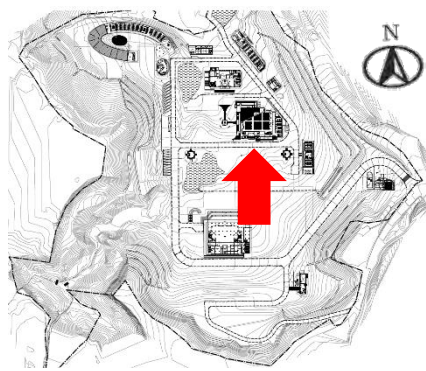

屋頂鋼構電鍍校正

1F-3F泥作、輕隔間、油漆

1F-3F戶外欄杆墩座施作


筏基配管回封

機電配管拉線




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片

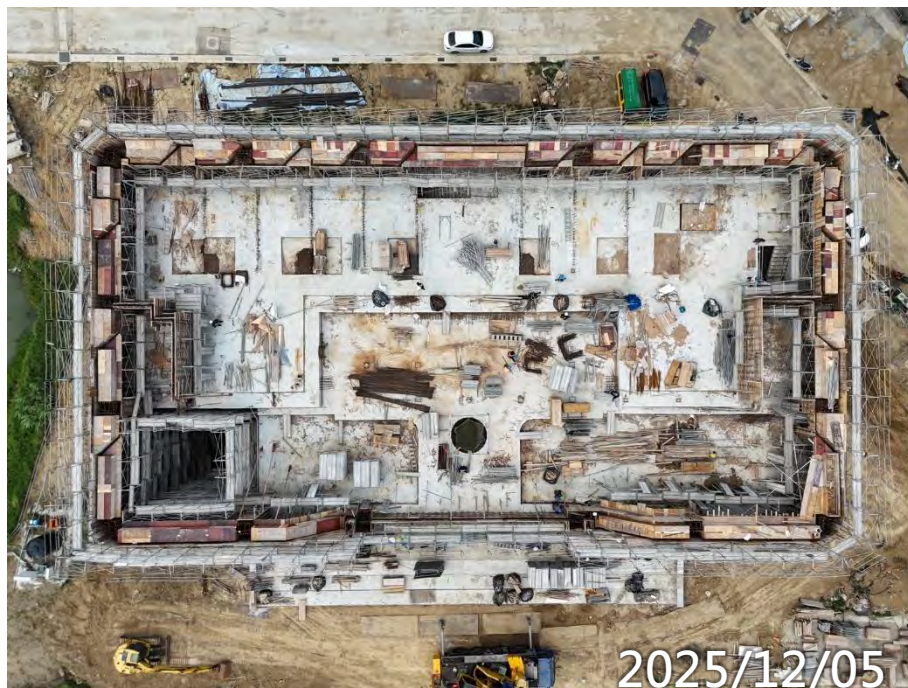

玄文

3F柱牆鋼筋模板水電施作  
B1F泥作、油漆施作  
筏基FRP施作

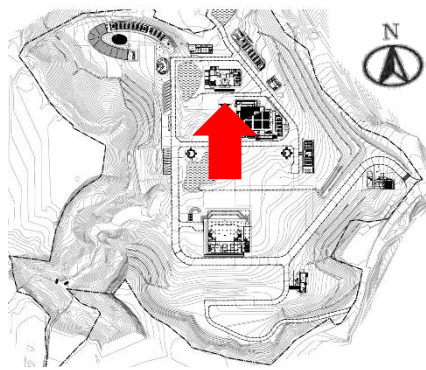




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



女寮

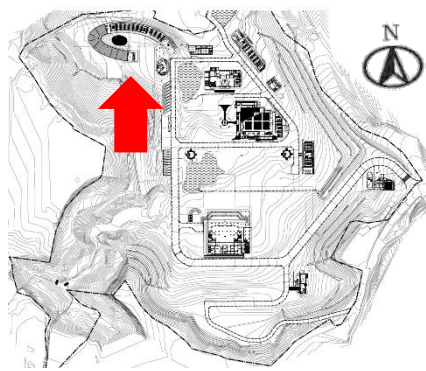

金屬屋頂防火層施作  
B1F-4F泥作、輕隔間、油漆、  
門窗、電梯施作  
1F-4F戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



女常住



RF梁鋼筋模板水電施作  
筏基配管

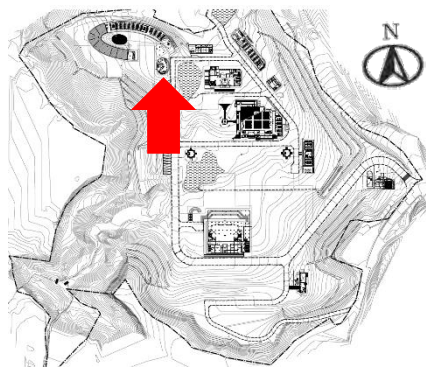




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



男寮

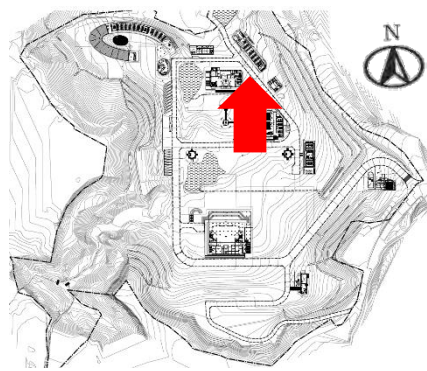

金屬屋頂防火層施作  
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、  
門窗施作  
1F-3F戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



男義工

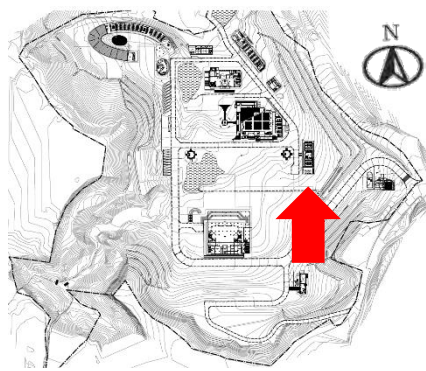

金屬屋頂防火層施作  
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、  
門窗、電梯施作  
1F-3F戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



男常住


金屬屋頂防火層施作  
1F-3F泥作、輕隔間、油漆、  
門窗、電梯、戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線

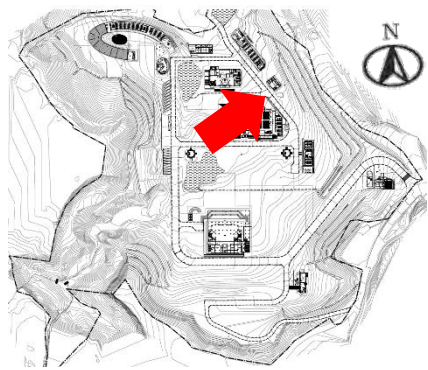



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片

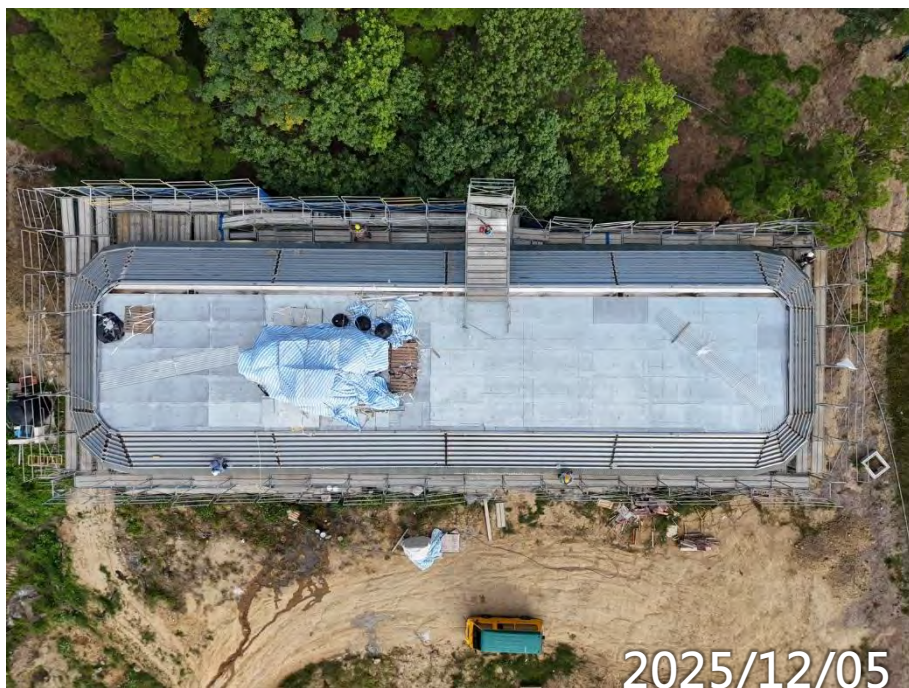

司機休息室



金屬屋頂防火層施作  
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、  
門窗、電梯施作  
1F-3F戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線

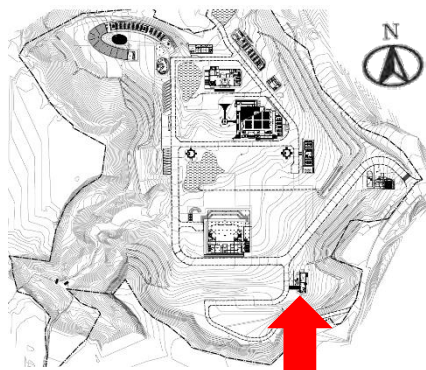



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



傳達室



高版區水箱鋼筋模板水電  
低版區2F柱牆鋼筋模板水電

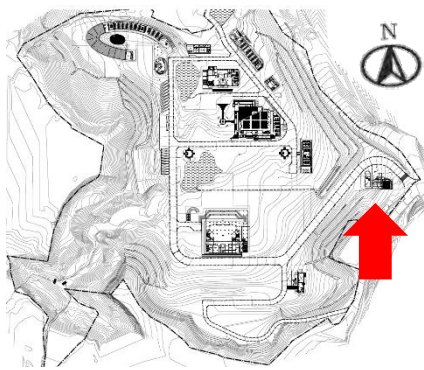



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



鐘樓



鋼構屋頂待吊裝

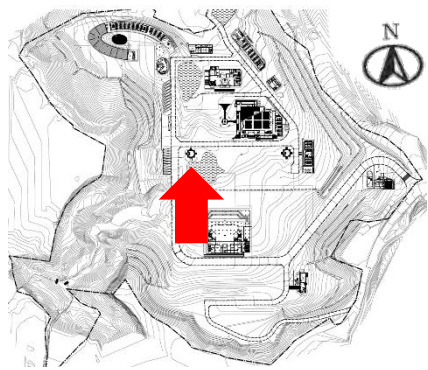






鼓樓



鋼構屋頂待吊裝

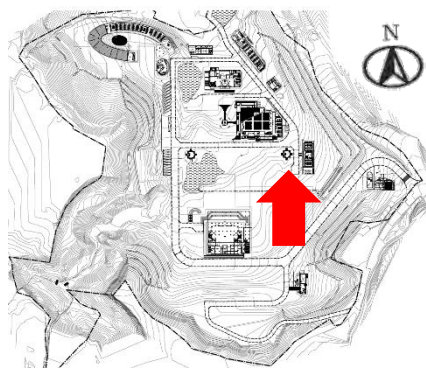



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理



全區空拍照片



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



主殿



鋼構下層屋簷校正電銲  
3F版鋼筋模板水電施作  
B2F-B1F泥作、油漆施作  
2F-3F鋼柱內灌漿

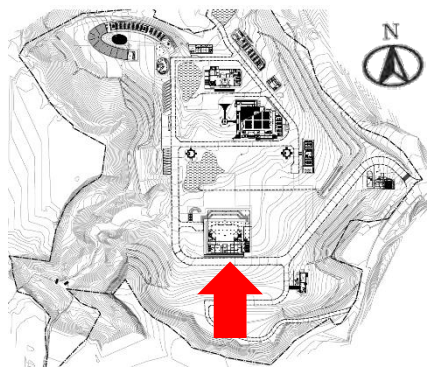




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



齋堂

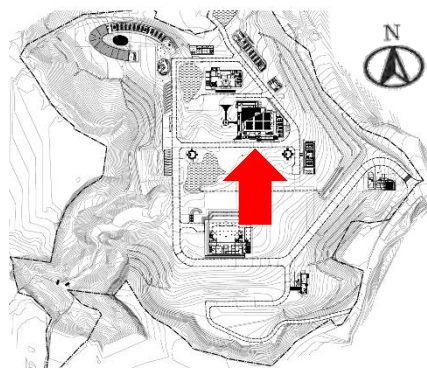

屋頂鋼構電銲校正

1F-3F泥作、輕隔間、油漆

1F-3F戶外欄杆墩座施作

筏基配管回封

機電配管拉線




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



玄文

RF梁鋼筋模板水電施作  
B1F泥作、油漆施作  
筏基FRP施作

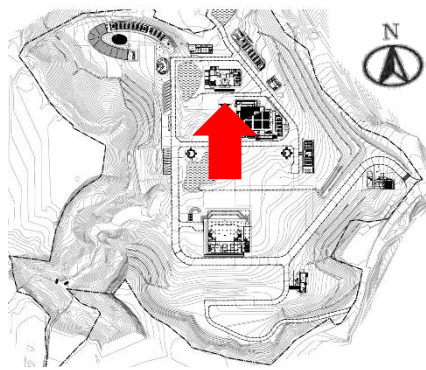




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



女寮

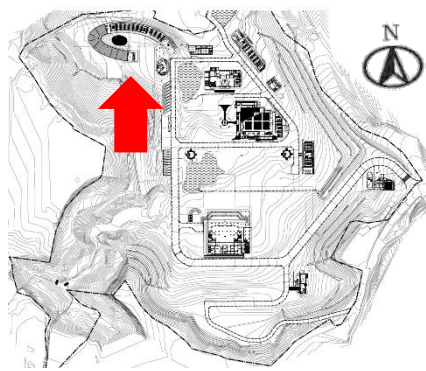

金屬屋頂防火層施作  
B1F-4F泥作、輕隔間、油漆、  
門窗、電梯施作  
1F-4F戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



女常住



屋頂鋼構吊裝

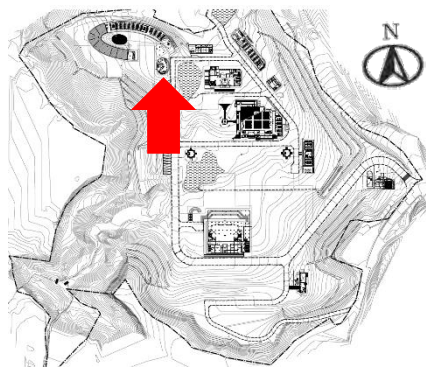




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



男寮

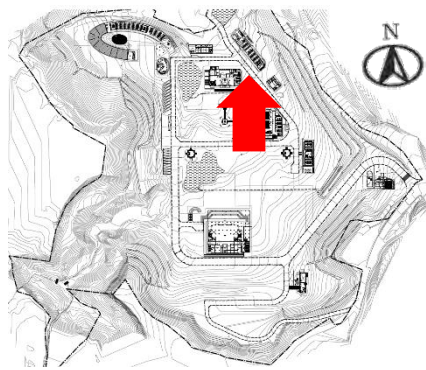

金屬屋頂防火層施作  
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、  
門窗施作  
1F-3F戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



男義工



金屬屋頂防火層施作  
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、  
門窗、電梯施作  
1F-3F戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線

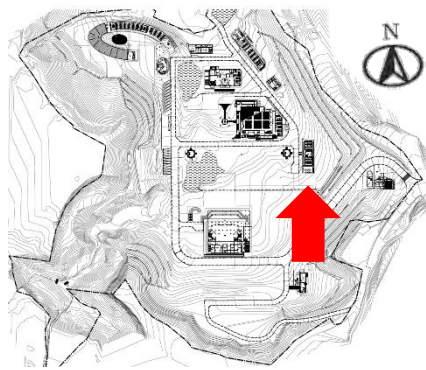




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



男常住

金屬屋頂防火層施作  
1F-3F泥作、輕隔間、油漆、  
門窗、電梯、戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線

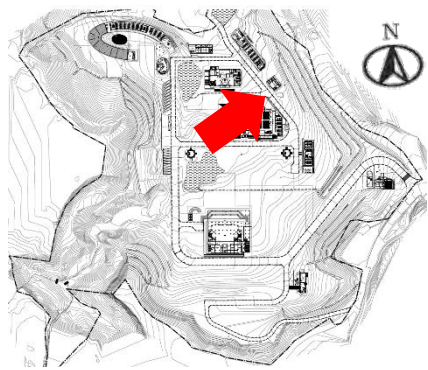



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



司機休息室



金屬屋頂防火層施作  
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、  
門窗、電梯施作  
1F-3F戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線

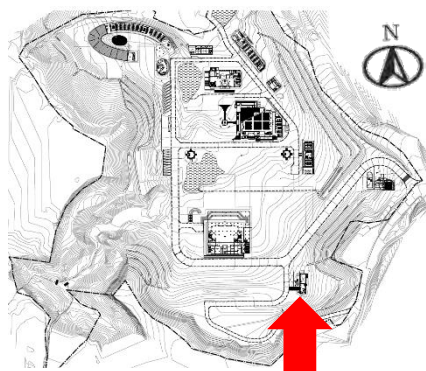



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



傳達室



高版區水箱鋼筋模板水電  
低版區2F柱牆鋼筋模板水電

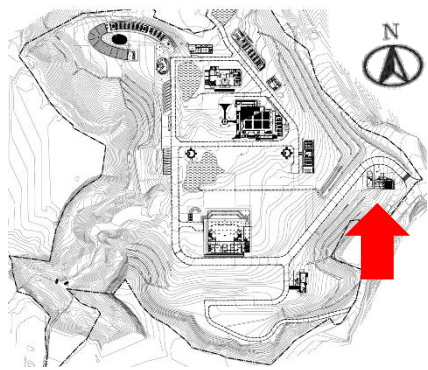



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



鐘樓



鋼構屋頂待吊裝

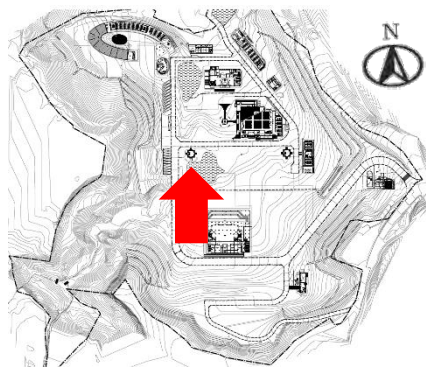



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



鼓樓



鋼構屋頂待吊裝

