

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月10日
施工工期	1170日曆天+展延工期8天
累計工期	923日曆天（截至115年01月29日）
剩餘工期	255日曆天
預定進度(115.01.29)	55.09%
實際進度(115.01.29)	54.55%
本週進度(超前/ <u>落後</u>)	0.54%

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理



全區空拍照片

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外2。


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



主殿

鋼構下層屋簷校正電銲
3F版鋼筋模板水電施作
B2F-B1F泥作、油漆施作
2F-3F鋼柱內灌漿

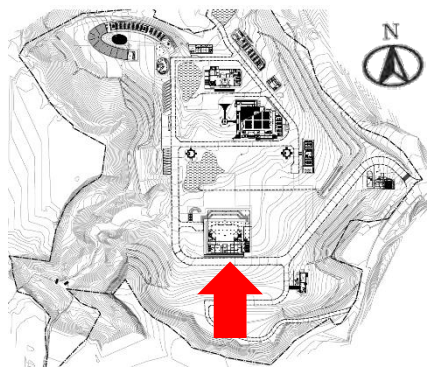


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



齋堂

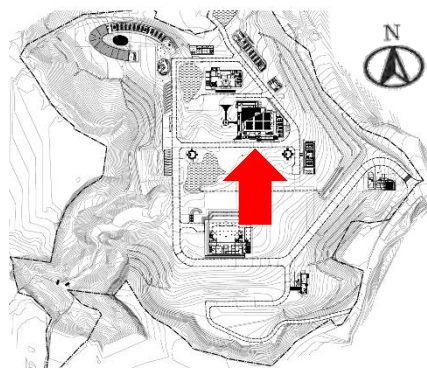

屋頂鋼構電鍍校正

1F-3F泥作、輕隔間、油漆

1F-3F戶外欄杆墩座施作

筏基配管回封

機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



RF梁鋼筋模板水電施作
B1F泥作、油漆施作
筏基FRP施作

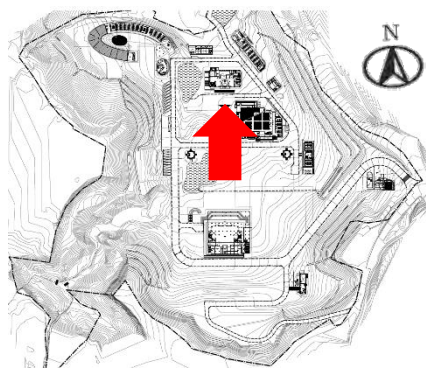


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

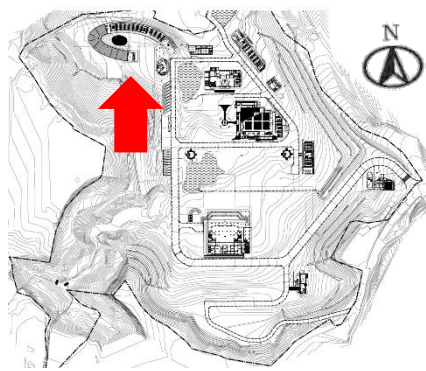

金屬屋頂防火層施作
B1F-4F泥作、輕隔間、油漆、
門窗、電梯施作
1F-4F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



屋頂鋼構電鍍校正

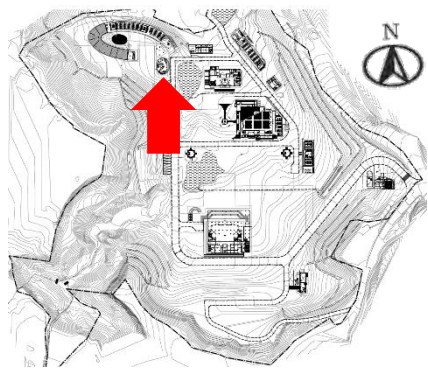


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

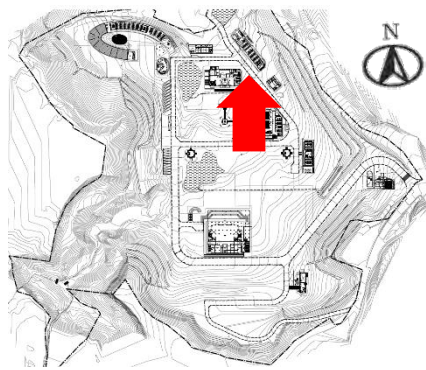


金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
門窗施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片




男義工

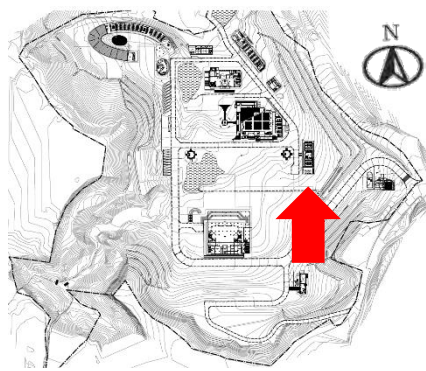


金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
門窗、電梯施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

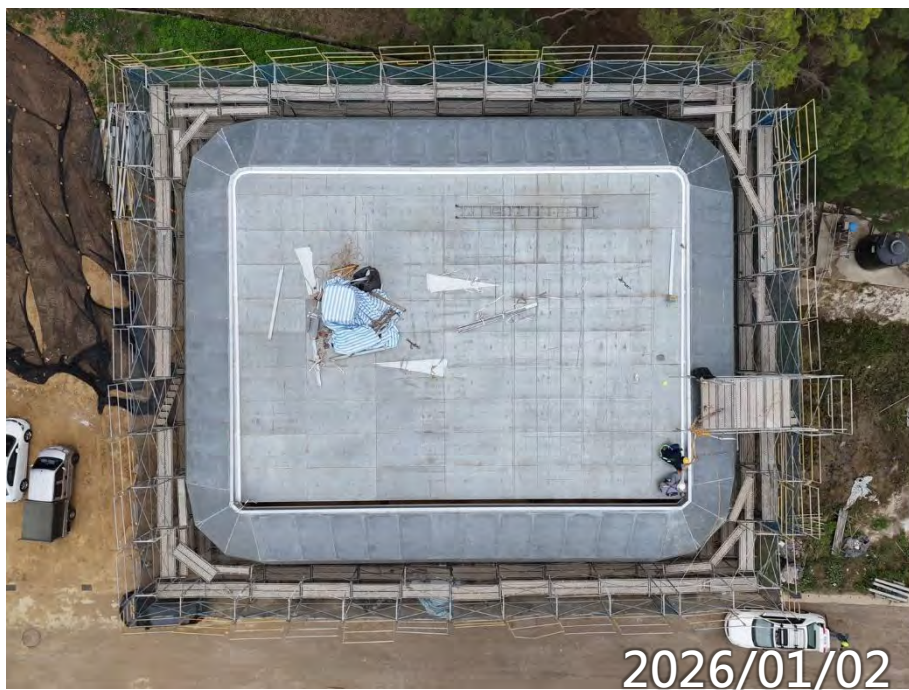

男常住

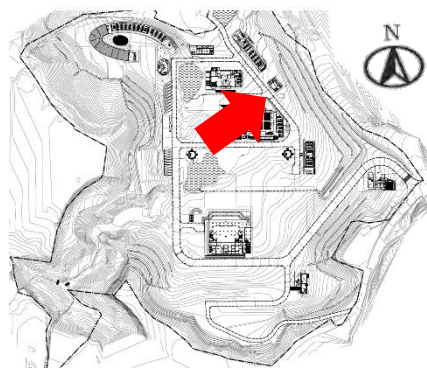

金屬屋頂防火層施作
1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
門窗、電梯、戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



司機休息室



金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
門窗、電梯施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

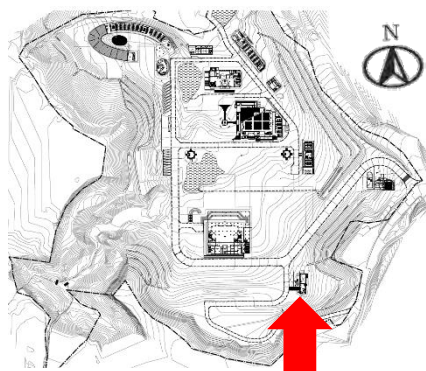

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



高版區水箱鋼筋模板水電
低版區2F柱牆鋼筋模板水電

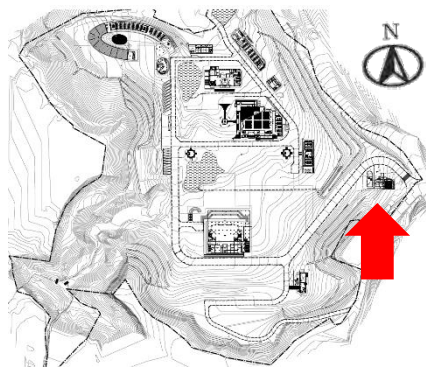

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鐘樓



鋼構屋頂待吊裝

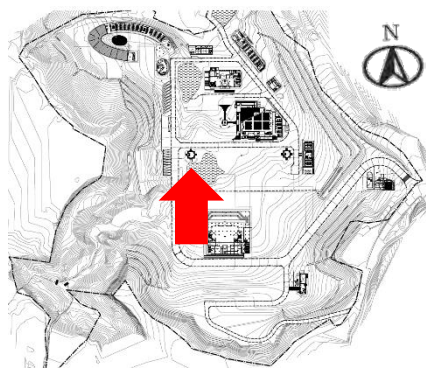

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鼓樓



鋼構屋頂待吊裝

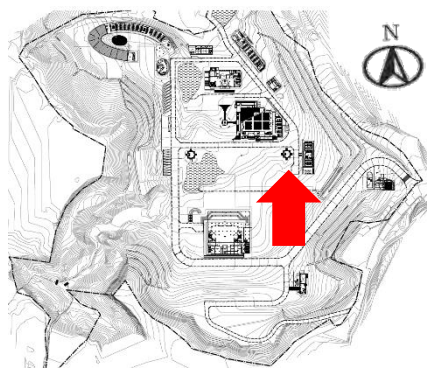

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理



全區空拍照片

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



鋼構下層屋簷校正電銲
3F版鋼筋模板水電施作
B2F-B1F泥作、油漆、鐵捲門施作

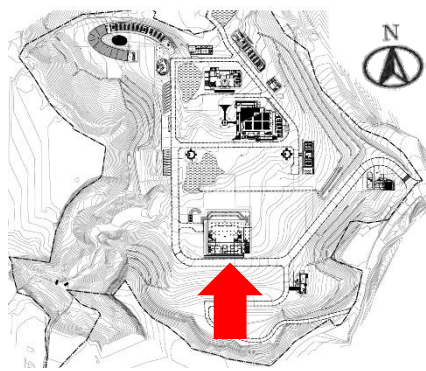


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



齋堂

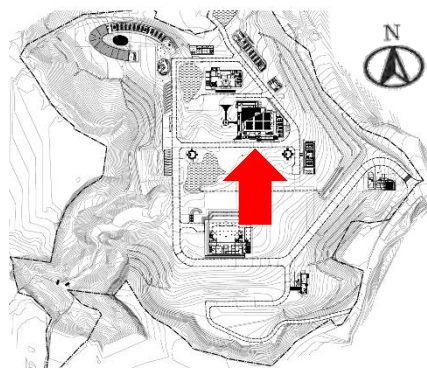

金屬屋頂防火層施作
1F-4F泥作、輕隔間、油漆、戶
外欄杆墩座、鐵捲門、鋁窗、
金屬門施作
RF屋頂防水施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



屋頂鋼構電銲校正
B1F泥作、油漆施作
地下室頂版防水施作

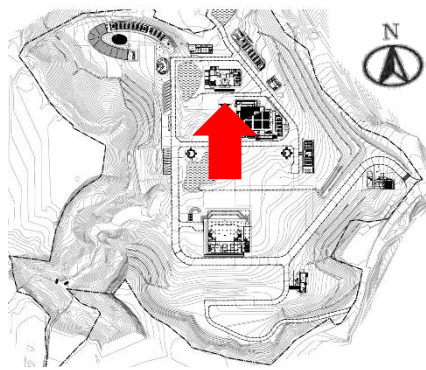


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

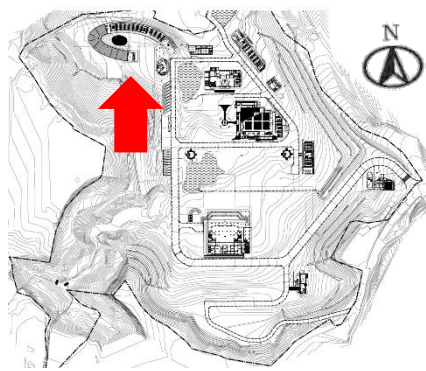

金屬屋頂防火層施作
B1F-4F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-4F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



金屬屋頂防火層施作

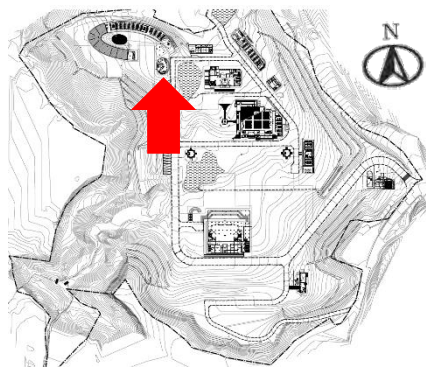


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

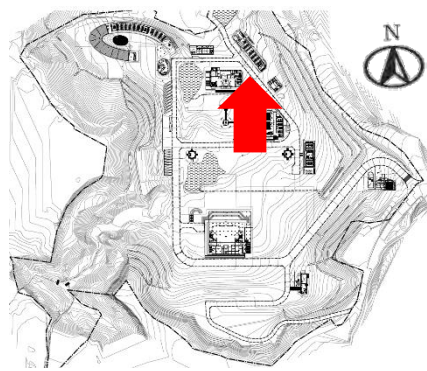


金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片




男義工

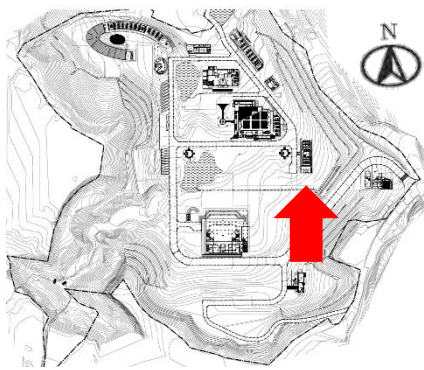

金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線



男常住

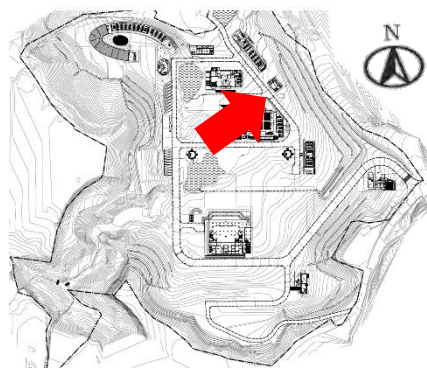

金屬屋頂防火層施作
1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯、戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



司機休息室



金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

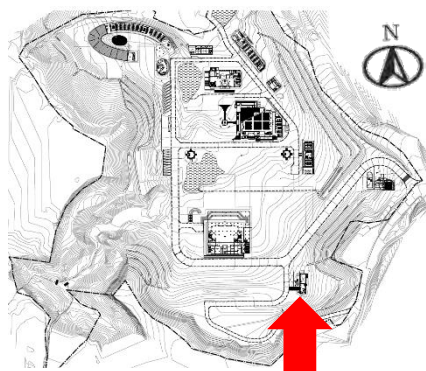

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



高版區水箱鋼筋模板水電
低版區3F柱牆鋼筋模板水電
戶外廣場獨立基腳柱施作

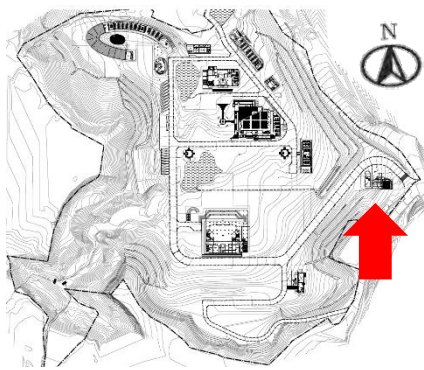

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鐘樓



鋼構屋頂吊裝

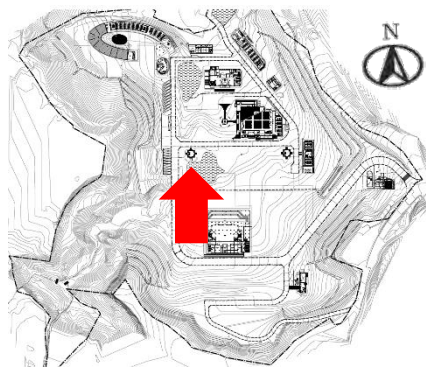

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



鼓樓



鋼構屋頂待吊裝

