

# 工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月10日
施工工期	1170日曆天+展延工期8天
累計工期	980日曆天（截至115年03月26日）
剩餘工期	198日曆天
預定進度(115.03.26)	58.72%
實際進度(115.03.26)	58.09%
本週進度(超前/落後)	0.63%

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理




2026/03/06

全區空拍照片

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外2。

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片

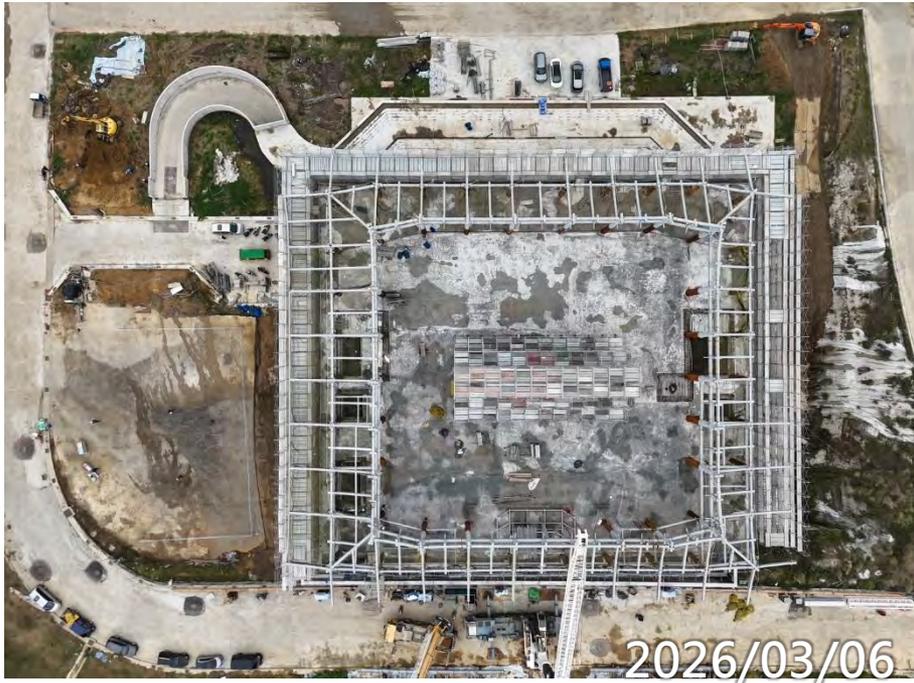

主殿



鋼構屋頂吊裝前置  
B2F-B1F泥作、油漆、鐵捲門施  
作

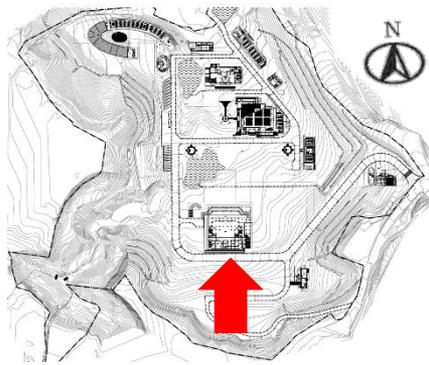


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片




齋堂

金屬屋頂防火層施作  
1F-4F泥作、輕隔間、油漆、戶外欄杆墩座、鐵捲門、鋁窗、金屬門施作  
RF屋頂防水施作  
機電配管拉線

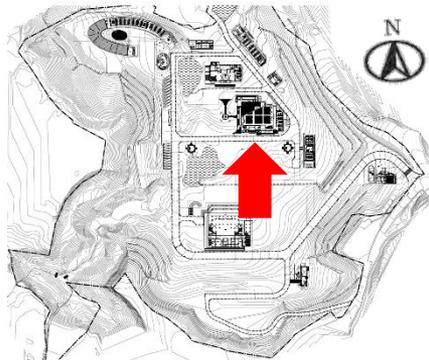


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片

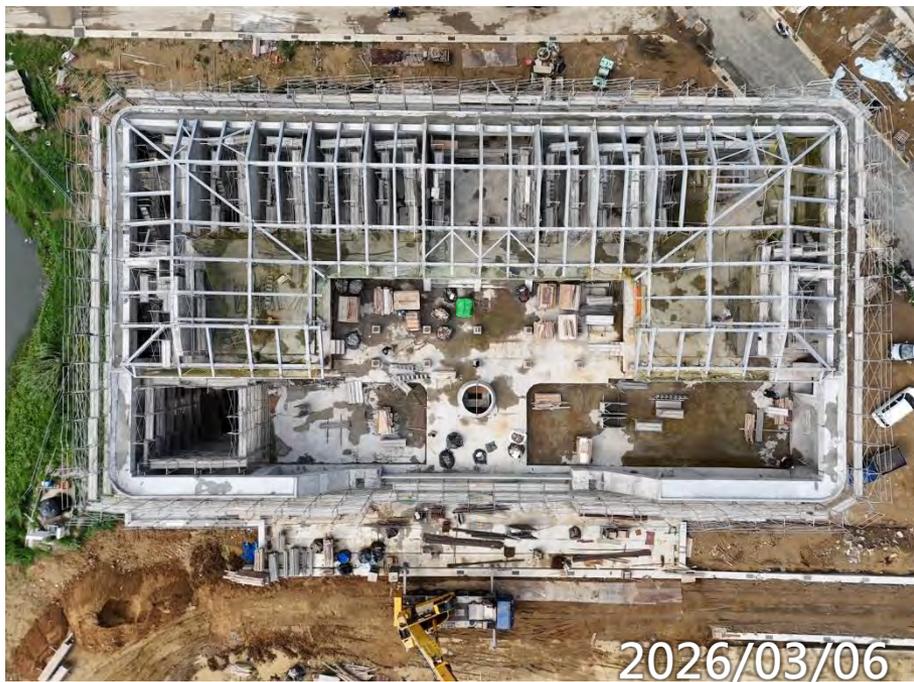

玄文

金屬屋頂防火層施作  
B1F-2F泥作、油漆施作

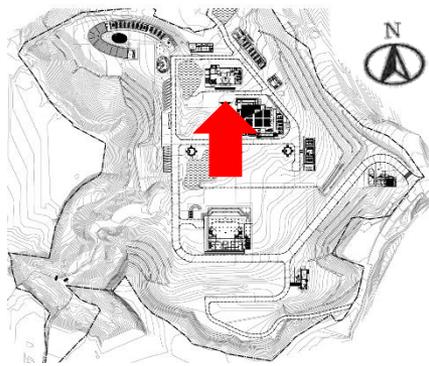


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



女寮

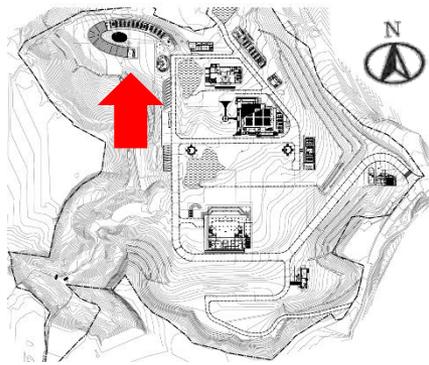

金屬屋頂防火層施作  
B1F-4F泥作、輕隔間、油漆、  
鋁窗、金屬門、電梯施作  
1F-4F戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



女常住

金屬屋頂防火層施作  
1F-2F泥作、輕隔間、油漆、  
鋁窗、金屬門施作

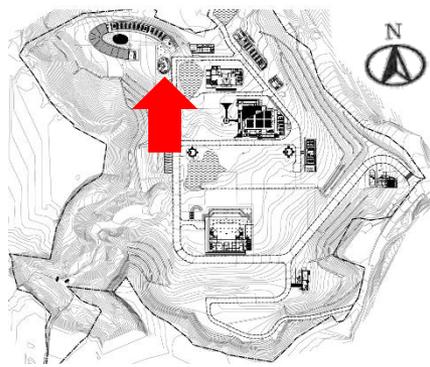


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

金屬屋頂防火層施作  
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、  
鋁窗、金屬門施作  
1F-3F戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線

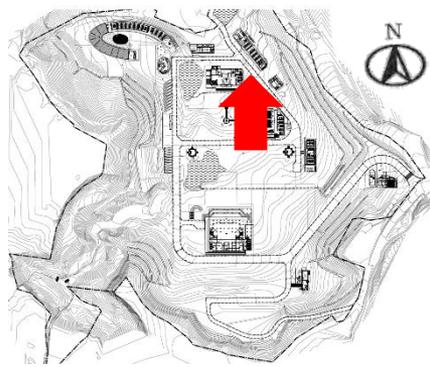


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



男義工

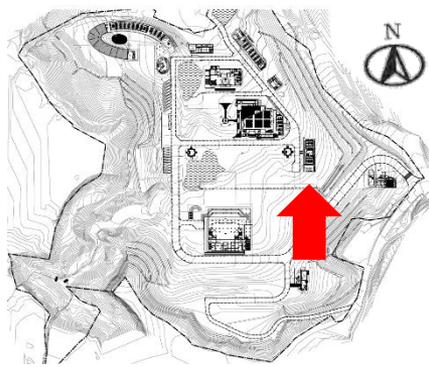

金屬屋頂防火層施作  
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作  
1F-3F戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



男常住


金屬屋頂防火層施作  
1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯、戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線

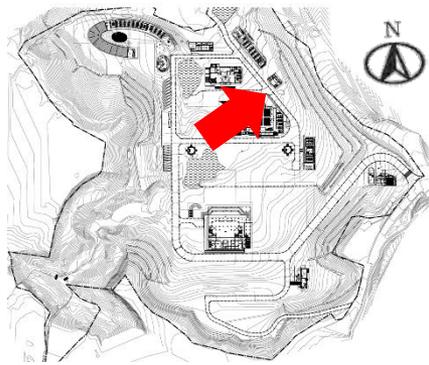



司機休息室

金屬屋頂防火層施作  
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作  
1F-3F戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線

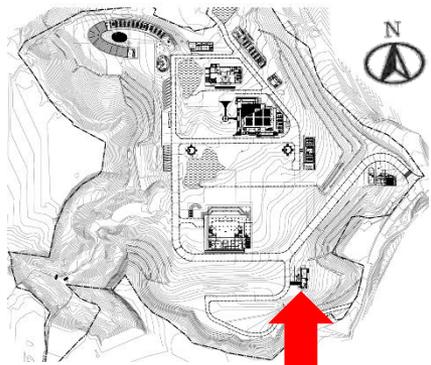

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



傳達室



高版區水箱鋼筋模板水電  
低版區RF梁澆置  
戶外廣場鋪面、樓梯施作

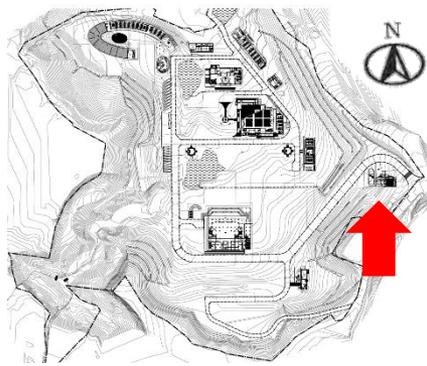




鐘樓



鋼構屋頂電銲校正

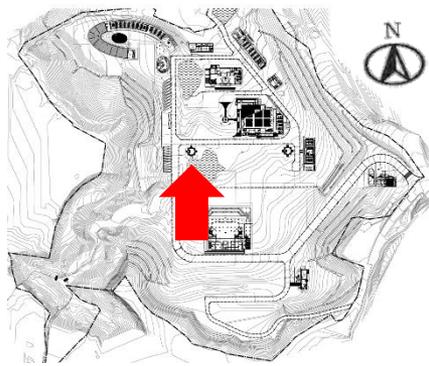




鼓樓



鋼構屋頂電銲校正

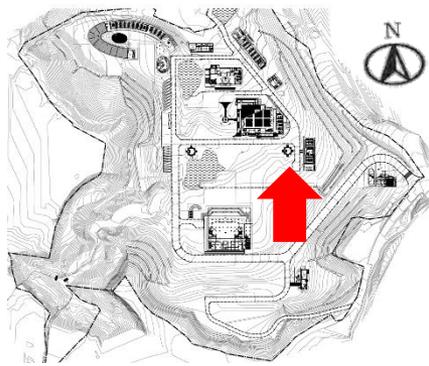



全區空拍照片

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



鋼構屋頂吊裝  
B2F-1F泥作、油漆、鐵捲門施作  
東、西向土方回填

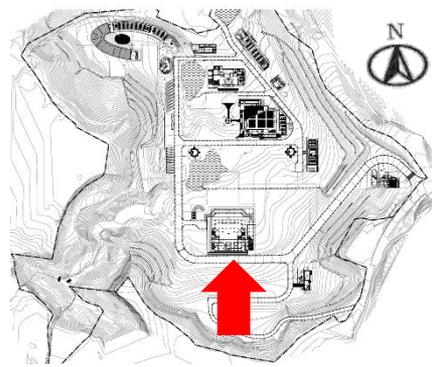


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



齋堂

金屬屋頂防火層施作  
1F-4F泥作、輕隔間、油漆、戶外欄杆墩座、鐵捲門、鋁窗、金屬門施作  
RF屋頂防水施作  
機電配管拉線

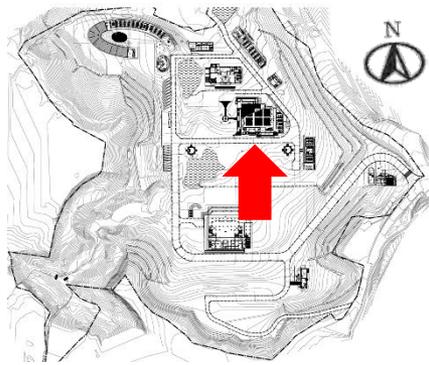


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



玄文

鋼構屋頂電銲校正  
B1F-1F泥作、油漆施作  
屋頂防水施作

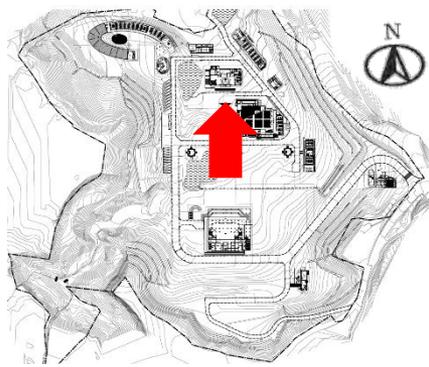


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

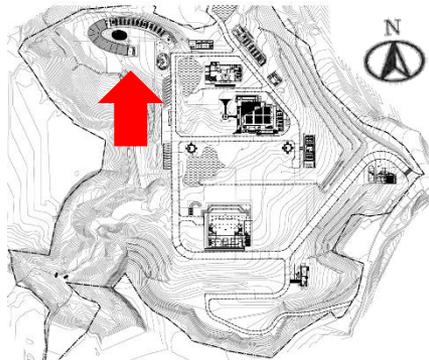

金屬屋頂防火層施作  
B1F-4F泥作、輕隔間、油漆、  
鋁窗、金屬門、電梯施作  
1F-4F戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



女常住

金屬屋頂防火層施作  
1F-2F泥作、輕隔間、油漆、  
鋁窗、金屬門施作

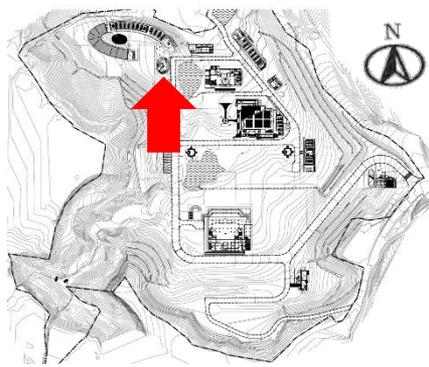

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



男寮




金屬屋頂防火層施作  
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、  
鋁窗、金屬門施作  
1F-3F造型遮陽板施作  
機電配管拉線

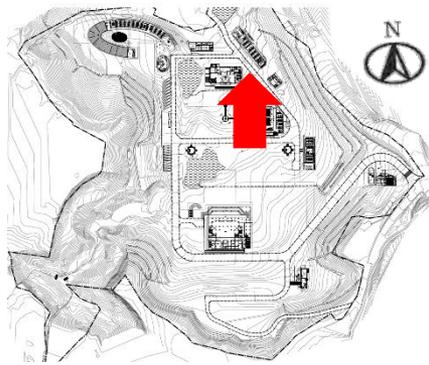



男義工

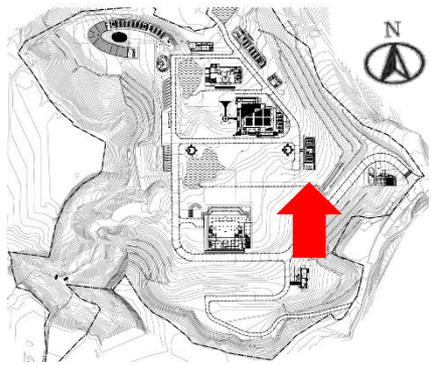


- 金屬屋頂面層施作
- B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作
- 1F-3F造型遮陽板施作
- 3F金屬三明治版施作
- 機電配管拉線



男常住


金屬屋頂面層施作  
1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯、造型遮陽板施作  
機電配管拉線

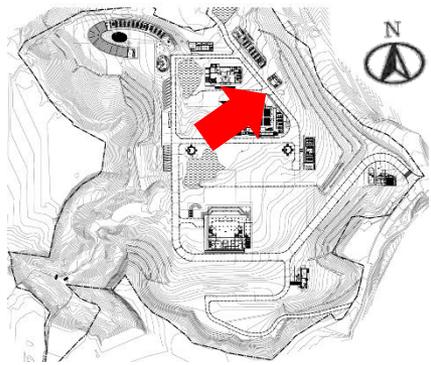



司機休息室

金屬屋頂面層施作  
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作  
1F-3F戶外欄杆預埋施作  
機電配管拉線

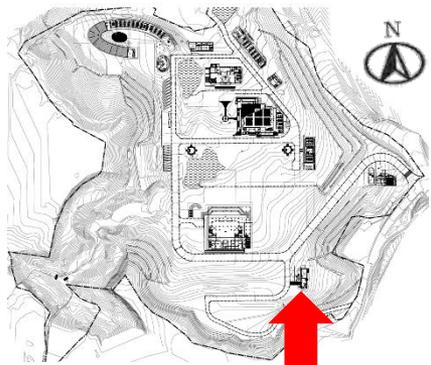


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



傳達室

高版區頂版鋼筋模板水電  
戶外景觀樓梯施作

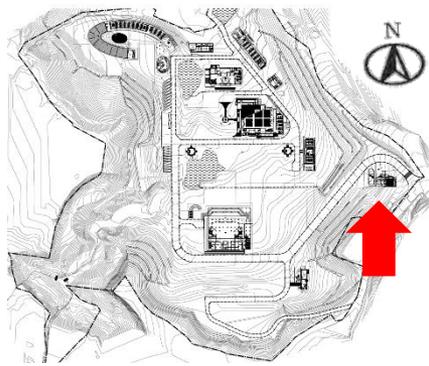




鐘樓



鋼構屋頂電銲校正  
1F泥作

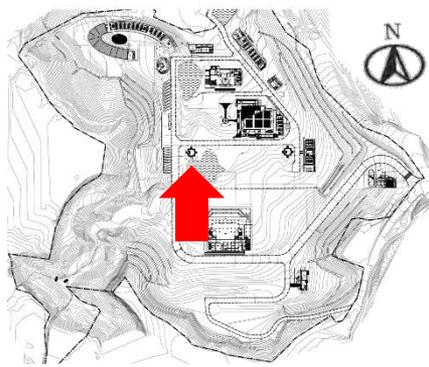

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



鼓樓

鋼構屋頂電銲校正  
1F泥作

