

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	116年06月12日
施工工期	1170日曆天+展延工期253日曆天
累計工期	1008日曆天（截至115年04月23日）
剩餘工期	415日曆天
預定進度(115.04.23)	60.39%
實際進度(115.04.23)	60.29%
本週進度(超前/落後)	0.10%

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理




全區空拍照片

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對揭2。

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片

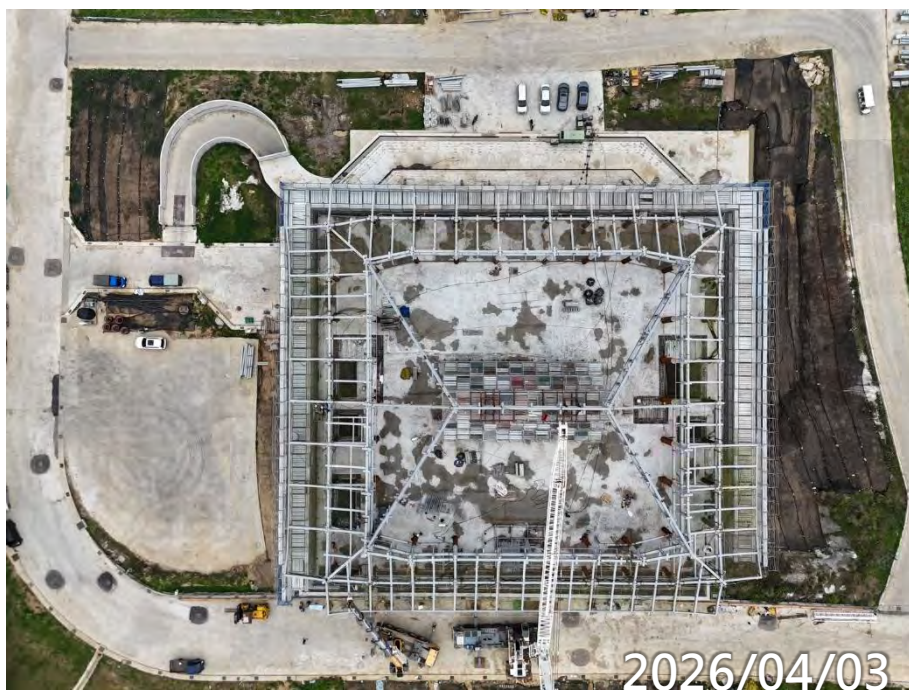

主殿



鋼構屋頂吊裝
B2F-1F泥作、油漆、鐵捲門施作
東、西向土方回填

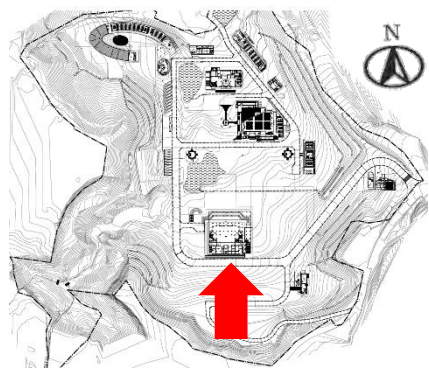


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片




齋堂

金屬屋頂防火層施作
1F-4F泥作、輕隔間、油漆、戶外欄杆墩座、鐵捲門、鋁窗、金屬門施作
RF屋頂防水施作
機電配管拉線

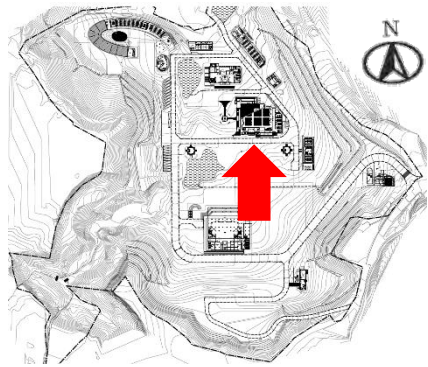


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

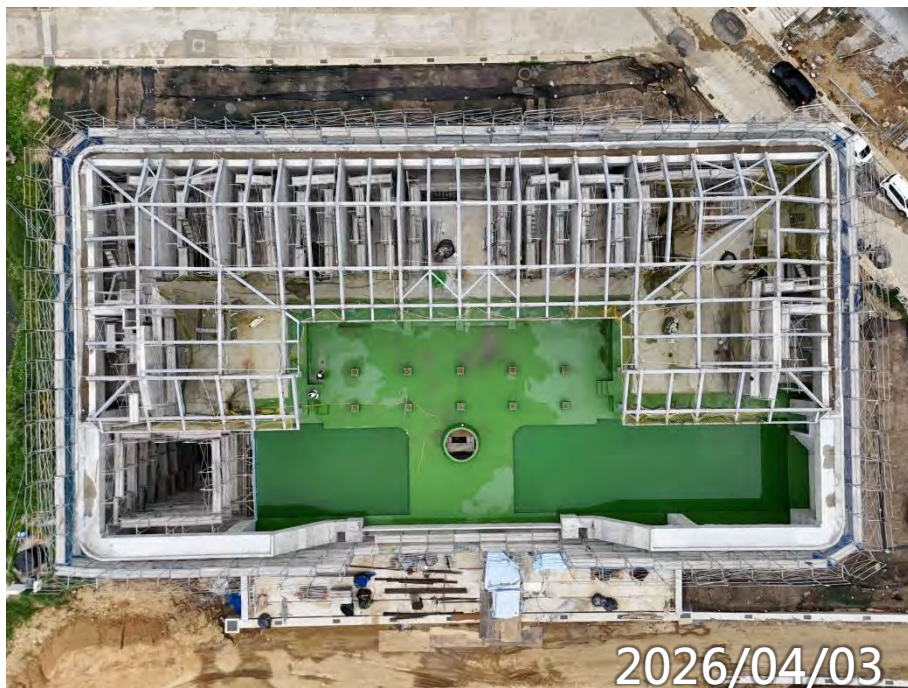

玄文

鋼構屋頂電銲校正
B1F-1F泥作、油漆施作
屋頂防水施作

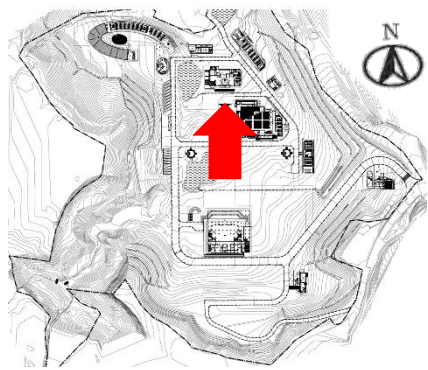


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

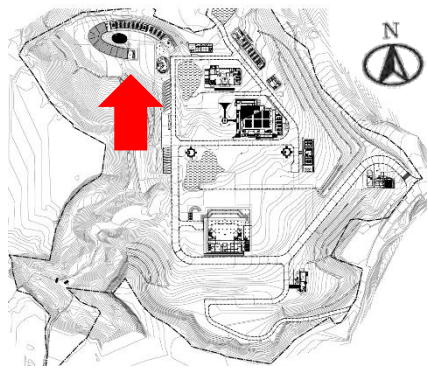

金屬屋頂防火層施作
B1F-4F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-4F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女常住

金屬屋頂防火層施作
1F-2F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作

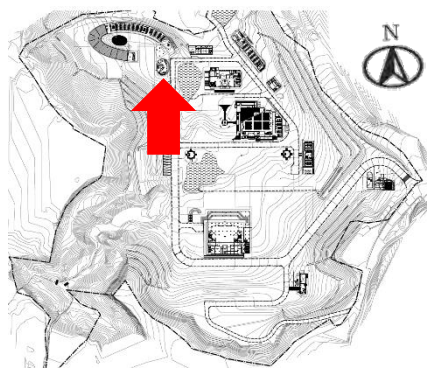


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作
1F-3F造型遮陽板施作
機電配管拉線

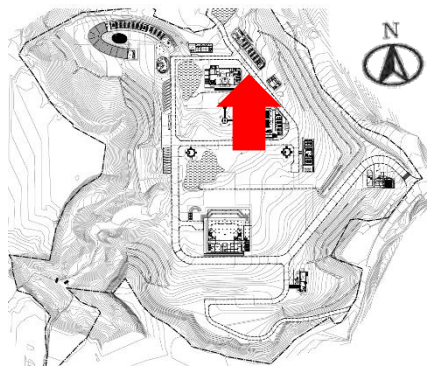


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男義工

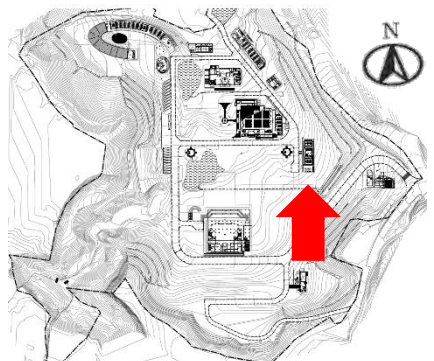


金屬屋頂面層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-3F造型遮陽板施作
3F金屬三明治版施作
機電配管拉線



男常住



金屬屋頂面層施作
1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯、造型遮陽板施作
機電配管拉線

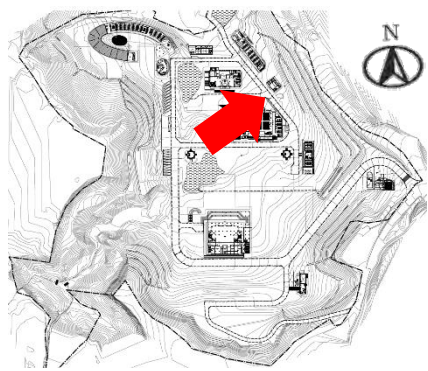




司機休息室



金屬屋頂面層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

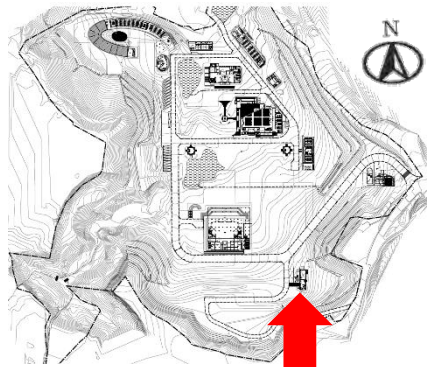

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



高版區頂版澆置
戶外景觀樓梯澆置

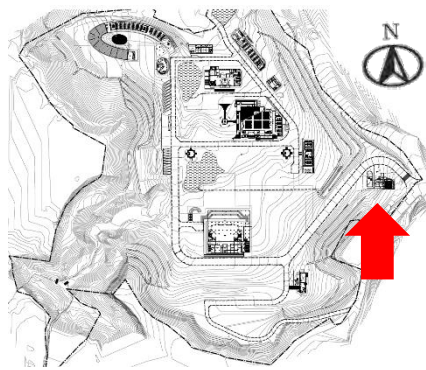




鐘樓



鋼構屋頂電銲校正
1F泥作

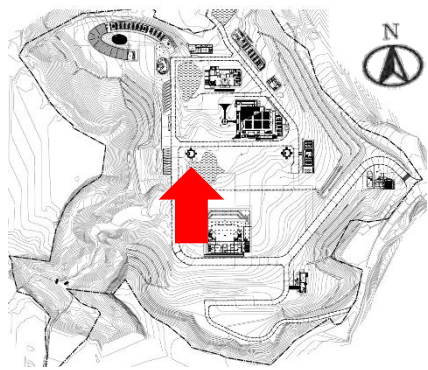




鼓樓



鋼構屋頂電銲校正
1F泥作

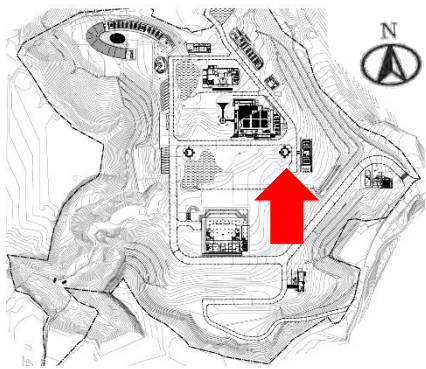

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理



全區空拍照片

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿




鋼構屋頂吊裝
B2F-1F泥作、油漆、鐵捲門施作
東、造型柱組模灌漿

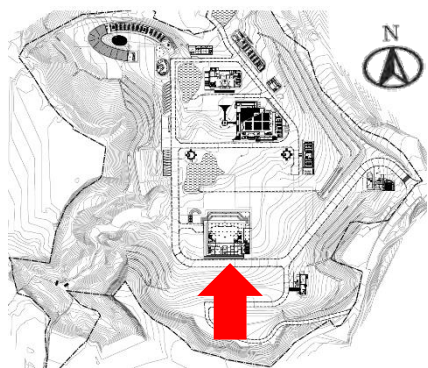



齋堂

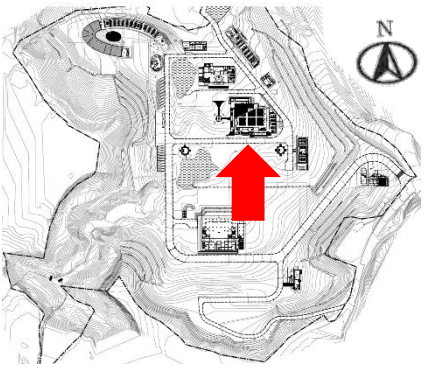

- 金屬屋頂防火層施作
- 1F-4F泥作、輕隔間、油漆、戶外欄杆墩座、鐵捲門、鋁窗、金屬門施作
- RF屋頂防水施作
- 機電配管拉線


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



玄文

金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作、油漆施作
屋頂防水施作

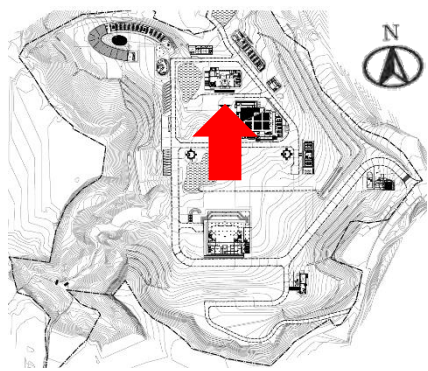


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

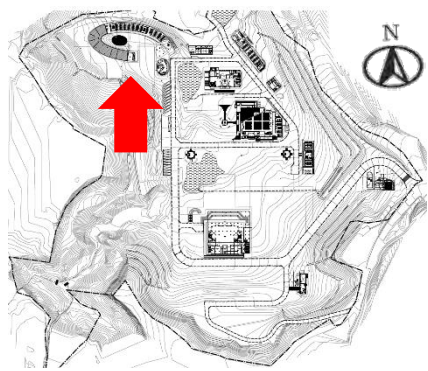

金屬屋頂防火層施作
B1F-4F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-4F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女常住

金屬屋頂防火層施作
1F-2F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作

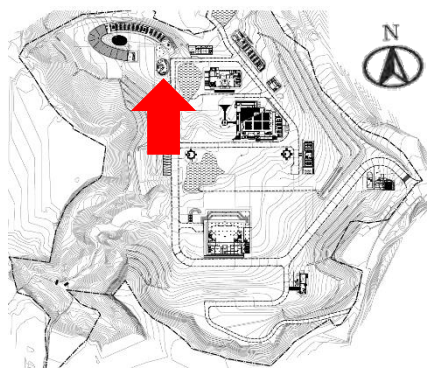


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片




男寮

金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作
1F-3F造型遮陽板施作
機電配管拉線

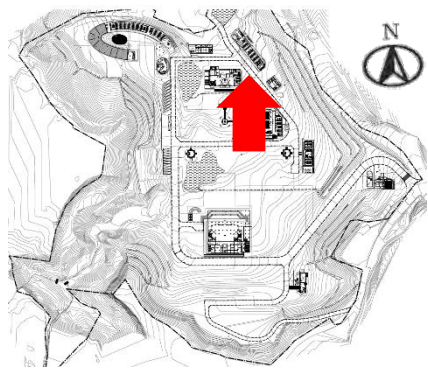



男義工

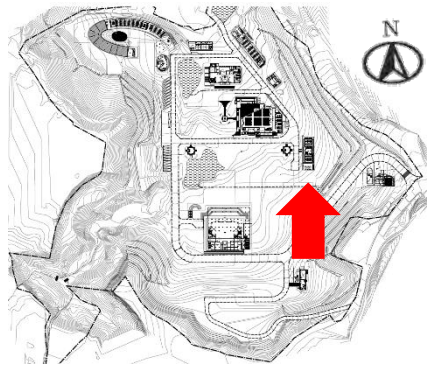


金屬屋頂面層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-3F造型遮陽板施作
3F金屬三明治版施作
機電配管拉線



男常住




金屬屋頂面層施作
1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯、造型遮陽板施作
機電配管拉線

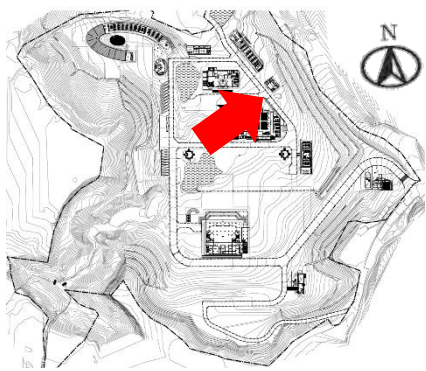



司機休息室

金屬屋頂面層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

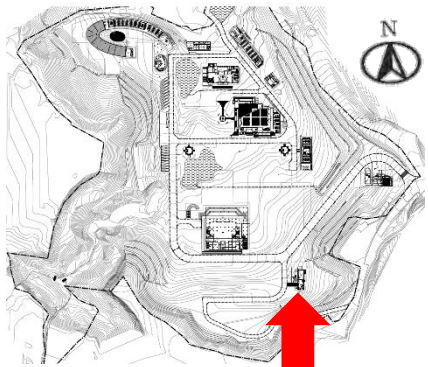

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



1F-2F泥作、戶外欄杆預埋施作

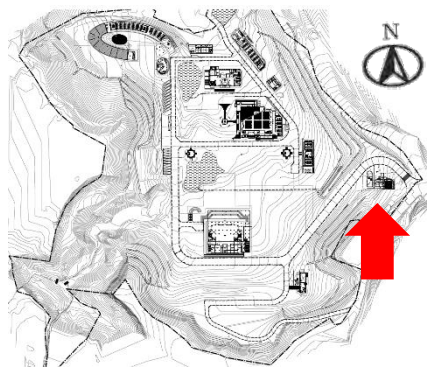




鐘樓



鋼構屋頂電鍍校正
1F泥作

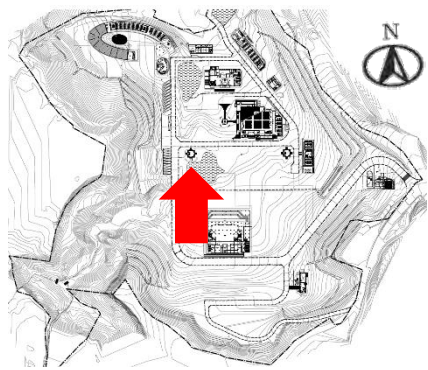




鼓樓



鋼構屋頂電銲校正
1F泥作

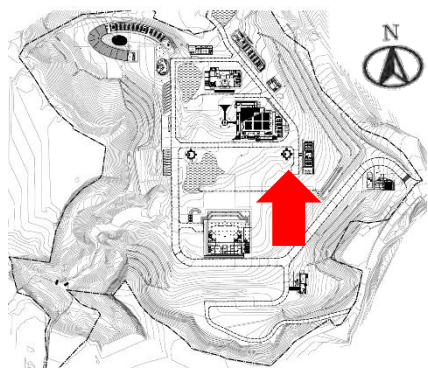



山門



基礎版鋼筋綁紮

