

# 工程成本進度

| 工程名稱                 | 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案       |
|----------------------|----------------------|
| 開工日期                 | 112年07月21日           |
| 預定完工日期               | 115年10月09日           |
| 施工工期                 | 1170日曆天+展延工期7天       |
| 累計工期                 | 770日曆天（截至114年08月28日） |
| 剩餘工期                 | 407日曆天               |
| 預定進度(114.08.28)      | 43.28%               |
| 實際進度(114.08.28)      | 43.05%               |
| 本週進度(超前/ <u>落後</u> ) | 0.23%                |



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



主殿



鋼構第二節柱吊裝  
車道頂版聚脲防水施作

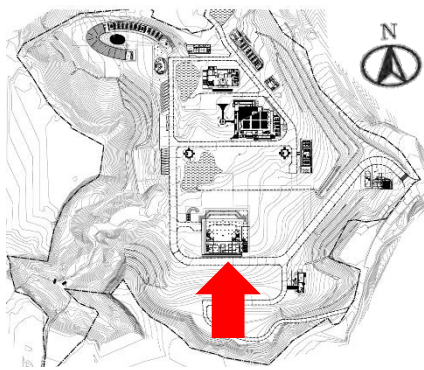


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



齋堂

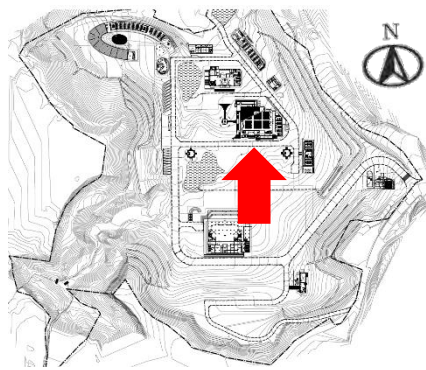

1F油漆平頂批土  
1F輕隔間放樣  
1F泥作打底粉光  
機電配管拉線

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



玄文



2F柱牆鋼筋模板施作  
1F景觀梯施作  
B1F泥作打底

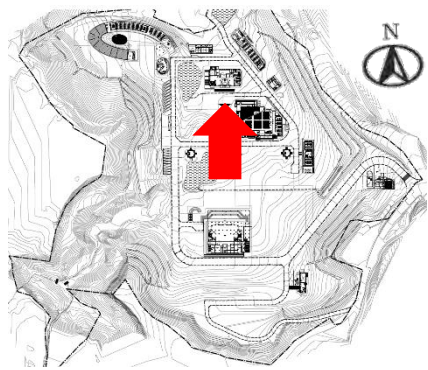


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



女寮

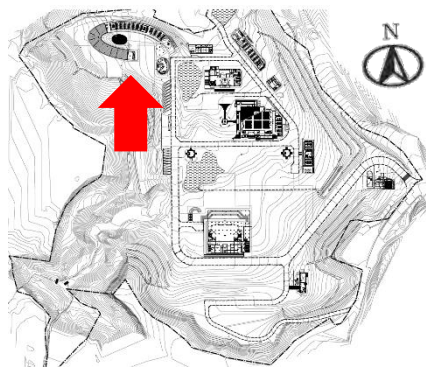

B1F-3F泥作打底粉光  
B1F-4F輕隔間放樣  
B1F-2F油漆平頂批土  
屋頂鋼構吊裝  
機電配管拉線

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



女常住



2F梁版模板施作

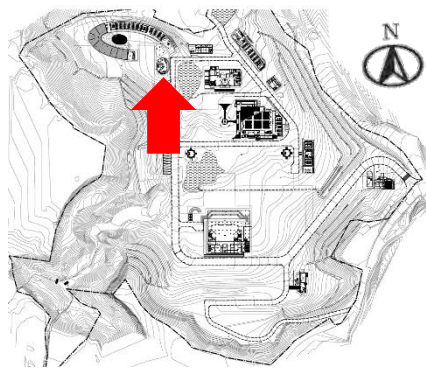


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



男寮

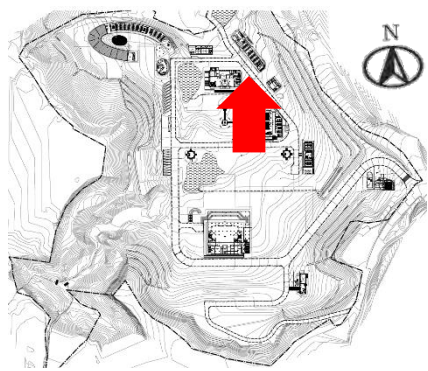

3F柱牆鋼筋模板水電  
屋頂鋼構預埋  
B1F-1F泥作打底粉刷  
B1F輕隔間放樣  
B1F-1F油漆平頂批土  
機電配管拉線

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



男義工



金屬屋頂防火層施作  
B1F-2F泥作打底  
B1F-2F輕隔間放樣  
B1F-2F油漆平頂批土  
1F-3F鋁裝安裝嵌縫防水  
1F-3F金屬門分料安裝  
機電配管拉線

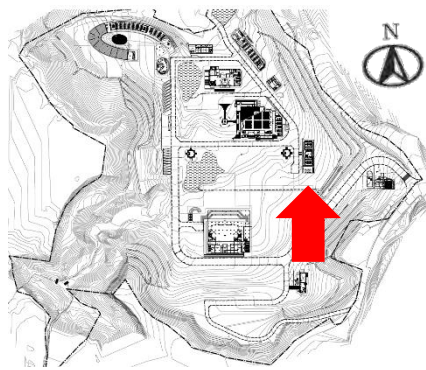

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



男常住



金屬屋頂防火層施作  
1F、2F泥作打底  
1F、2F輕隔間放樣  
1F、2F油漆平頂批土  
1F-3F鋁裝安裝嵌縫防水  
1F-3F金屬門分料安裝  
機電配管拉線

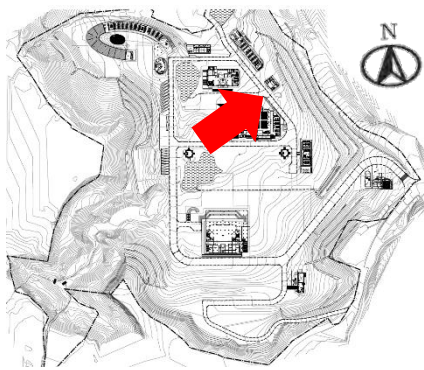

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



司機休息室



金屬屋頂防火層施作  
B1F-2F泥作打底  
B1F-2F輕隔間放樣  
機電配管拉線

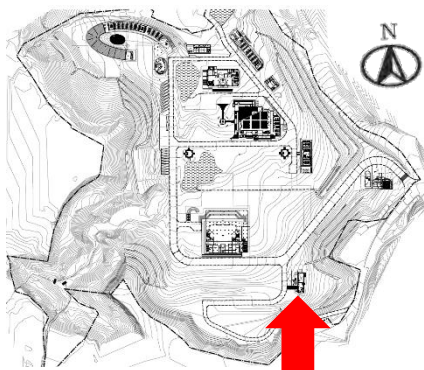

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



傳達室



高版區3F柱牆鋼筋模板水電  
外牆聚脲防水施作

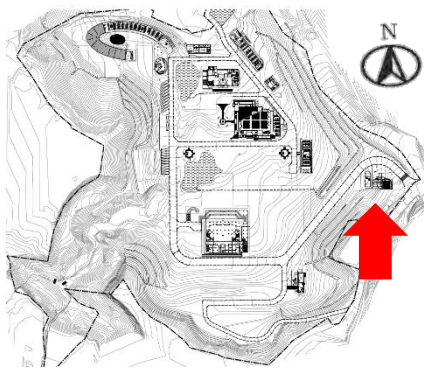

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



鐘樓



鋼構屋頂待吊裝

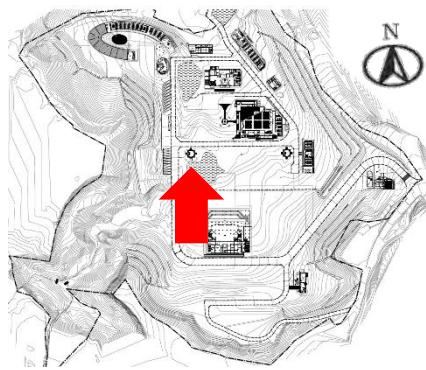

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



鼓樓



1F樓梯鋼筋模板施作

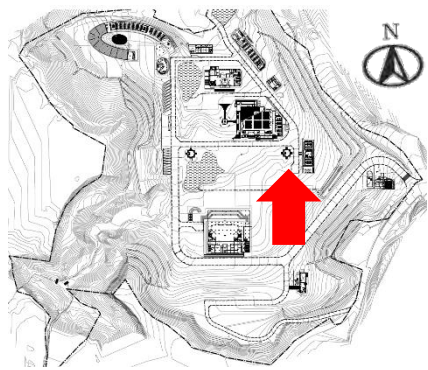



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



主殿



鋼構3F桁架吊裝

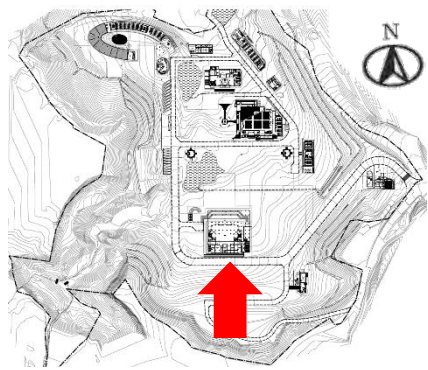


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



齋堂

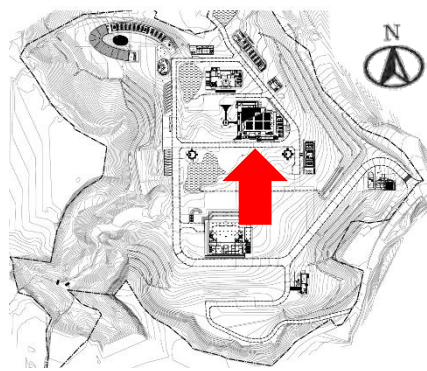

1F油漆平頂批土  
1F輕隔間放樣  
1F-2F泥作打底粉光  
機電配管拉線

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



玄文



3F梁版鋼筋模板施作  
B1F泥作打底

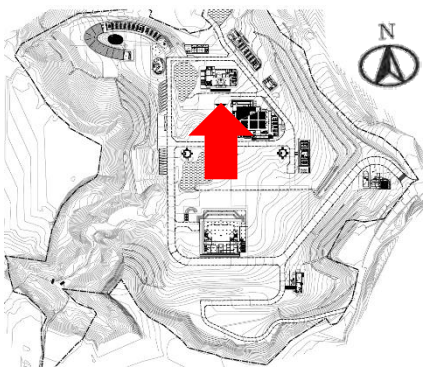


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



女寮

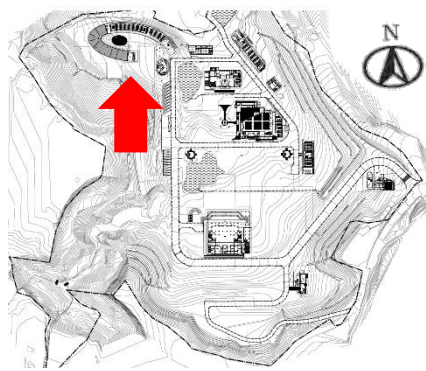

B1F-3F泥作打底粉光  
B1F-4F輕隔間施作  
B1F-2F油漆平頂批土  
1F-3F鋁窗、金屬門安裝  
屋頂鋼構吊裝  
機電配管拉線

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



女常住



2F梁版鋼筋模板水電施作

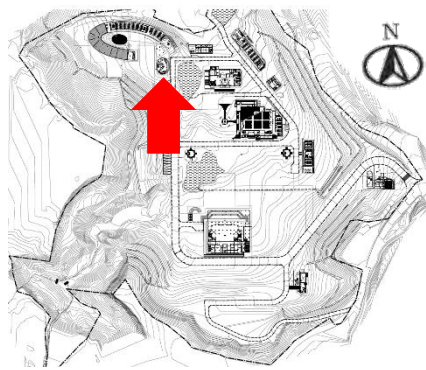


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



男寮

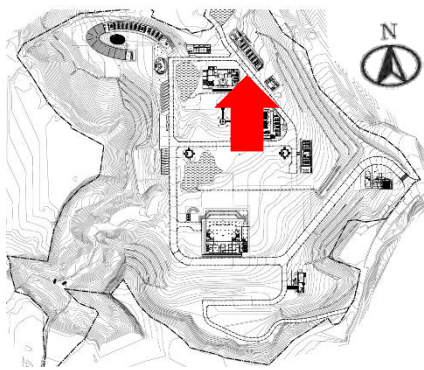

B1F-1F泥作打底粉刷  
B1F輕隔間施作  
B1F-1F油漆平頂批土  
1F-2F鋁窗金屬門安裝  
機電配管拉線

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



男義工



金屬屋頂防火層施作  
B1F-2F泥作打底  
B1F-2F輕隔間施作  
B1F-2F油漆平頂批土  
1F-3F戶外欄杆施作  
1F-3F金屬門安裝

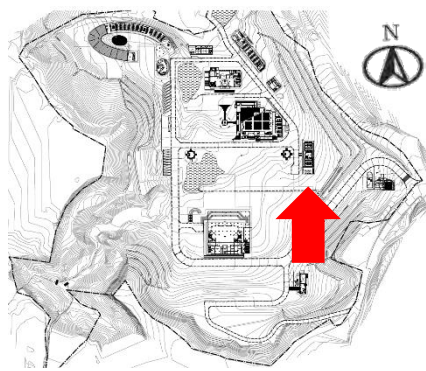


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



男常住

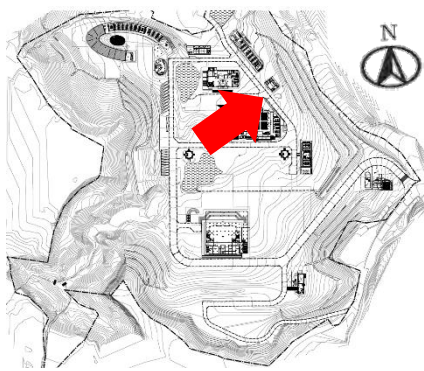

金屬屋頂防火層施作  
1F、2F泥作打底  
1F、2F輕隔間施作  
1F、2F油漆平頂批土  
1F-3F鋁裝安裝嵌縫防水  
1F-3F戶外欄杆施作  
機電配管拉線

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



司機休息室



金屬屋頂防火層施作  
B1F-2F泥作打底  
B1F-2F輕隔間放樣  
機電配管拉線

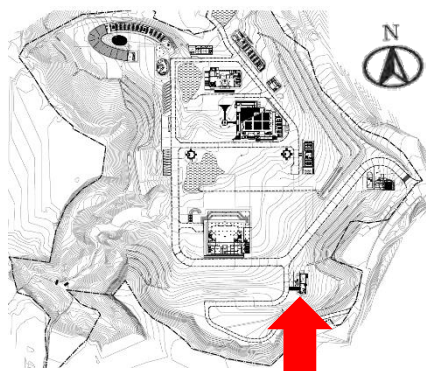

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



傳達室



高版區RF梁版鋼筋模板水電  
低版區土方開挖、五大管路引進

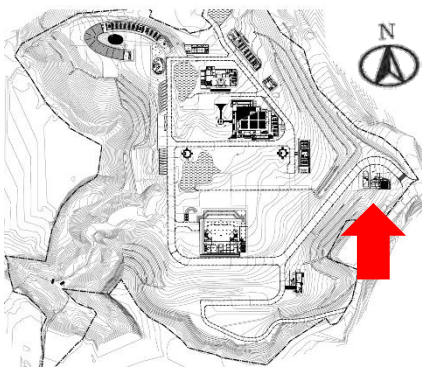

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



鐘樓



鋼構屋頂待吊裝

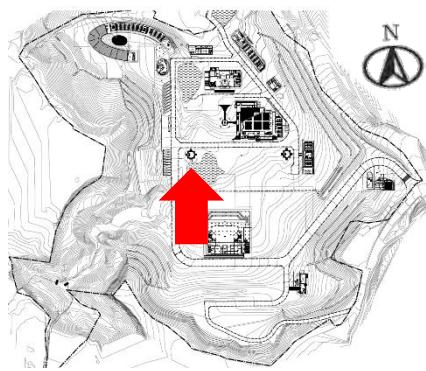

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



鼓樓



2F梁版鋼筋模板施作  
木欄杆基座預埋

