

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月09日
施工工期	1170日曆天+展延工期7天
累計工期	798日曆天（截至114年09月25日）
剩餘工期	379日曆天
預定進度(114.09.25)	46.25%
實際進度(114.09.25)	46.08%
本週進度(超前/ <u>落後</u>)	0.17%

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理




全區空拍照片

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外2。

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片

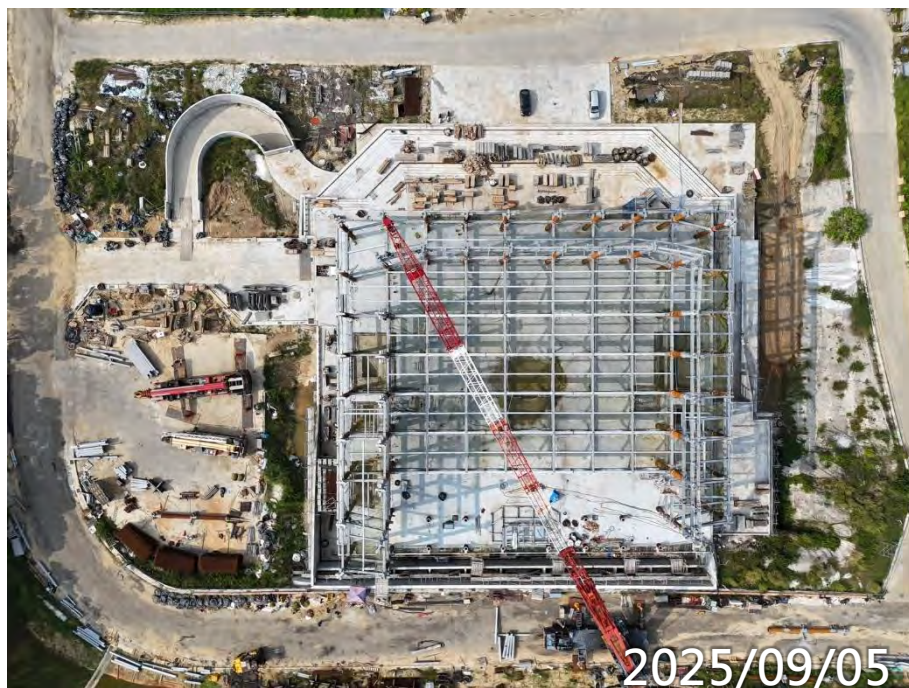

主殿



鋼構3F梁吊裝

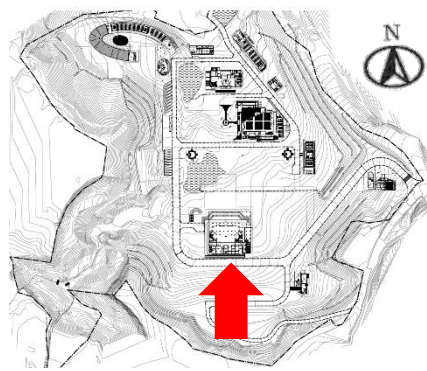


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片




齋堂

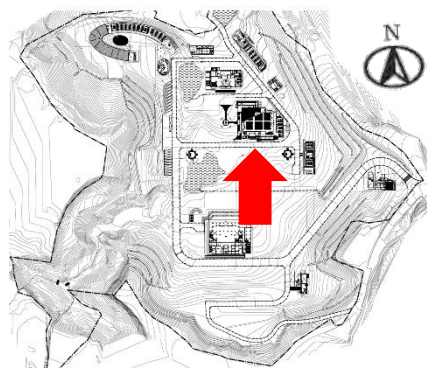

1F油漆平頂批土
1F輕隔間放樣
1F-2F泥作打底粉光
機電配管拉線


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

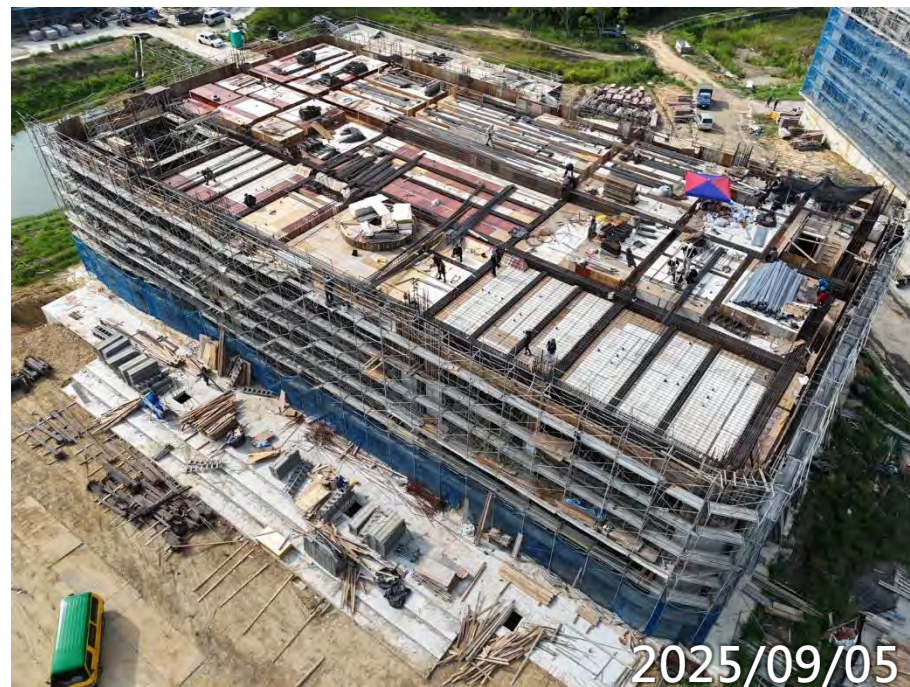

玄文

3F梁版鋼筋模板施作
B1F泥作打底

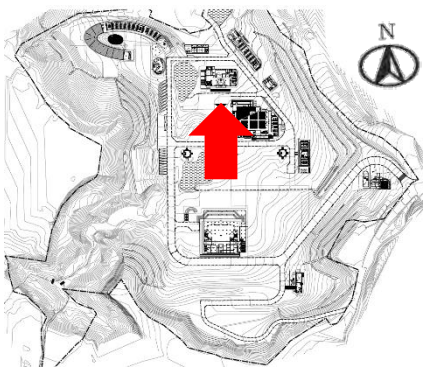


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

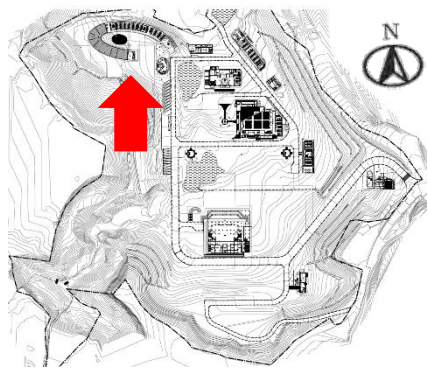

B1F-3F泥作打底粉光
B1F-4F輕隔間施作
B1F-2F油漆平頂批土
1F-3F鋁窗、金屬門安裝
屋頂鋼構吊裝
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



2F梁版澆置

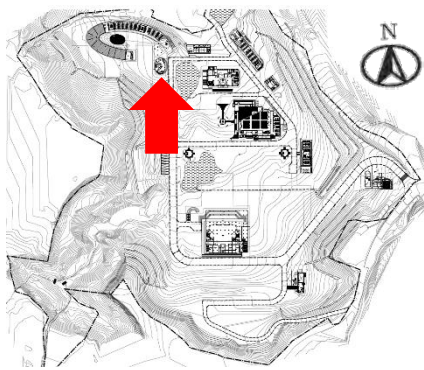


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

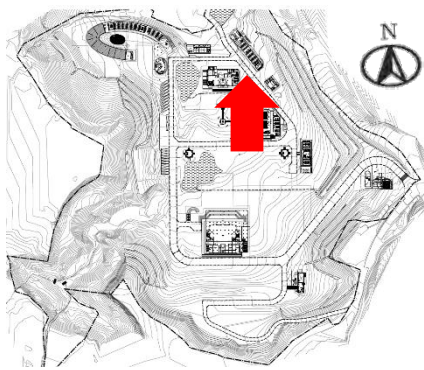

B1F-1F泥作打底粉刷
B1F輕隔間施作
B1F-1F油漆平頂批土
1F-2F鋁窗金屬門安裝
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男義工



金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作打底
B1F-2F輕隔間施作
B1F-2F油漆平頂批土
1F-3F戶外欄杆施作
1F-3F金屬門安裝

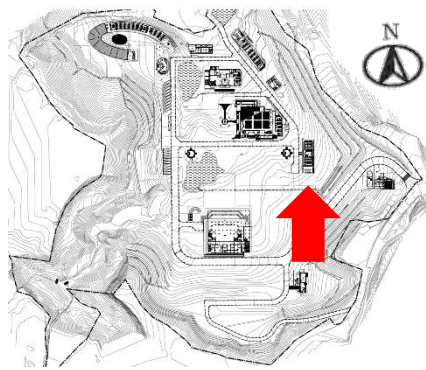

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男常住



- 金屬屋頂防火層施作
- 1F、2F泥作打底
- 1F、2F輕隔間施作
- 1F、2F油漆平頂批土
- 1F-3F鋁裝安裝嵌縫防水
- 1F-3F戶外欄杆施作
- 機電配管拉線

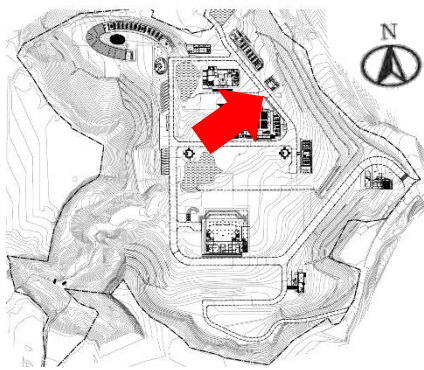

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



司機休息室



金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作打底
B1F-2F輕隔間放樣
機電配管拉線

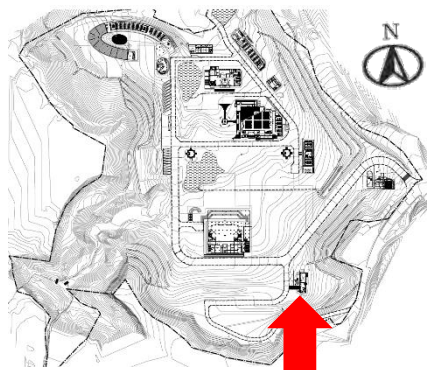

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



高版區RF梁版鋼筋模板水電
低版區基礎層鋼筋綁紮

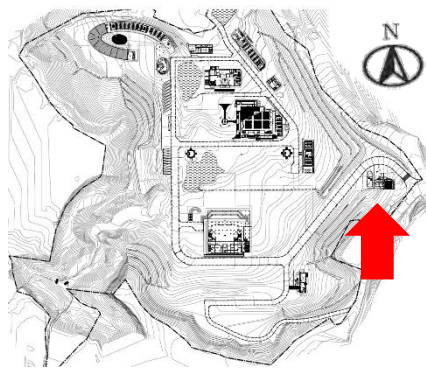

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鐘樓




鋼構屋頂待吊裝

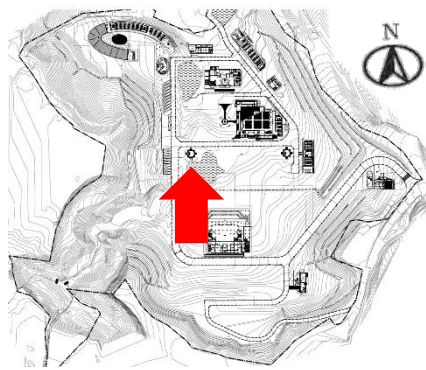

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片

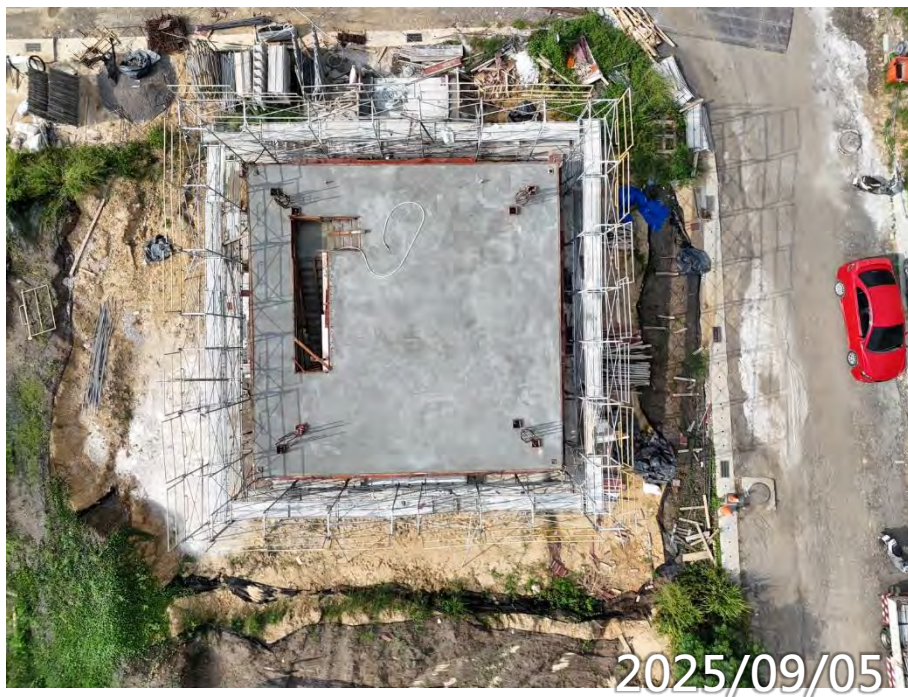

鼓樓



2F梁版澆置

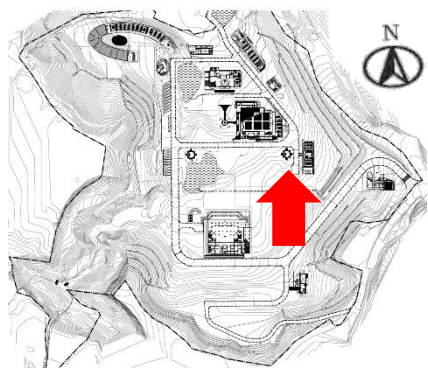

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



鋼構3F梁柱、下層屋簷吊裝
B2F-B1F泥作吊線
聚脲防水施作

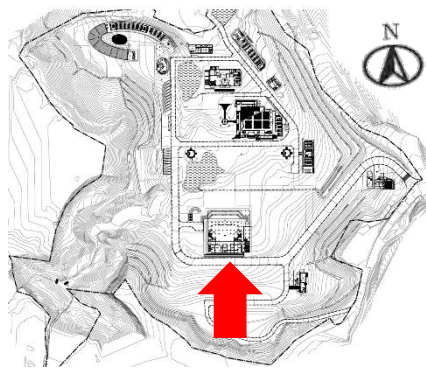

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



齋堂



1F-3F油漆平頂批土
1F-3F輕隔間施作
1F-3F泥作打底粉光
機電配管拉線

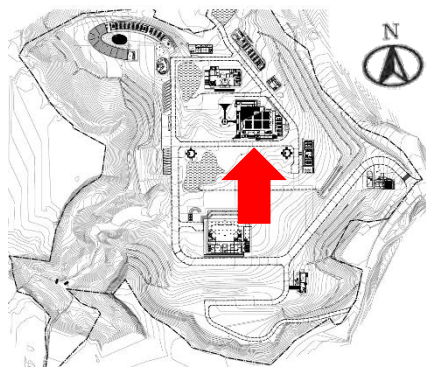

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



3F梁版澆置
B1F泥作打底

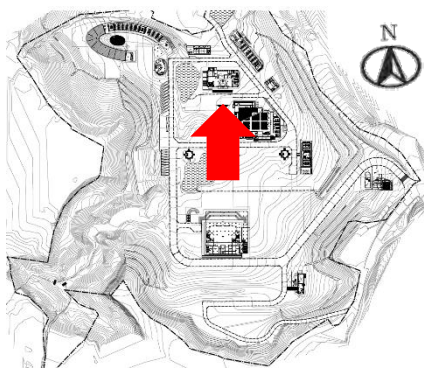


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

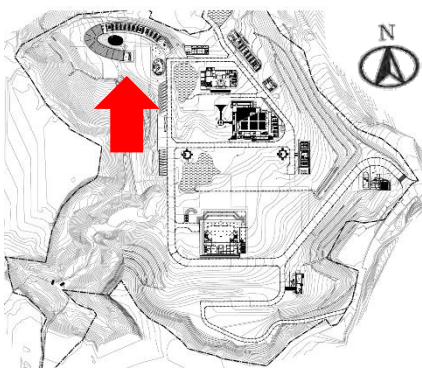

金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作打底粉光
B1F-4F輕隔間施作
B1F-3F油漆平頂批土
1F-3F鋁窗、金屬門安裝
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



2F柱澆置

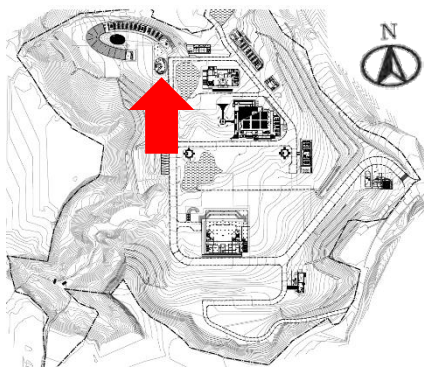


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

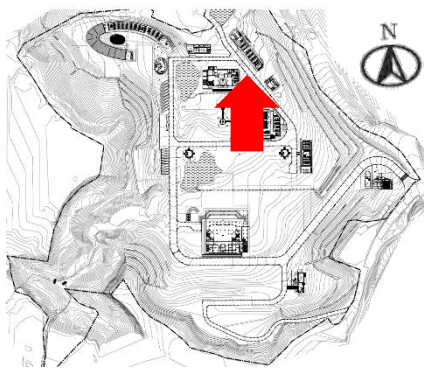

屋頂鋼構吊裝
B1F-2F泥作打底粉刷
B1F-2F輕隔間施作
B1F-2F油漆平頂批土
1F-3F鋁窗金屬門安裝
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男義工



金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作打底粉光
B1F-3F輕隔間施作
B1F-3F油漆施作
B1F-3F金屬門安裝
機電配管拉線

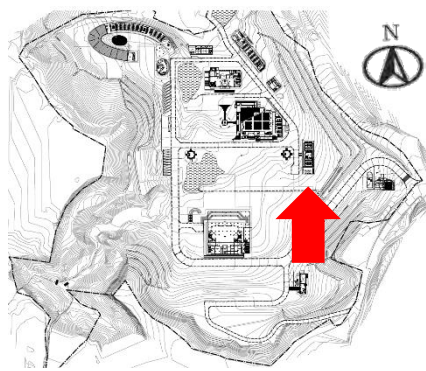


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男常住

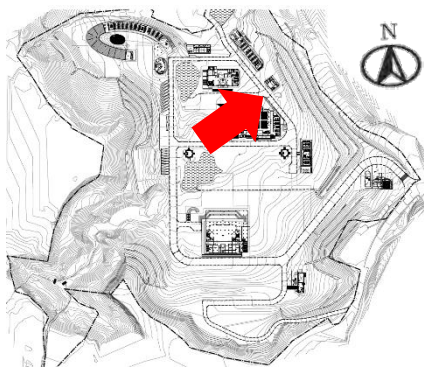

金屬屋頂防火層施作
1F-3F泥作打底粉光
1F-3F輕隔間施作
1F-3F油漆施作
1F-3F戶外欄杆施作
機電配管拉線


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



司機休息室

金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作打底粉光
B1F-2F輕隔間施作
B1F-2F油漆施作
1F-3F戶外欄杆施作
機電配管拉線

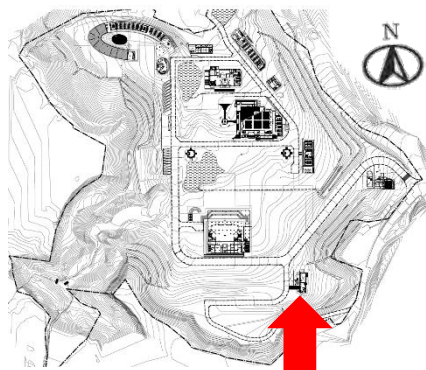

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



高版區RF梁版鋼筋模板水電
低版區基礎層澆置

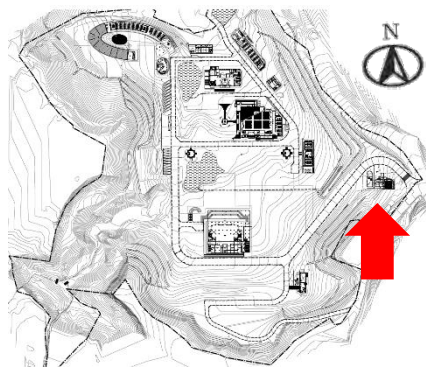

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鐘樓



鋼構屋頂待吊裝

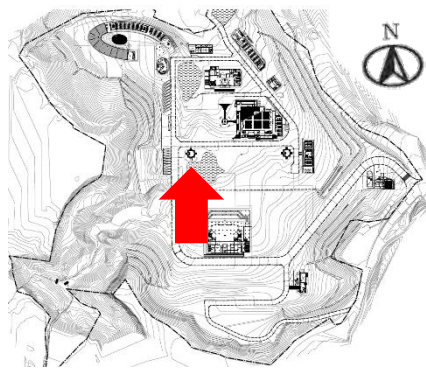

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



鼓樓



2F柱澆置

