

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月09日
施工工期	1170日曆天+展延工期7天
累計工期	854日曆天（截至114年11月20日）
剩餘工期	323日曆天
預定進度(114.11.20)	50.13%
實際進度(114.11.20)	49.84%
本週進度(超前/ <u>落後</u>)	0.29%

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理



全區空拍照片

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或外揭2。

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



鋼構3F梁柱、下層屋簷校正電銲
鋼承鈑吊料
B2F-B1F泥作吊線
筏基FRP施作

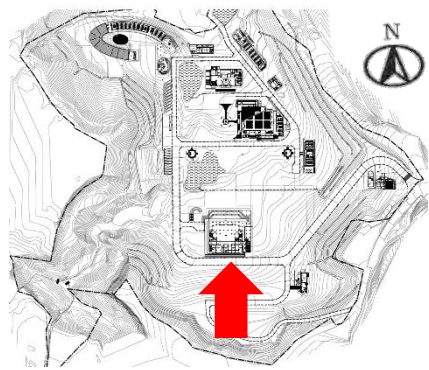

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



齋堂




屋頂鋼構吊裝

1F-3F泥作、輕隔間、油漆

筏基配管

機電配管拉線

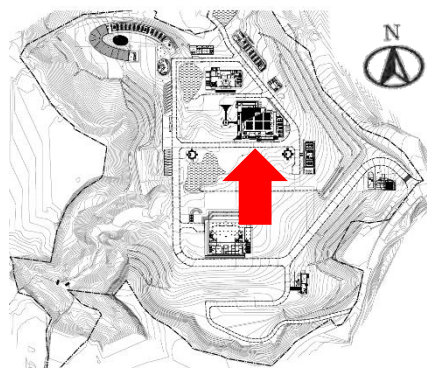


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



玄文

3F柱牆鋼筋模板水電施作
B1F泥作、油漆施作
筏基FRP施作

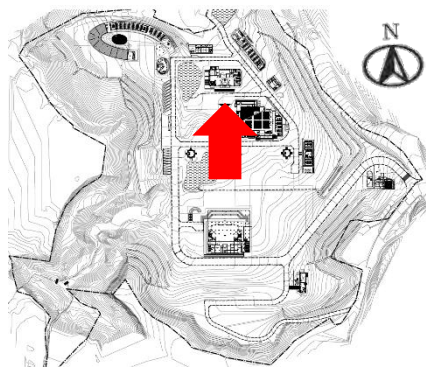


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

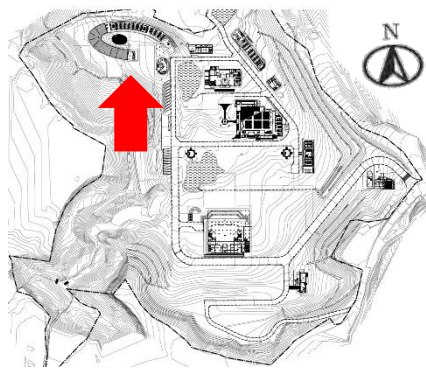

金屬屋頂防火層施作
B1F-4F泥作、輕隔間、油漆、
門窗施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



RF梁鋼筋模板水電施作
筏基配管

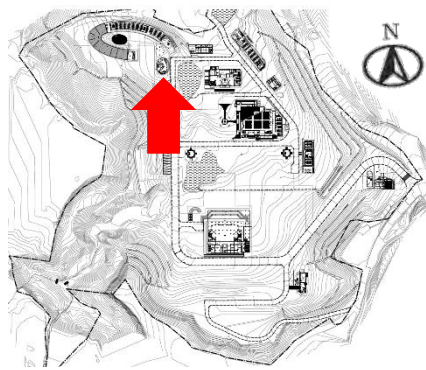


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

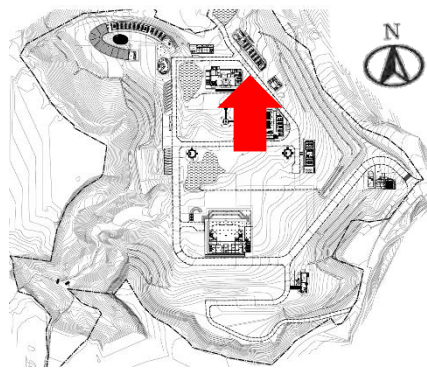

屋頂鋼構電銲校正


B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
門窗施作

1F-3F戶外欄杆預埋施作

機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片

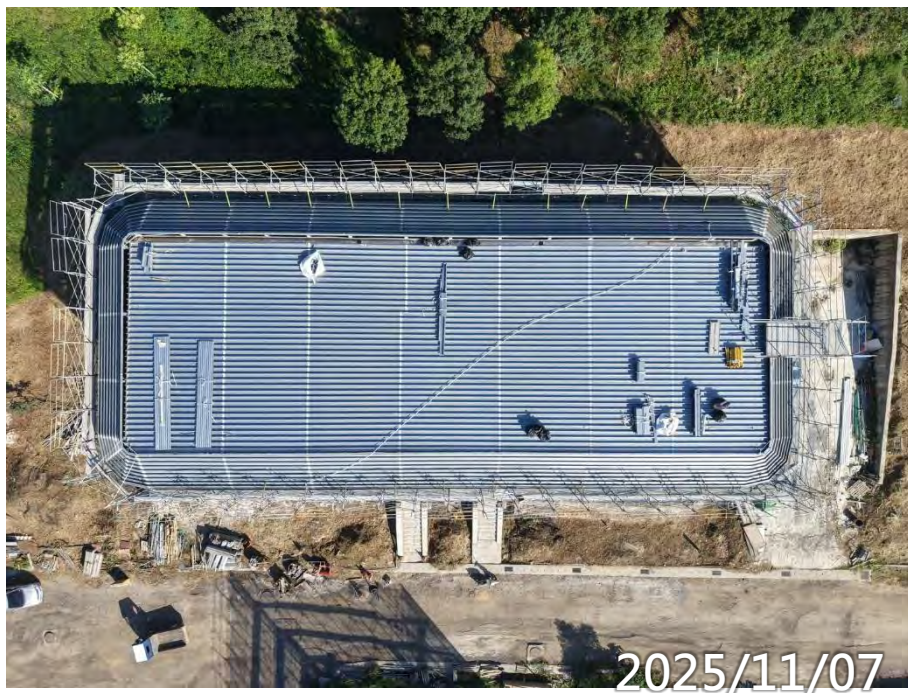

男義工



金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
門窗、電梯施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

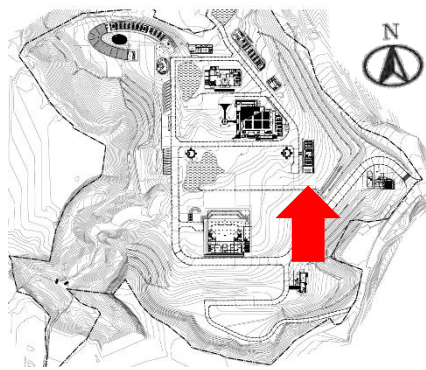

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男常住



金屬屋頂防火層施作
1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
門窗、電梯施作、戶外欄杆預埋
施作
機電配管拉線

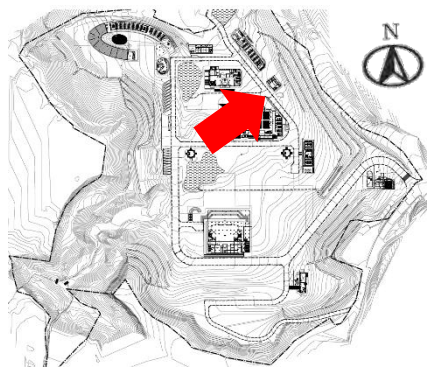


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



司機休息室

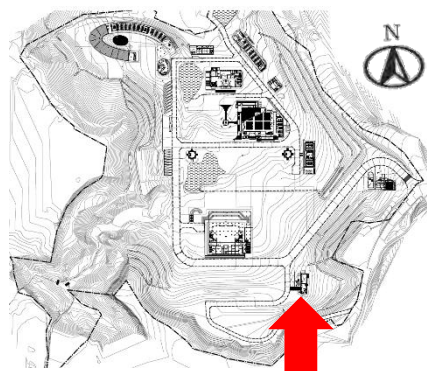

金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
門窗、電梯施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



高版區水箱鋼筋模板水電
低版區1F柱牆鋼筋模板水電

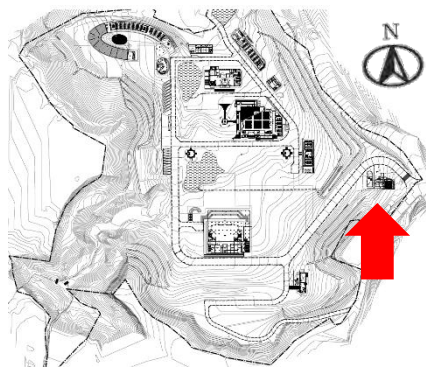

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鐘樓



鋼構屋頂待吊裝

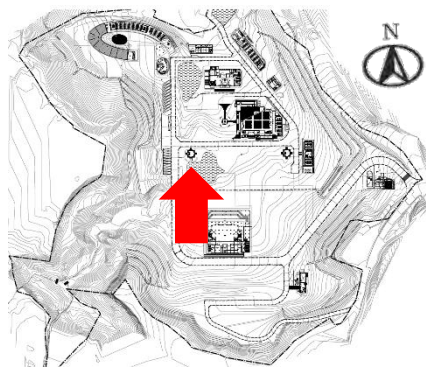

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鼓樓



鋼構屋頂待吊裝

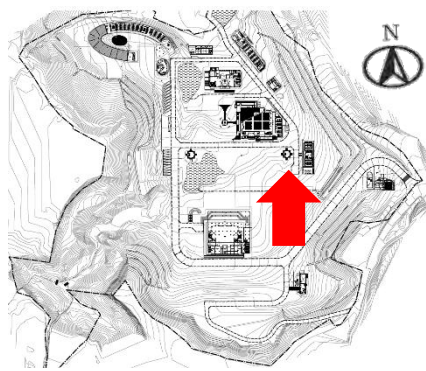

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理



全區空拍照片


機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對15。

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



主殿

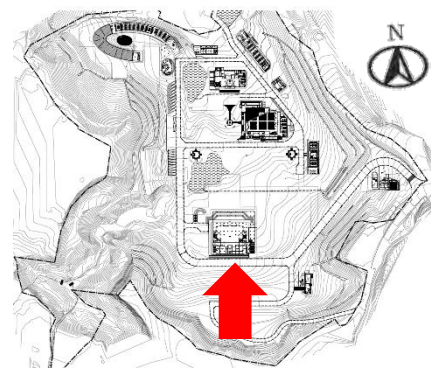

鋼構下層屋簷校正電銲
3F版鋼承鈑、鋼筋鋪設
B2F-B1F泥作吊線
筏基FRP施作
擋土牆外牆聚脲防水施作

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



齋堂




屋頂鋼構電銲校正

1F-3F泥作、輕隔間、油漆

1F-3F戶外欄杆墩座施作

筏基配管回封

機電配管拉線

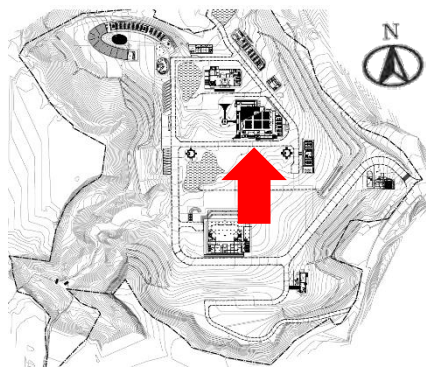


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



玄文

3F柱牆鋼筋模板水電施作
B1F泥作、油漆施作
筏基FRP施作
地下室頂版聚脲防水施作

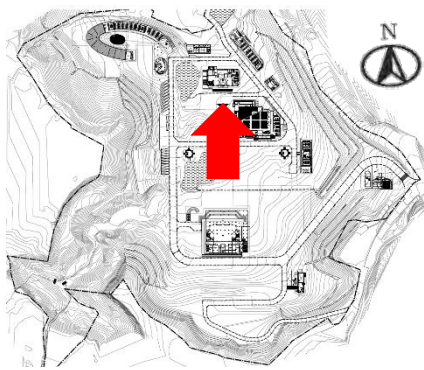


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

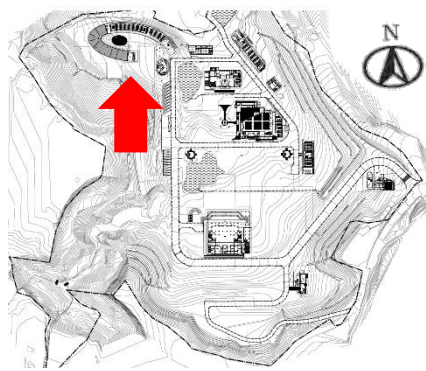

金屬屋頂防火層施作
B1F-4F泥作、輕隔間、油漆、
門窗施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



RF梁鋼筋模板水電施作
筏基配管

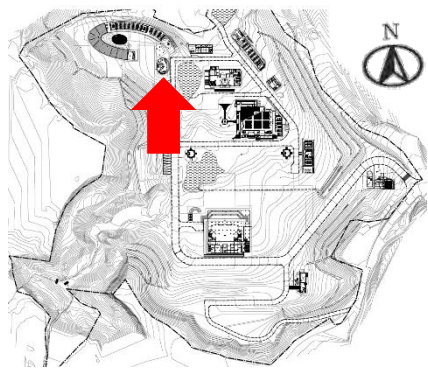


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

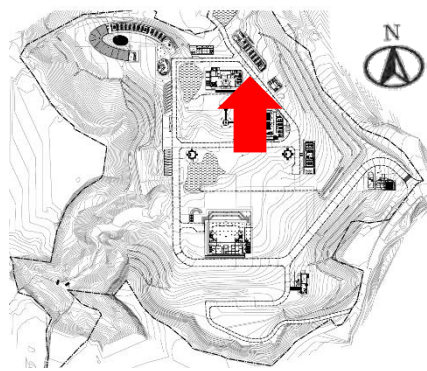


金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
門窗施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男義工

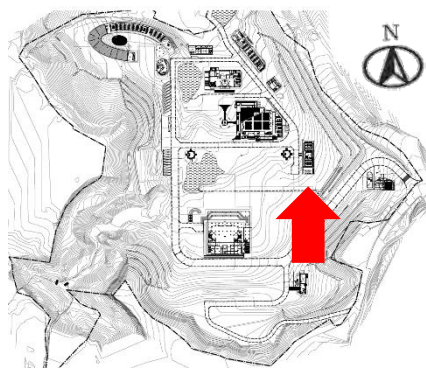

金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
門窗、電梯施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男常住

金屬屋頂防火層施作
1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
門窗、電梯施作、戶外欄杆預埋
施作
機電配管拉線

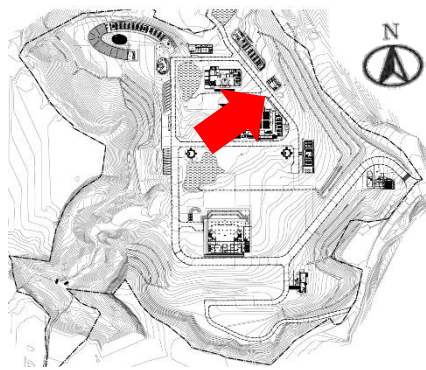




司機休息室



金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
門窗、電梯施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

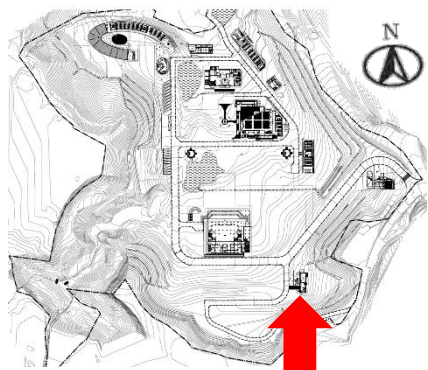

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



高版區水箱鋼筋模板水電
低版區2F柱牆鋼筋模板水電

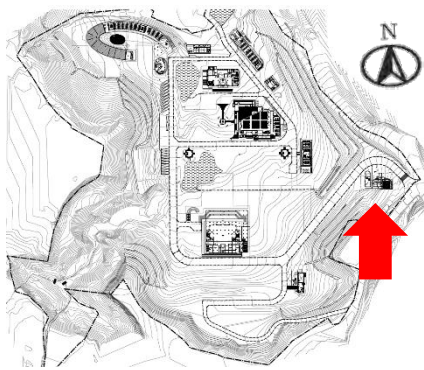

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鐘樓



鋼構屋頂待吊裝

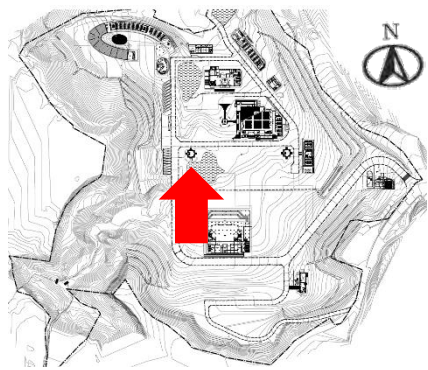

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



鼓樓



鋼構屋頂待吊裝

