

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月10日
施工工期	1170日曆天+展延工期8天
累計工期	980日曆天（截至115年03月26日）
剩餘工期	198日曆天
預定進度(115.03.26)	58.72%
實際進度(115.03.26)	58.09%
本週進度(超前/ <u>落後</u>)	0.63%

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理



全區空拍照片

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外2。

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



鋼構屋頂吊裝前置
B2F-B1F泥作、油漆、鐵捲門施
作

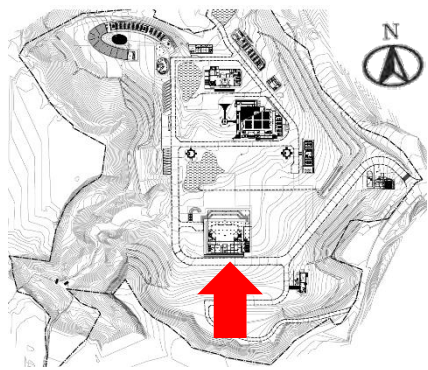


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



齋堂

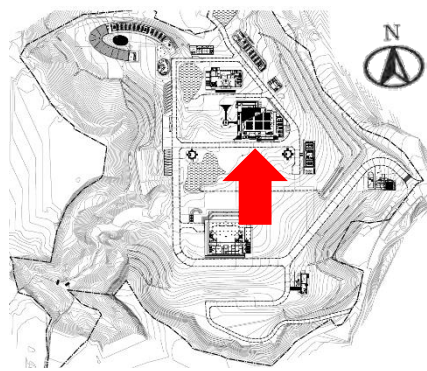

金屬屋頂防火層施作
1F-4F泥作、輕隔間、油漆、戶
外欄杆墩座、鐵捲門、鋁窗、
金屬門施作
RF屋頂防水施作
機電配管拉線


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



玄文

金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作、油漆施作

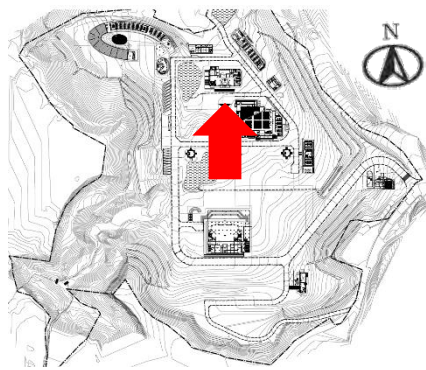


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

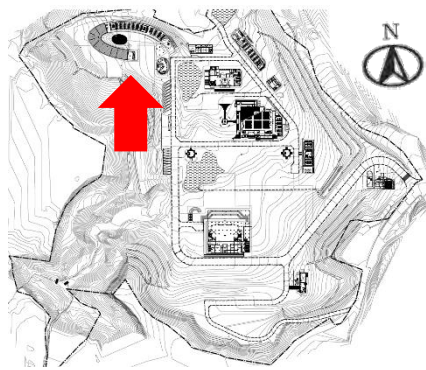

金屬屋頂防火層施作
B1F-4F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-4F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



金屬屋頂防火層施作
1F-2F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作

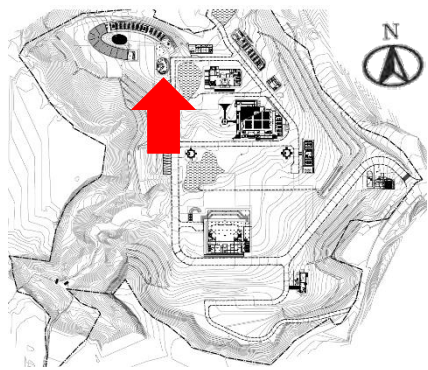

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男寮



金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

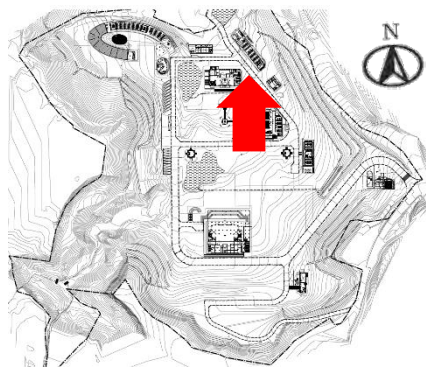


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男義工

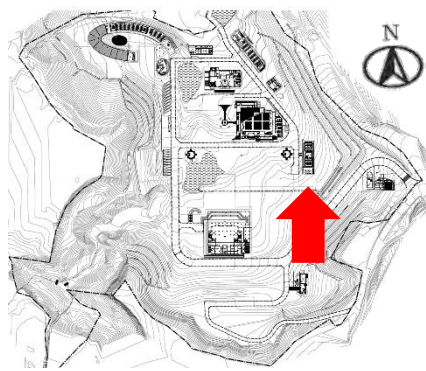


金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男常住

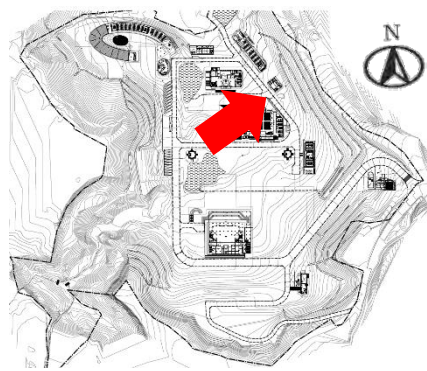

金屬屋頂防火層施作
1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯、戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



司機休息室



金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

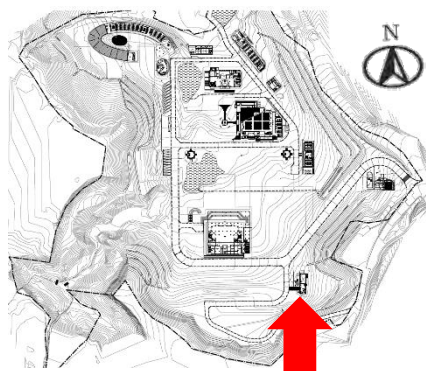

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



高版區水箱鋼筋模板水電
低版區RF梁澆置
戶外廣場鋪面、樓梯施作

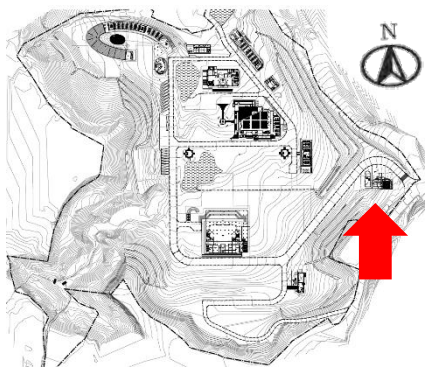

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鐘樓



鋼構屋頂電銲校正

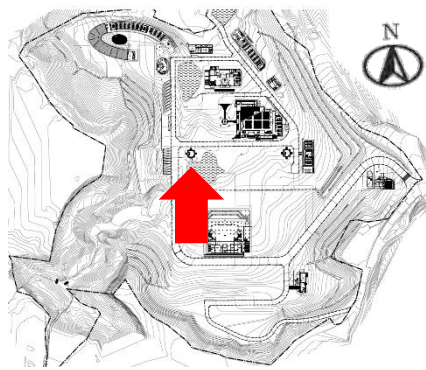




鼓樓



鋼構屋頂電銲校正

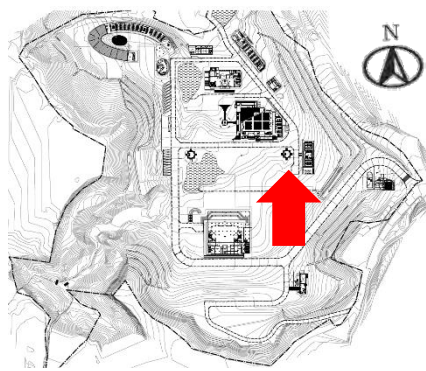



全區空拍照片

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



鋼構屋頂吊裝
B2F-1F泥作、油漆、鐵捲門施作
東、西向土方回填

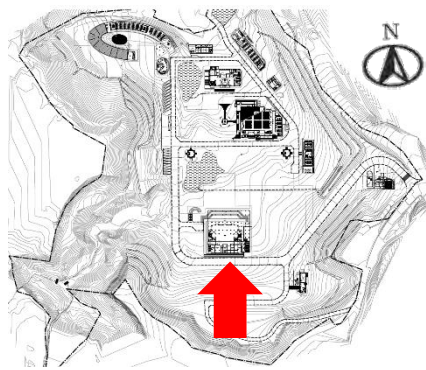


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



齋堂

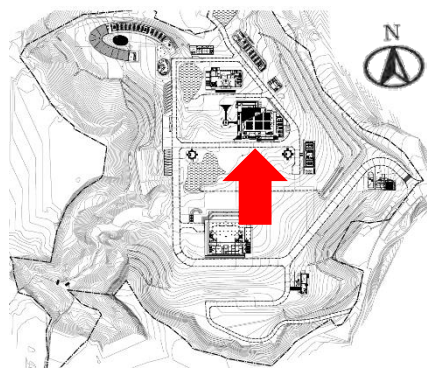


金屬屋頂防火層施作
1F-4F泥作、輕隔間、油漆、戶
外欄杆墩座、鐵捲門、鋁窗、
金屬門施作
RF屋頂防水施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



玄文

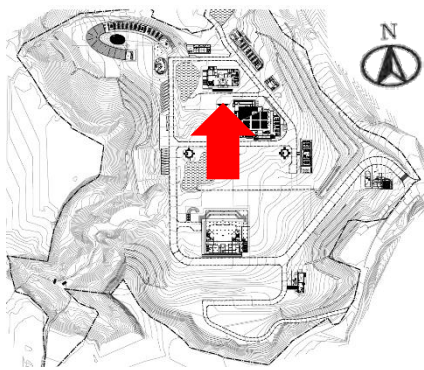


鋼構屋頂電銲校正
B1F-1F泥作、油漆施作
屋頂防水施作

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

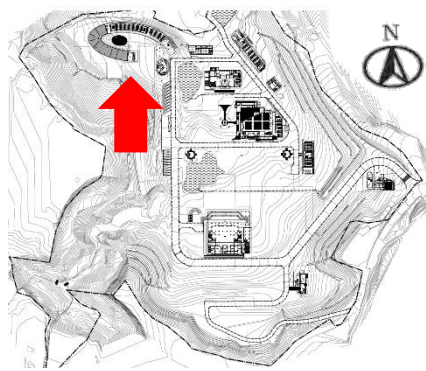

金屬屋頂防火層施作
B1F-4F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-4F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



金屬屋頂防火層施作
1F-2F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作

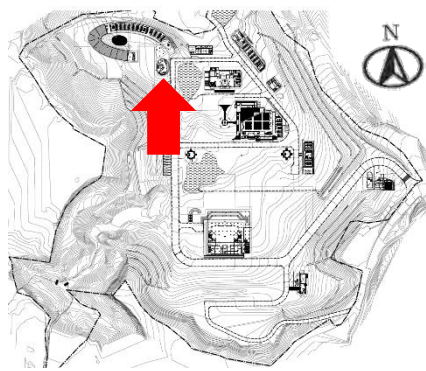


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

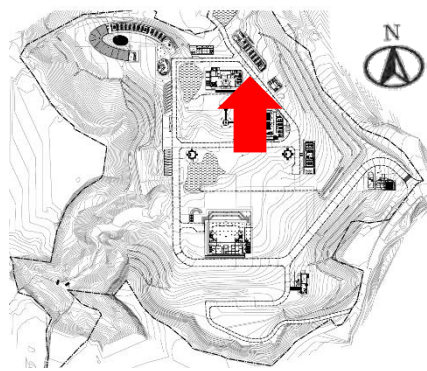


金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作
1F-3F造型遮陽板施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男義工

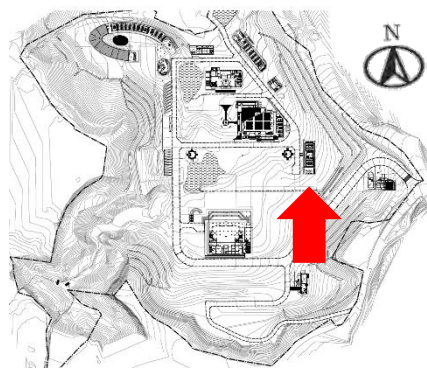

金屬屋頂面層施作

B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作

1F-3F造型遮陽板施作

3F金屬三明治版施作

機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片




男常住



金屬屋頂面層施作

1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯、造型遮陽板施作

機電配管拉線

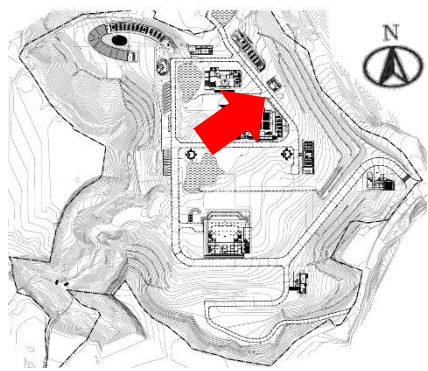

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



司機休息室



金屬屋頂面層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

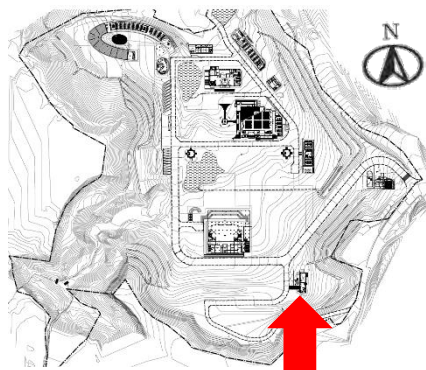

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



高版區頂版鋼筋模板水電
戶外景觀樓梯施作

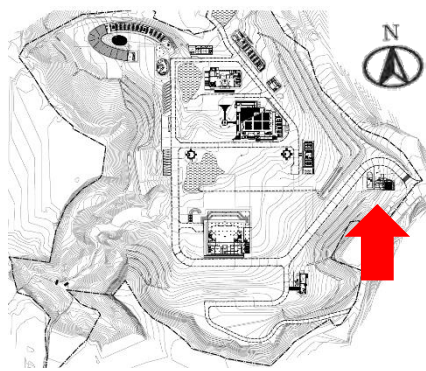

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鐘樓



鋼構屋頂電銲校正
1F泥作

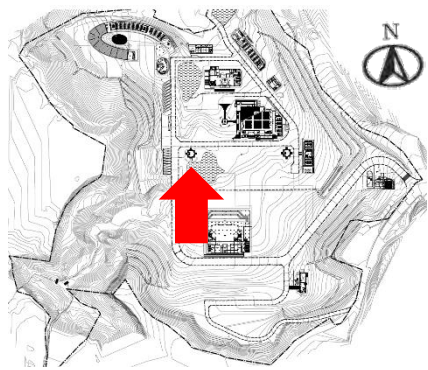

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



鼓樓



鋼構屋頂電銲校正
1F泥作

