

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	116年06月12日
施工工期	1170日曆天+展延工期253日曆天
累計工期	1036日曆天（截至115年05月21日）
剩餘工期	387日曆天
預定進度(115.05.21)	62.02%
實際進度(115.05.21)	61.84%
本週進度(超前/ <u>落後</u>)	0.18%

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

範疇管理



全區空拍照片

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意任意複製、重製或對外揭2。

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片




主殿



鋼構屋頂吊裝

B2F-1F泥作、油漆、鐵捲門施作
東、造型柱組模灌漿

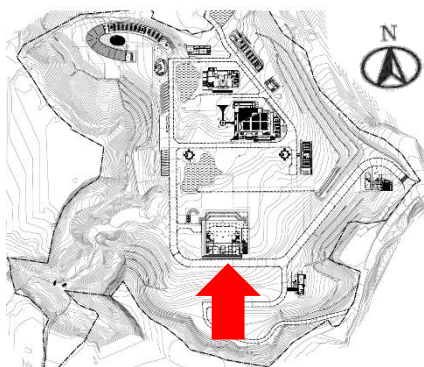


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



齋堂

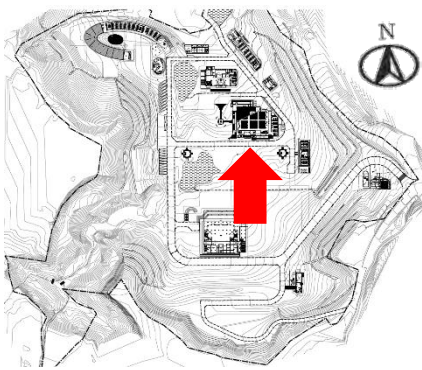

金屬屋頂防火層施作
1F-4F泥作、輕隔間、油漆、戶
外欄杆墩座、鐵捲門、鋁窗、
金屬門施作
RF屋頂防水施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作、油漆施作
屋頂防水施作

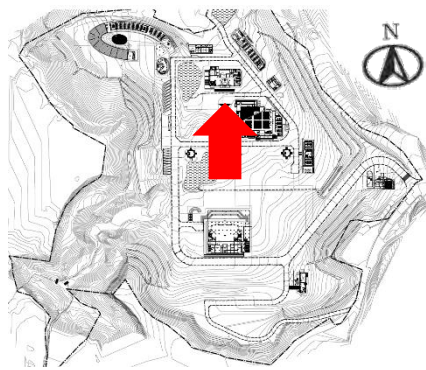


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

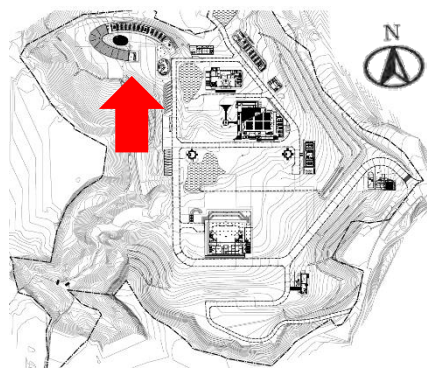

金屬屋頂防火層施作
B1F-4F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-4F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



金屬屋頂防火層施作
1F-2F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作

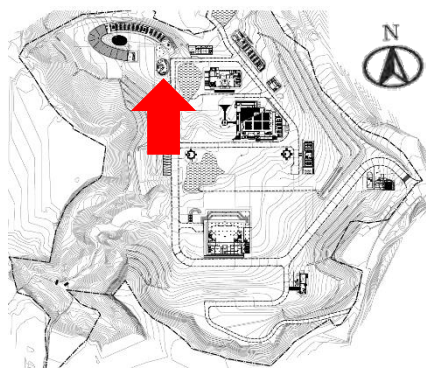


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

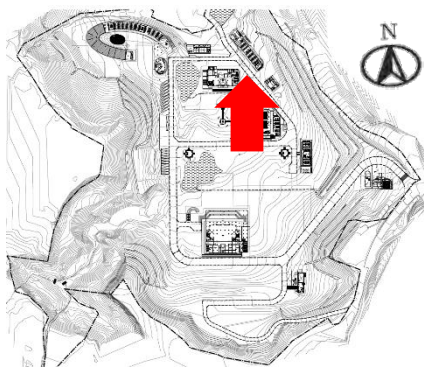


金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作
1F-3F造型遮陽板施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男義工

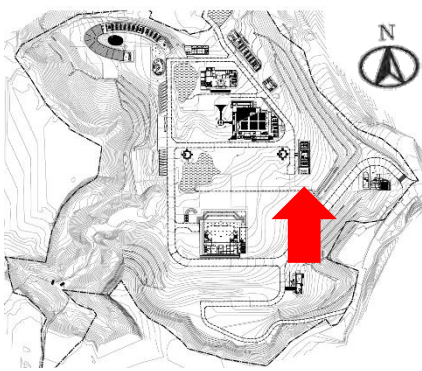

金屬屋頂面層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-3F造型遮陽板施作
3F金屬三明治版施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片




男常住

金屬屋頂面層施作

1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯、造型遮陽板施作

機電配管拉線

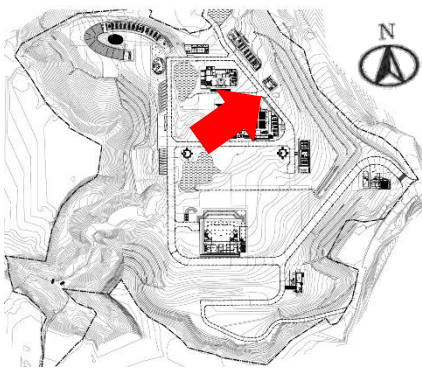




司機休息室



金屬屋頂面層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

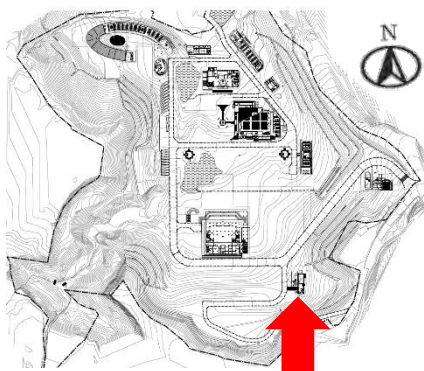

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



傳達室



1F-2F泥作、戶外欄杆預埋施作

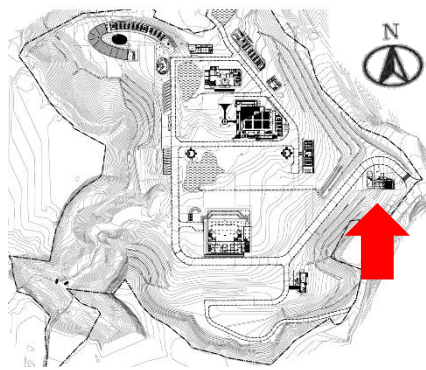

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鐘樓



鋼構屋頂電銲校正
1F泥作

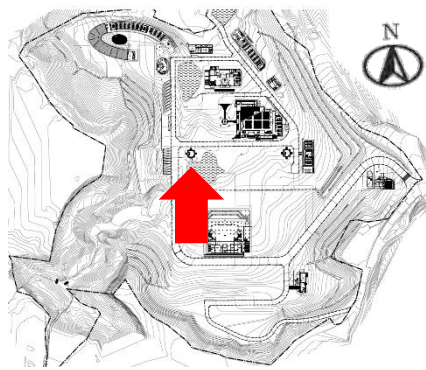

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鼓樓




鋼構屋頂電銲校正
1F泥作

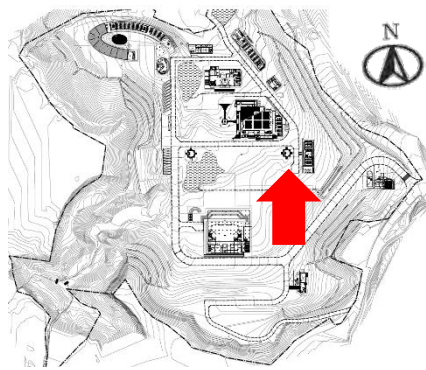

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片

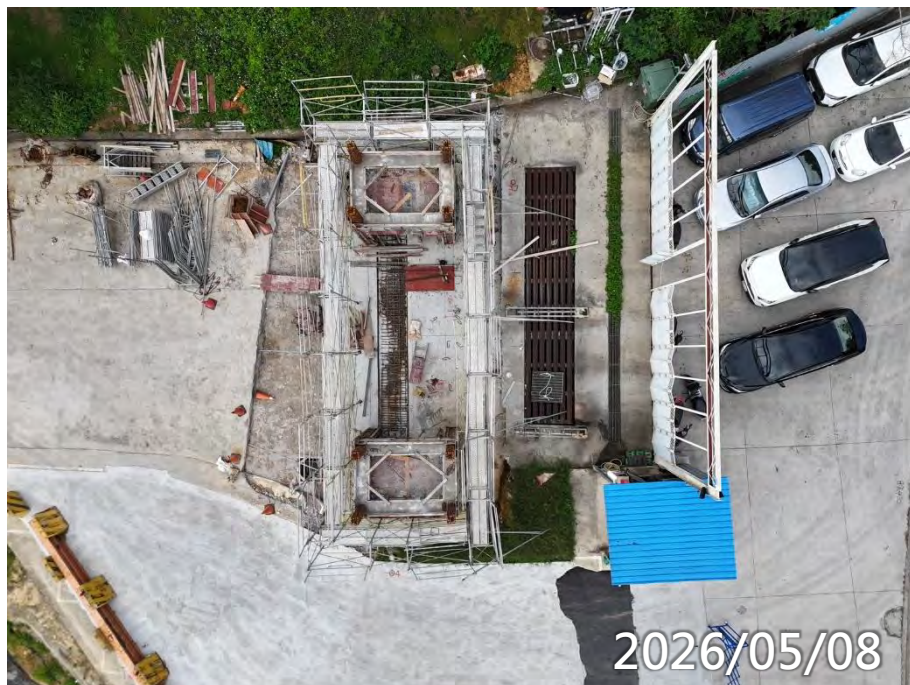

山門



柱鋼筋模板水電施作

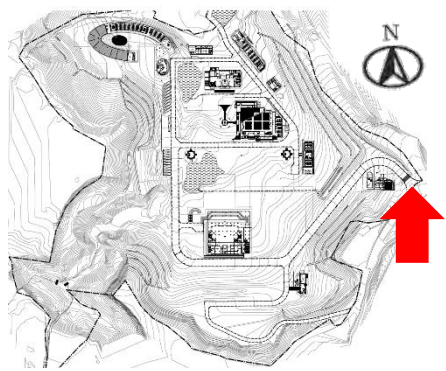




全區空拍照片

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



主殿

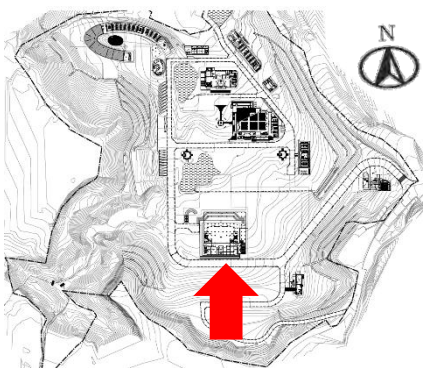

鋼構屋頂吊裝


B2F-1F泥作、輕隔間、油漆、鐵捲門施作、造型柱組模灌漿
樹穴聚脲防水
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



齋堂

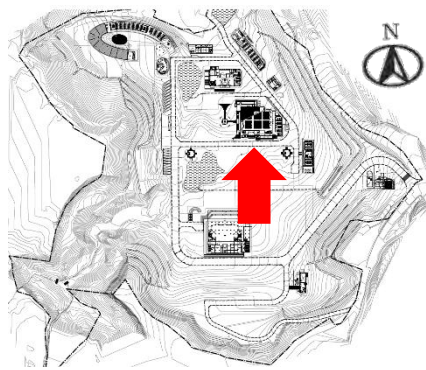

金屬屋頂防火層施作
1F-4F泥作、輕隔間、油漆、戶
外欄杆墩座、鐵捲門、鋁窗、
金屬門施作
RF屋頂防水施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



金屬屋頂防火層施作
B1F-2F泥作、油漆、電梯施作
屋頂防水施作

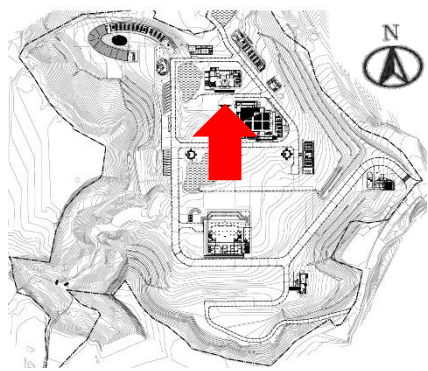


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



女寮

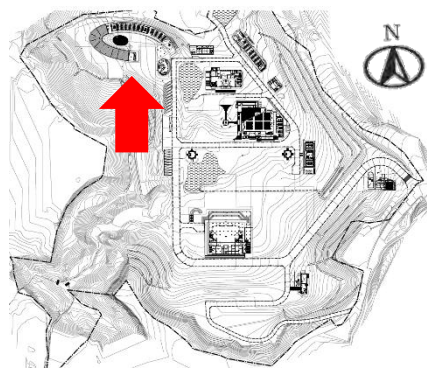

金屬屋頂防火層施作
B1F-4F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門、電梯、防火漆施
作
1F-4F戶外欄杆預埋施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女常住



金屬屋頂防火層施作
1F-2F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作

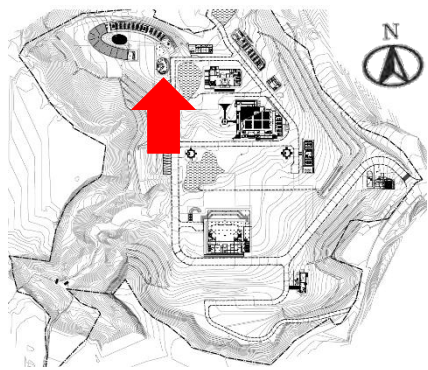


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男寮

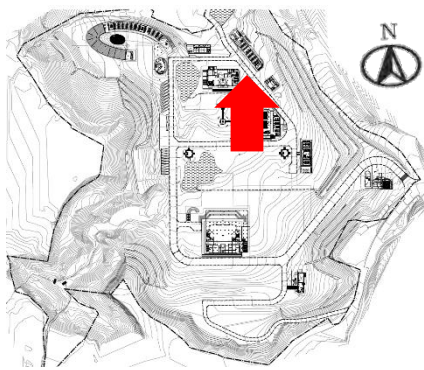


金屬屋頂防火層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、
鋁窗、金屬門施作
1F-3F造型遮陽板施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男義工

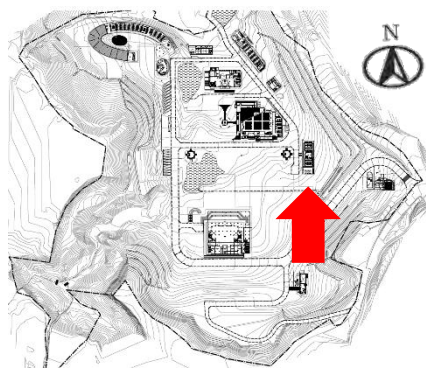


金屬屋頂面層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯、防火漆施作
1F-3F造型遮陽板施作
3F金屬三明治版施作
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



男常住

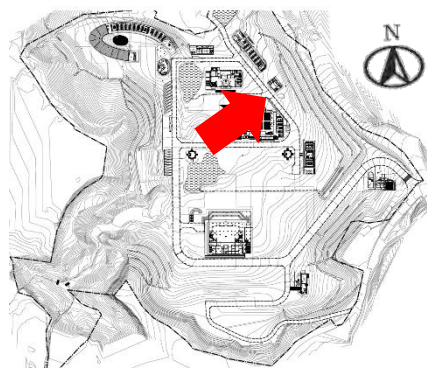

金屬屋頂面層施作

1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯、防火漆、造型遮陽板施作

3F金屬三明治版施作

機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



司機休息室



金屬屋頂面層施作
B1F-3F泥作、輕隔間、油漆、鋁窗、金屬門、電梯施作
1F-3F戶外欄杆預埋施作
3F金屬三明治版施作
機電配管拉線

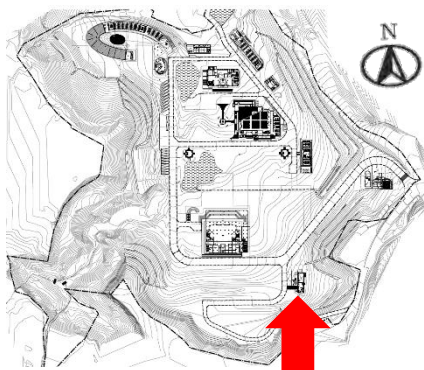


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



傳達室

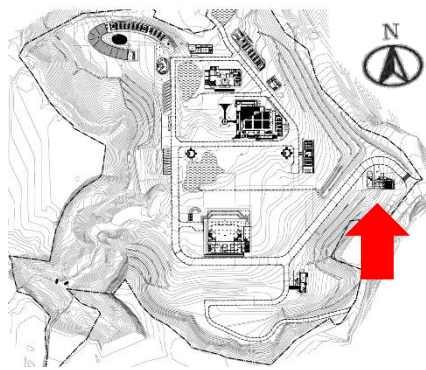

全區1F-2F泥作
高版區屋頂聚脲防水壓層
屋頂鋼構進料
機電配管拉線

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鐘樓



鋼構屋頂電銲校正
1F泥作

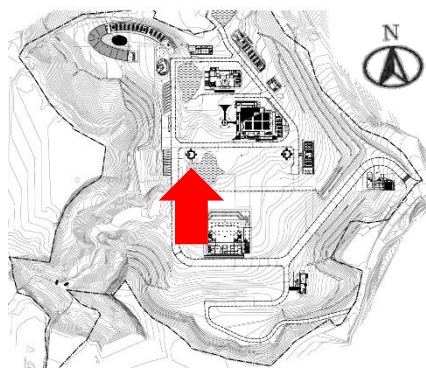

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



鼓樓




鋼構屋頂電銲校正
1F泥作

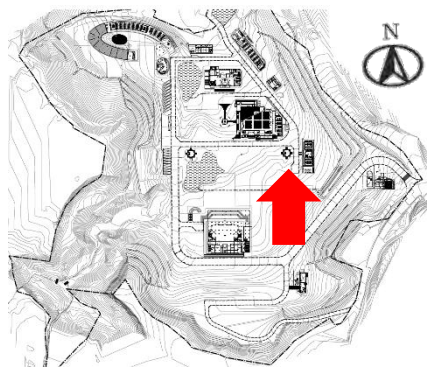

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片

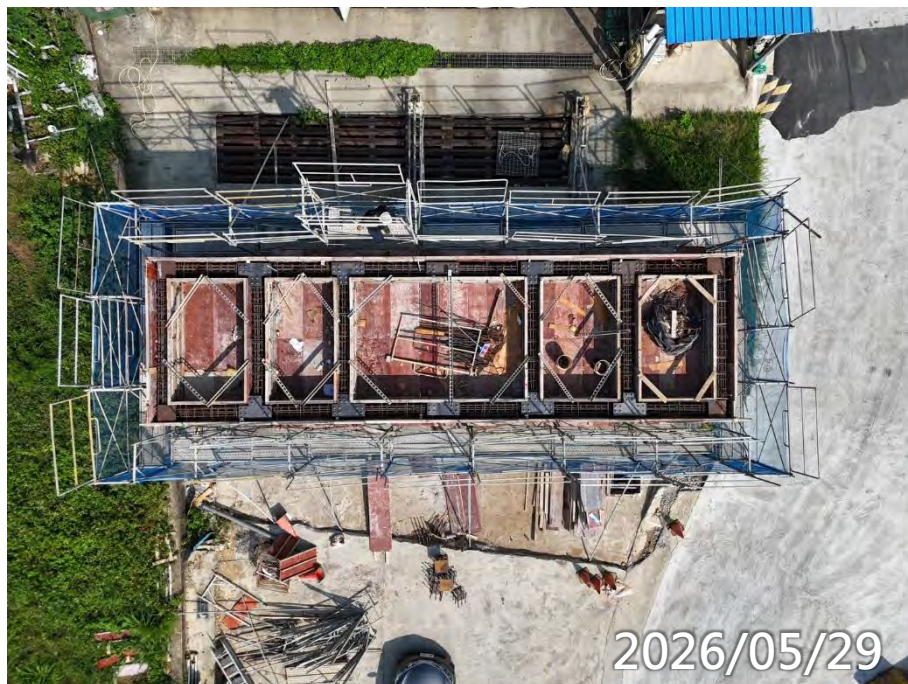

山門



屋頂鋼構預埋

